

INDICE

➔ INTRODUCCIÓN pág. 2	➔ PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PLANIFICACIÓN..... pág. 18- 32
➔ VISIÓN pág. 3	➔ PROYECTOS DE FUNCIONAMIENTO EN PLANIFICACIÓN pág. 33- 36
➔ MISIÓN pág. 4	➔ PROYECTOS DE FUNCIONAMIENTO EN GUATECOMPRASpág. 37- 42
➔ OBJETIVOS pág. 5	➔ PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓNpág. 43- 50
➔ PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN pág. 6- 17	➔ PROYECTOS DE FUNCIONAMIENTO EN EJECUCIÓNpág. 51- 66
	➔ PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ARRASTREpág. 67- 76



INTRODUCCIÓN

La Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, es unidad ejecutora adscrita al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda-CIV-, realiza una logística de Programación, Planificación y Ejecución de Proyectos de: Construcción, Ampliación, Mejoramiento, Reposición y Remozamiento de la infraestructura estatal; priorizando la infraestructura escolar, hospitalaria y toda aquella infraestructura que sea de carácter público.

Respondiendo así al Plan Nacional de Desarrollo K'atun "Nuestra Guatemala 2032; vinculado a la política general de gobierno 2016-2020, que establece las directrices para el seguimiento y administración de futuros Gobiernos por medio de los 5 ejes del Plan, que son los siguientes: Guatemala urbana y rural, Bienestar para la gente, Riqueza para todas y todos, Recursos naturales hoy y para el futuro, El Estado como garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo. [1]

Dentro de las políticas del plan Nacional de Desarrollo Katún "Nuestra Guatemala 2032; la -UCEE- tiene un papel importante en el desarrollo de "El eje Bienestar para la gente", que incluye servicios integrales de calidad en salud y educación; servicios básicos; habitabilidad segura; y acceso; que tiene como finalidad solventar las necesidades de infraestructura estatal.

La Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, desempeña, dentro sus funciones, las gestiones pertinentes para obtención de fuentes de financiamiento, con sus respectivos avales de los entes rectores, logrando con ello así un enlace directo con las diferentes entidades solicitantes, con el fin de la ejecución integral de los proyectos a cargo.

Dentro de los lineamientos de trabajo, -UCEE- prioriza el cumplimiento del eje de Transparencia, de la política general de gobierno 2016-2020. Principalmente en la gestión de cotizaciones y licitaciones para la contratación de empresas que se encargan de los diferentes proyectos de infraestructura pública.



VISIÓN

Ser la institución dinámica, participativa y decisoria que cumple sus funciones con altos estándares de eficiencia, eficacia y transparencia, adquiriendo principios y valores para crear un modelo en la planificación y construcción de Edificios del Estado; con el fin de construir una Guatemala inclusiva y democrática que alcance sus resultados a satisfacción de la población guatemalteca, con un alto grado de entusiasmo, rendimiento y satisfacción por parte de los servidores públicos de la UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO – UCEE-, para lograr el bien común de los guatemaltecos y guatemaltecas.



MISIÓN

La UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO -UCEE- es una institución que se dedica a la preinversión e inversión de proyectos en el sector público, Dedicada a la construcción de proyectos de:

- Infraestructura Educativa
- Infraestructura hospitalaria
- Remozamientos integrales
- Infraestructura estatal

cuya misión es satisfacer las necesidades de infraestructura pública de nuestra población, dando cumplimiento a los estándares de calidad y plazos fijados por medio de la exigencia en el control de calidad de productos terminados.

Somos la institución responsable de cumplir con el mandato constitucional de promover la infraestructura del Estado a nivel nacional haciendo énfasis en infraestructura escolar, hospitalaria y edificios públicos.



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- Fortalecimiento a la inversión pública desarrollando infraestructura estatal a nivel nacional. Planear, dirigir y coordinar las actividades inherentes al proceso de planeación, programación, ejercicio y control del presupuesto del gasto público del Gobierno del Estado.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Mantener coordinación permanente con los Ministerios De Estado y entidades descentralizadas para la construcción y mantenimiento de la obra pública.
- Colaborar con entidades de otros proyectos de construcción, nacionales e internacionales, en los diferentes programas de construcción de infraestructura sectorial que deba atender el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.
- Ejecutar el diseño, construcción, reparación, remodelación, mantenimiento y el amoblamiento básico de edificios del Estado que se le encomiende atender.




PROYECTOS DE PRE-INVERSIÓN

Es el proceso que permite establecer los estudios de viabilidad técnica, económica, financiera, social, ambiental y legal con el objetivo de reunir información para la elaboración del proyecto.

RESUMEN DE PROYECTOS

38 proyectos de preinversión
EN 16 Departamentos, de la
Republica de Guatemala.

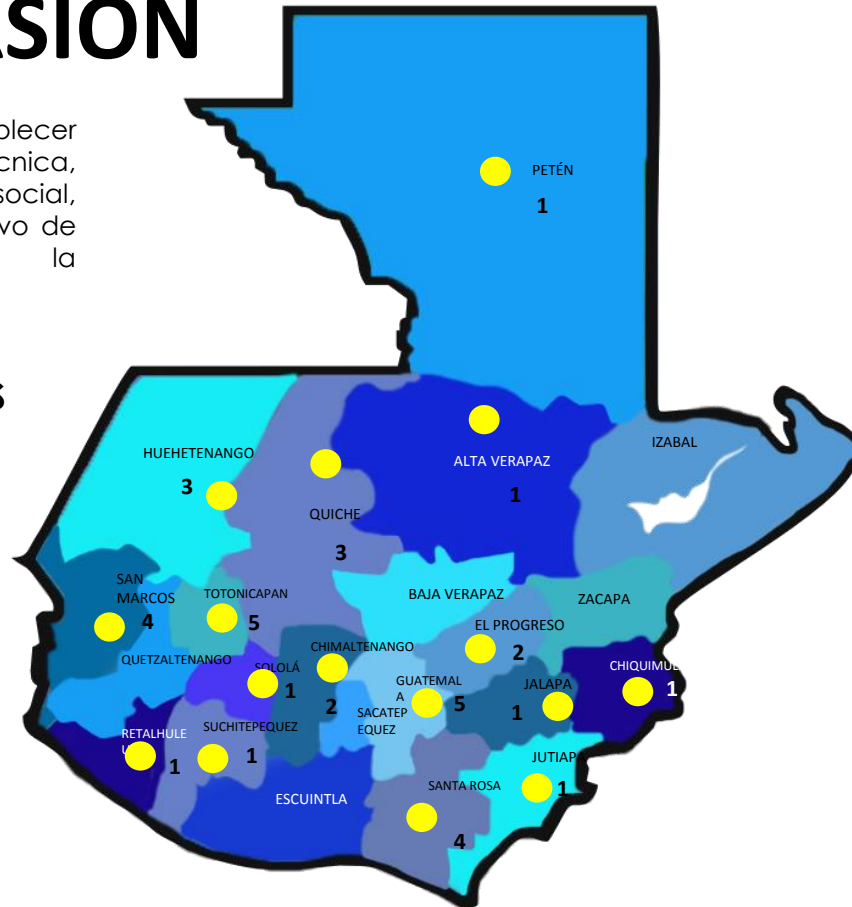

EDUCACIÓN


30 Proyectos de Educación

Infraestructura pública(Bomberos)

7 Proyectos de Bomberos

Infraestructura pública(Edificio CIV)

1 Proyectos de Edificio Público

NOMENCLATURA	
4	Indica cantidad de proyectos
	Indica Departamento con pre inversión



PRE INVERSIÓN




EDUCACIÓN

SNIP 131641 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN LA ESPERANZA, ALDEA RANCHO BOJÓN, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-20-5452-43
ESTADO FÍSICO: PERFIL 100 %
ESTADO FINANCIERO: DECRETO 25-2019 VII ART 75
ESTADO SINIP: PERFIL APROBADO, pre inversión , pendiente para cotización y licitación externa

SNIP 241967 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS, 10A. AVENIDA 8-27 ZONA 3, SAN MARCOS, SAN MARCOS.CODIGO UDI: 12-01-0048-46

ESTADO FÍSICO: PERFIL TERMINADO
ESTADO FINANCIERO: DECRETO 25-2019 VII ART 75
ESTADO SINIP: PERFIL APROBADO, pre inversión , pendiente para cotización y licitación externa

SNIP 241967 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NACIONAL EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL PROFESORA MARIA CRISTINA BARRIOS, CALZADA 25 DE ABRIL ZONA 5, SAN MARCOS, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-01-0043-45
ESTADO FÍSICO : PERFIL TERMINADO
ESTADO FINANCIERO : DECRETO 25-2019 VII ART 75
ESTADO SINIP : PERFIL APROBADO, pre inversión , pendiente para cotización y licitación externa

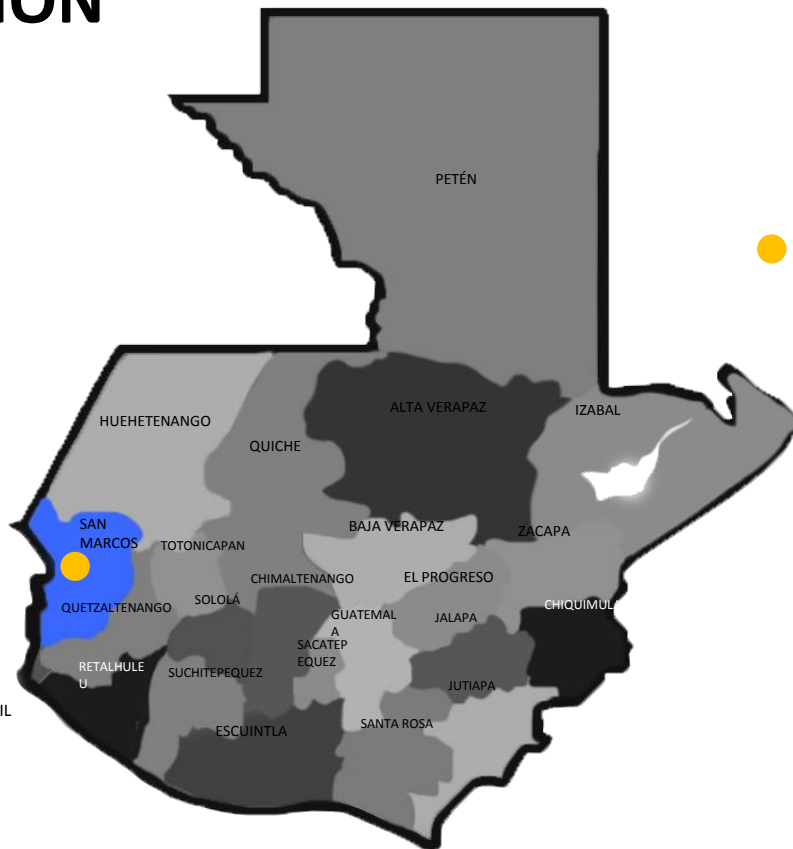

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (Bomberos)

SNIP 243889 CONSTRUCCION SUBESTACION DE BOMBEROS 68A. COMPAÑIA BARRIO 15 DE SEPTIEMBRE, LA REFORMA, SAN MARCOS.

ESTADO FÍSICO : PERFIL 100 %
ESTADO FINANCIERO : DECRETO 25-2019 VII ART 75
ESTADO SINIP : PERFIL APROBADO, PENDIENTE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, CONTRATACIÓN EXTERNA

RESUMEN DE PROYECTOS

3 Proyectos de pre inversión , de educación en el departamento de San Marcos
 1 Proyectos de pre inversión , de infraestructura pública, en el departamento de San Marcos.



PRE INVERSIÓN




EDUCACIÓN

- **SNIP 155378** REPOSICION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA LA LABOR, CHIANTLA, HUEHUETENANGO, CODIGO UDI 13-02-0148-43

ESTADO FISICO : **PERFIL 100 %**
 ESTADO FINANCIERO : **DECRETO 25-2019 VII ART 75**
 ESTADO SINIP : **PERFIL APROBADO, PENDIENTE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, CONTRATACIÓN EXTERNA .**

- **SNIP 242190** AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PUENTE LAS CULEBRAS II, ALDEA CORRAL CHIQUITO ZONA 8, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CODIGO UDI: 13-01-0122-43

ESTADO FISICO : **PERFIL TERMINADO**
 ESTADO FINANCIERO : **DECRETO 25-2019 VII ART 75**
 ESTADO SINIP : **PERFIL APROBADO, PENDIENTE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, CONTRATACIÓN EXTERNA.**

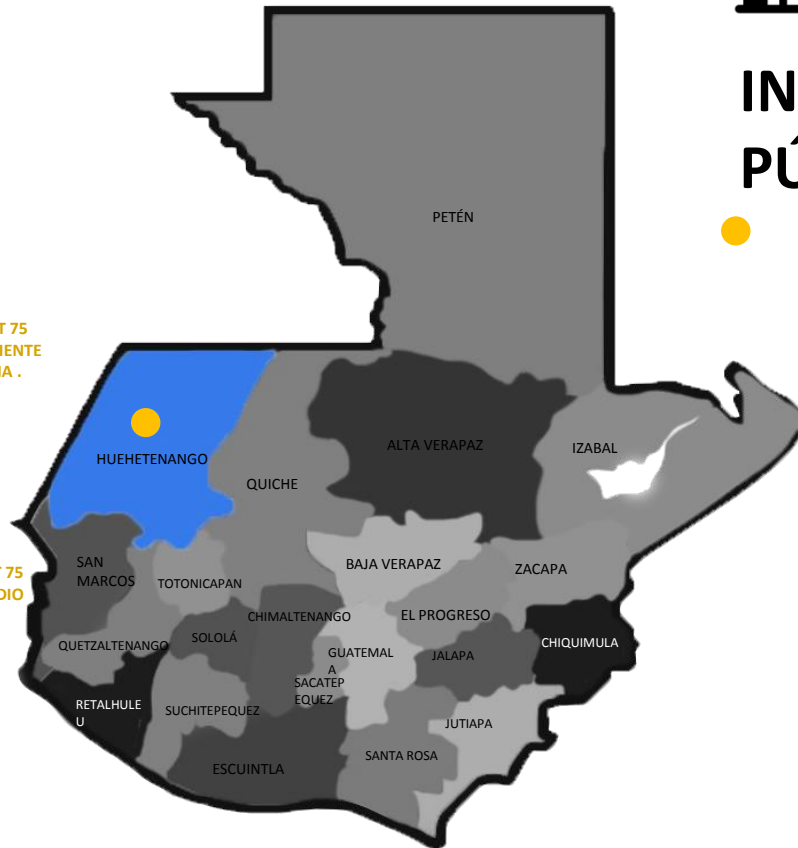

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (Bomberos)

- **SNIP 243873** CONSTRUCCION SUBESTACION DE BOMBEROS 17A. COMPAÑIA CALZADA KAIBIL BALAM, CANTON SAN JOSE, ZONA 5, HUEHUETENANGO.

ESTADO FISICO : **PERFIL 100 %**
 ESTADO FINANCIERO : **DECRETO 25-2019 VII ART 75**
 ESTADO SINIP : **PERFIL APROBADO, PENDIENTE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, CONTRATACIÓN EXTERNA.**

RESUMEN DE PROYECTOS

2 Proyectos de pre inversión , de educación en el departamento de Huehuetenango
 1 Proyectos de pre inversión , de infraestructura publica, en el departamento de Huehuetenango




PRE INVERSIÓN



EDUCACIÓN

RESUMEN DE PROYECTOS

3 Proyectos de pre inversión , de educación en el departamento de Chimaltenango

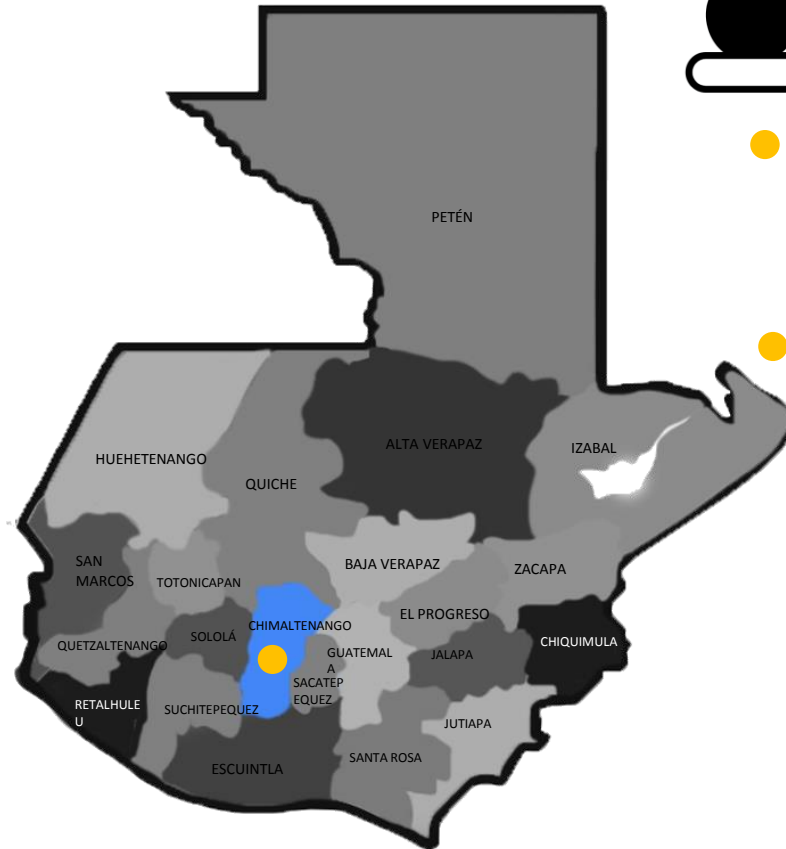

SNIP 241819 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACIÓN 1A. CALLE 4-32 ZONA 3, TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO. UDI: 04-06-0077-45

ESTADO FISICO : PERFIL 100 %
ESTADO FINANCIERO : DECRETO 25-2019 VII ART 75
ESTADO SINIP : PERFIL APROBADO, PENDIENTE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, CONTRATACIÓN EXTERNA



SNIP 241943 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NORMAL RURAL NO. 1 PEDRO MOLINA FINCA LA ALAMEDA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO. CODIGO UDI: 04-01-0044-46

ESTADO FISICO : PERFIL 100 %
ESTADO FINANCIERO : DECRETO 25-2019 VII ART 75
ESTADO SINIP : PERFIL APROBADO, PENDIENTE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, CONTRATACIÓN EXTERNA



PRE INVERSIÓN




EDUCACIÓN

- **SNIP 241856** AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO SAN ANTONIO TZEJA, IXCAN, QUICHE. UDI: 14-20-5477-43

ESTADO FISICO : PERFIL 100 %
ESTADO FINANCIERO : DECRETO 25-2019 VII ART 75
ESTADO SINIP : PERFIL APROBADO, PENDIENTE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, CONTRATACIÓN EXTERNA
- **SNIP 241939** AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON XATINAP PRIMERO, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE. CODIGO UDI: 14-01-0026-43

ESTADO FISICO : PERFIL 100 %
ESTADO FINANCIERO : DECRETO 25-2019 VII ART 75
ESTADO SINIP : PERFIL APROBADO, PENDIENTE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, CONTRATACIÓN EXTERNA
- **SNIP 242016** AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA LA FLORIDA, ZONA 2, PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE. CODIGO UDI: 14-20-5879-43

ESTADO FISICO : PERFIL 100 %
ESTADO FINANCIERO : DECRETO 25-2019 VII ART 75
ESTADO SINIP : PERFIL APROBADO, PENDIENTE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, CONTRATACIÓN EXTERNA

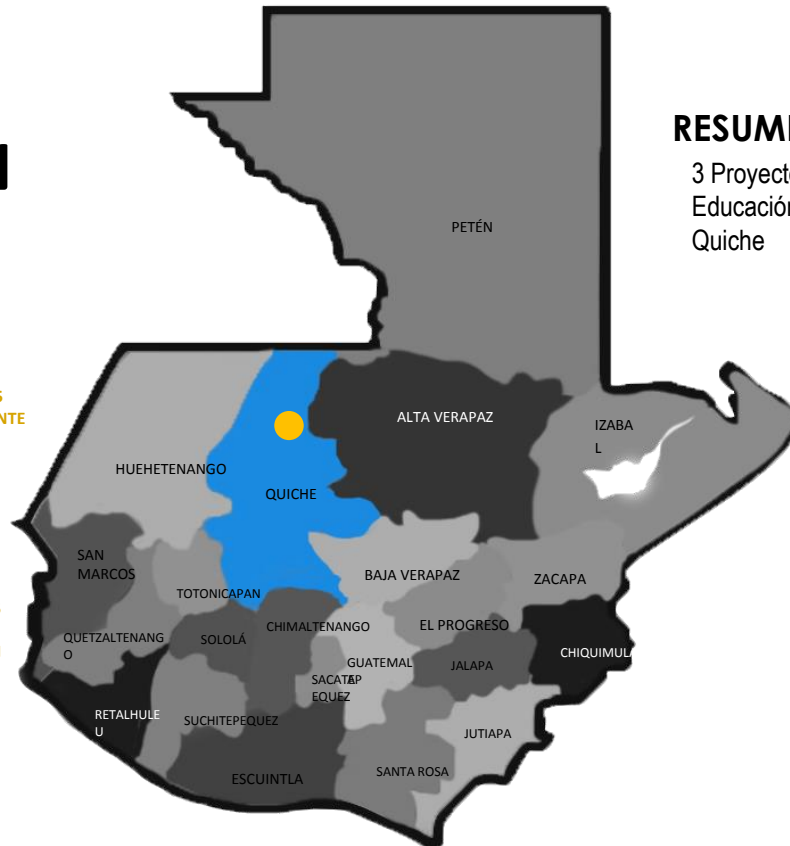

RESUMEN DE PROYECTOS

3 Proyectos de pre inversión , de Educación en el departamento de Quiche






EDUCACIÓN

SNIP 241852 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA
 OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ARENAL,
 JALAPA, JALAPA UDI: 21-01-0071-43

ESTADO FISICO : PERFIL 100 %
ESTADO FINANCIERO : DECRETO 25-2019 VII ART 75
ESTADO SINIP : PERFIL APROBADO, PENDIENTE
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, CONTRATACIÓN EXTERNA

PRE INVERSIÓN

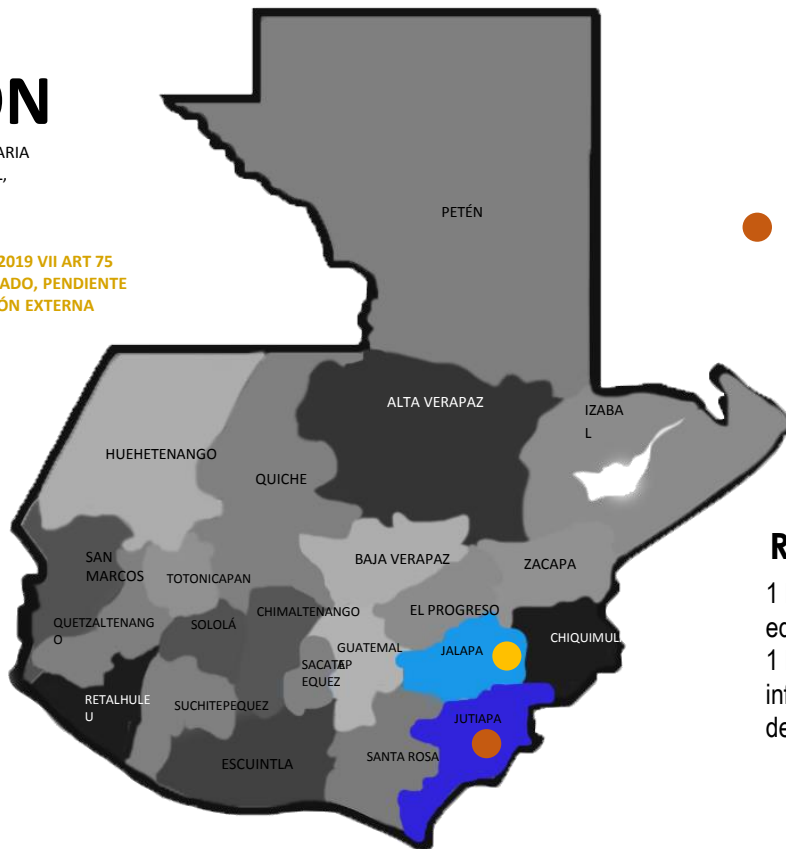

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (Bomberos)

SNIP 243875 CONSTRUCCION SUBESTACION DE
 BOMBEROS 26A. COMPAÑIA RUTA INTERAMERICANA
 KM. 116.5, JUTIAPA, JUTIAPA.

ESTADO FISICO : PERFIL 100 %
ESTADO FINANCIERO : DECRETO 25-2019 VII ART 75
ESTADO SINIP : PERFIL APROBADO, PENDIENTE
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, CONTRATACIÓN EXTERNA

RESUMEN DE PROYECTOS

1 Proyectos de pre inversión , de
 educación en el departamento de Jalapa
 1 Proyectos de pre inversión , de
 infraestructura publica en el
 departamento de Jutiapa





EDUCACIÓN

SNIP 242564 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA
 OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE ORATORIO, CANTON
 XECANCHAVOX, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN,
 TOTONICAPAN: CODIGO UDI: 08-02-0015-43

ESTADO FISICO: PERFIL TERMINADO
ESTADO FINANCIERO : DECRETO 25-2019 VII ART 75
ESTADO SINIP: PERFIL APROBADO, PENDIENTE ESTUDIO
 DE FACTIBILIDAD, CONTRATACIÓN EXTERNA


SNIP 242566 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA
 OFICIAL RURAL MIXTA , CASERIO PASUC, ALDEA LOS
 IPRECES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.
 CODIGO UDI:08-05-1755-43

ESTADO FISICO: PERFIL TERMINADO
ESTADO FINANCIERO : DECRETO 25-2019 VII ART 75
ESTADO SINIP PERFIL APROBADO, PENDIENTE ESTUDIO DE
 FACTIBILIDAD, CONTRATACIÓN EXTERNA

SNIP 242095 AMPLIACION INSTITUTO
 DIVERSIFICADO NORMAL RURAL DE OCCIDENTE NO.2,
 ZONA 5 PARAJE PARRAMON, TOTONICAPAN,
 TOTONICAPAN. CODIGO UDI: 08-01-0503-46

ESTADO FISICO: PERFIL TERMINADO
ESTADO FINANCIERO : DECRETO 25-2019 VII ART
 75
ESTADO SINIP PERFIL APROBADO, PENDIENTE
 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, CONTRATACIÓN EXTERNA

PRE INVERSIÓN

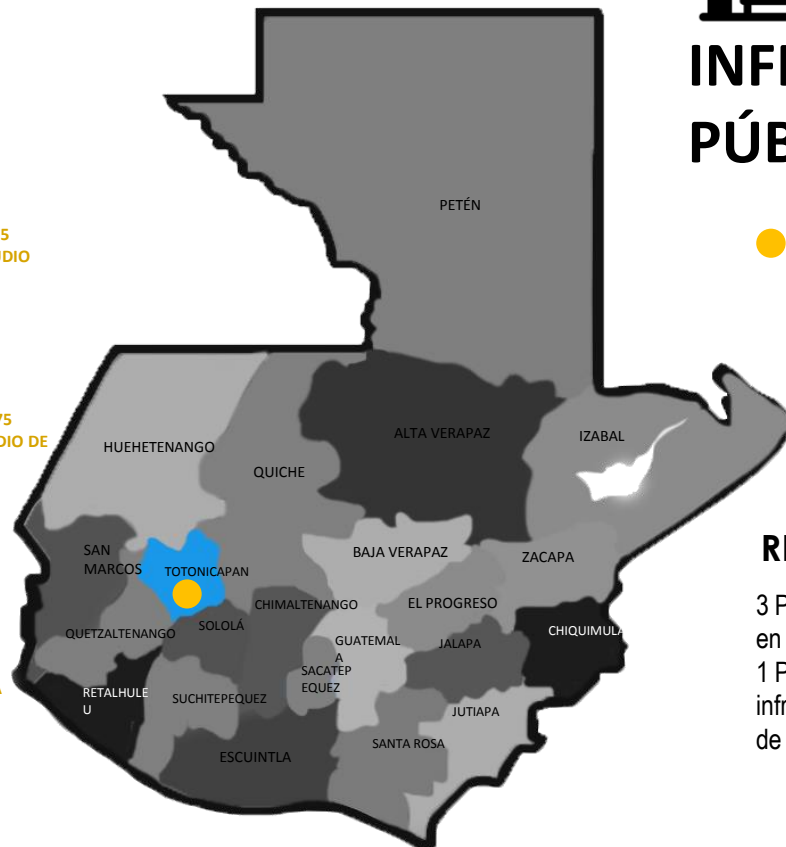

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (Bomberos)

SNIP 243901 CONSTRUCCION SUBESTACION DE
 BOMBEROS 121A. COMPAÑIA, BARRIO LAS CLARAS,
 SAN CRISTOBAL, TOTONICAPAN.

ESTADO FISICO : PERFIL 100 %
ESTADO FINANCIERO : DECRETO 25-2019 VII ART 75
ESTADO SINIP : PERFIL APROBADO, PENDIENTE
 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, CONTRATACIÓN EXTERNA

RESUMEN DE PROYECTOS

3 Proyectos de pre inversión , de educación
 en el departamento de Totonicapán
 1 Proyectos de pre inversión , de
 infraestructura pública en el departamento
 de Totonicapán






EDUCACIÓN

- **SNIP 242073** AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, BARRIO LOS LAURELES, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ. CODIGO UDI: 16-15-8546-43
ESTADO FISICO : PERFIL TERMINADO
ESTADO FINANCIERO : DECRETO 25-2019 VII ART 75
ESTADO SINIP : PERFIL APROBADO, PENDIENTE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, CONTRATACIÓN EXTERNA

- **SNIP 242567** AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA , CANTÓN LAS MERCEDES NORTE, SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ. CODIGO UDI:10-03-0021-43
ESTADO FISICO : PERFIL TERMINADO
ESTADO FINANCIERO : DECRETO 25-2019 VII ART 75
ESTADO SINIP : PERFIL APROBADO, PENDIENTE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, CONTRATACIÓN EXTERNA

PRE INVERSIÓN

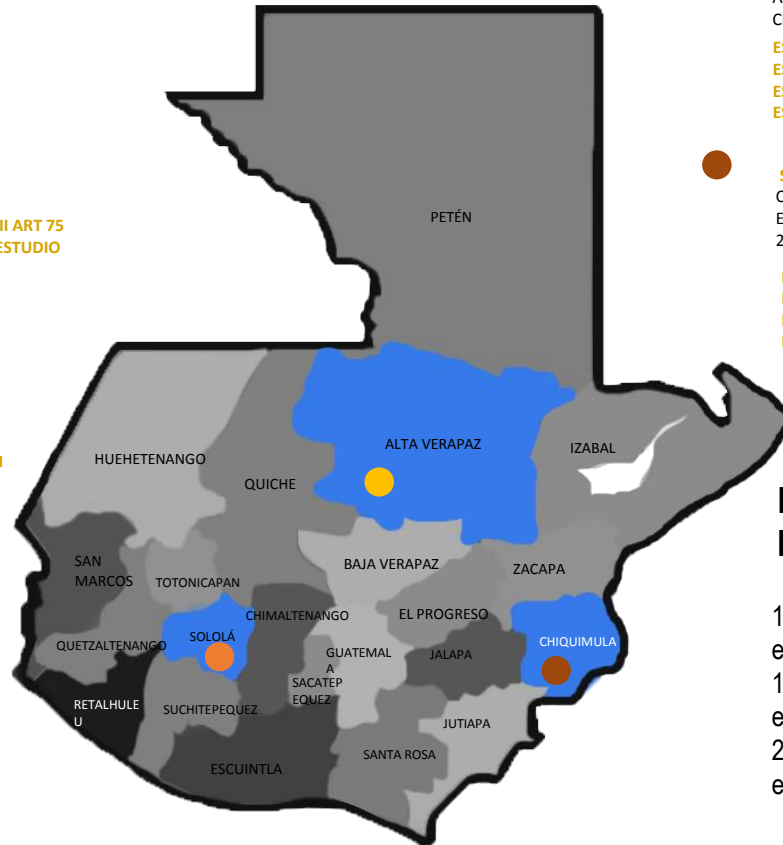

- **SNIP 242170** AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A EORM VIRGINIA JIMENEZ DE VELASQUEZ, ALDEA CEITILLAL CUBILETES, QUEZALTEPEQUE, CHIQUIMULA. CODIGO UDI: 20-09-2189-42
ESTADO FISICO : PERFIL 100 %
ESTADO FINANCIERO : DECRETO 25-2019 VII ART 75
ESTADO SINIP : PERFIL APROBADO, PENDIENTE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, CONTRATACIÓN EXTERNA

- **SNIP 241997** AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS, CASERIO GUAYABILLAS ALDEA EL PALMAR,CHIQUIMULA,CHIQUIMULA. CODIGO UDI: 20-01-0102-42
ESTADO FISICO : PERFIL TERMINADO
ESTADO FINANCIERO : DECRETO 25-2019 VII ART 75
ESTADO SINIP : PERFIL APROBADO, PENDIENTE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, CONTRATACIÓN EXTERNA

RESUMEN DE PROYECTOS

1 Proyectos de pre inversión , de educación en el departamento de Alta Verapaz
 1 Proyectos de pre inversión , de educación en el departamento de Suchitepéquez
 2 Proyectos de pre inversión , de educación en el departamento de Chiquimula





EDUCACIÓN

PRE INVERSIÓN

SNIP 241895 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION CON ORIENTACION COMERCIAL 2 CALLE 2-17 ZONA 3, SAN FELIPE, RETALHULEU. CODIGO UDI: 11-05-1521-45


ESTADO FISICO : PERFIL 100 %
ESTADO FINANCIERO : DECRETO 25-2019 VII ART 75
ESTADO SINIP : PERFIL APROBADO, PENDIENTE
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, CONTRATACIÓN EXTERNA

SNIP 242567 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA , CANTÓN LAS MERCEDES NORTE, SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ. CODIGO UDI:10-03-0021-43

ESTADO FISICO : PERFIL TERMINADO
ESTADO FINANCIERO : DECRETO 25-2019 VII ART 75
ESTADO SINIP : PERFIL APROBADO, PENDIENTE
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, CONTRATACIÓN EXTERNA

SNIP 241997 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, COMUNIDAD REACENTAMIENTO EL RAMONAL II, FLORES, PETEN. CODIGO UDI: 17-01-0051-43

ESTADO FISICO : PERFIL TERMINADO
ESTADO FINANCIERO : DECRETO 25-2019 VII ART 75
ESTADO SINIP : PERFIL APROBADO, PENDIENTE
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, CONTRATACIÓN EXTERNA

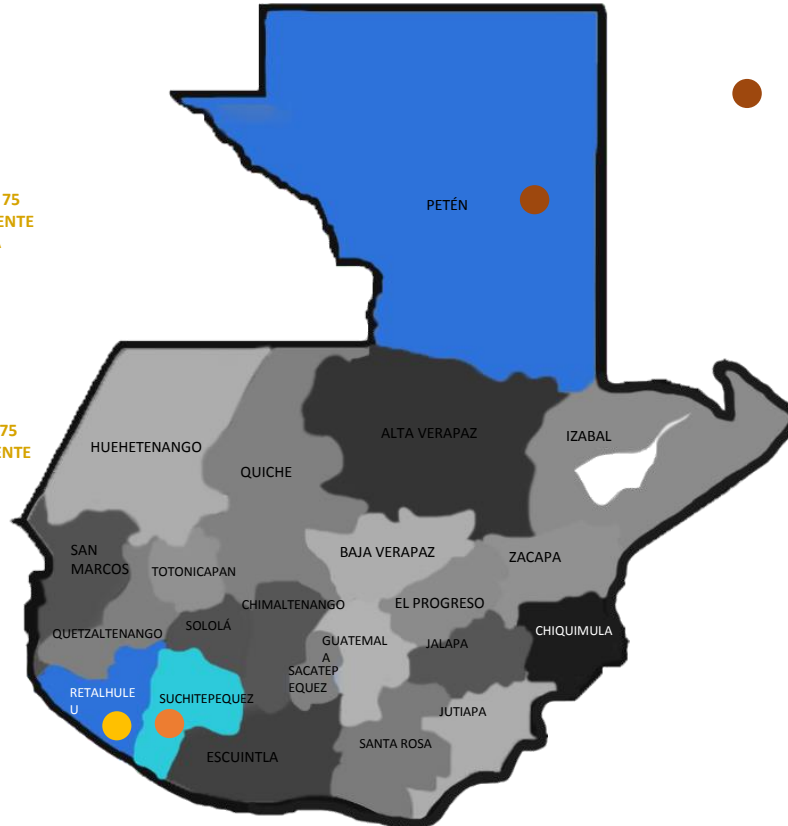

RESUMEN DE PROYECTOS

1 Proyectos de pre inversión , de educación en el departamento de Retalhuleu

1 Proyectos de pre inversión , de educación en el departamento de Suchitepéquez

1 Proyectos de pre inversión , de educación en el departamento de Peten.





EDUCACIÓN

- **SNIP 241785** AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA NO.10 MARIA MONTESSORI, 13 AVE. 4-51 ZONA 2 GUATEMALA, GUATEMALA. CODIGO UDI: 00-02-4147-42
ESTADO FISICO PERFIL TERMINADO
ESTADO FINANCIERO DECRETO 25-2019 VII ART 75
ESTADO SINIP : PERFIL APROBADO, PENDIENTE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, CONTRATACIÓN EXTERNA
- **SNIP 241785** AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA SANTA ELENA II, 11 CALLE C 4-43 ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA.


ESTADO FISICO PERFIL TERMINADO
ESTADO FINANCIERO DECRETO 25-2019 VII ART 75
ESTADO SINIP ENVIADO A SEGEPLAN PARA EVALUACIÓN



INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (Edificio)

- **SNIP 242459** CONSTRUCCION DE EDIFICIO MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CIV, ZONA 13, GUATEMALA, GUATEMALA.
ESTADO FISICO PERFIL EN CORRECCIONES
ESTADO FINANCIERO DECRETO 25-2019 VII ART 75
ESTADO SINIP PERFIL APROBADO, PENDIENTE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, CONTRATACIÓN EXTERNA

PRE INVERSIÓN

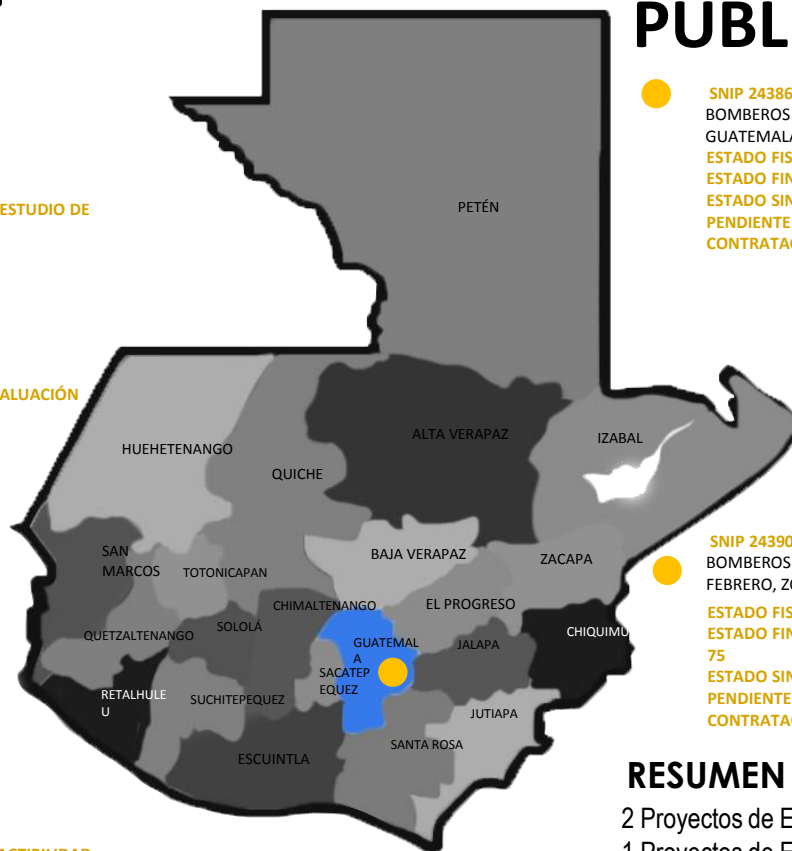

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (Bomberos)

- **SNIP 243869** AMPLIACION SUBSTACION DE BOMBEROS 1 AVENIDA 18-97 ZONA 3, GUATEMALA, GUATEMALA.
ESTADO FISICO PERFIL 100 %
ESTADO FINANCIERO DECRETO 25-2019 VII ART 75
ESTADO SINIP PERFIL APROBADO, PENDIENTE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, CONTRATACIÓN EXTERNA

- **SNIP 243902** CONSTRUCCION SUBSTACION DE BOMBEROS 30 AVENIDA 25-41 COLONIA CUATRO DE FEBRERO, ZONA 7, GUATEMALA.
ESTADO FISICO PERFIL 100 %
ESTADO FINANCIERO DECRETO 25-2019 VII ART 75
ESTADO SINIP PERFIL APROBADO, PENDIENTE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, CONTRATACIÓN EXTERNA

RESUMEN DE PROYECTOS


- 2 Proyectos de Educación
- 1 Proyectos de Edificio publico
- 2 Proyectos de Bomberos



PRE INVERSIÓN

RESUMEN DE PROYECTOS

2 Proyectos de preinversión de Educación,
en el departamento del progreso

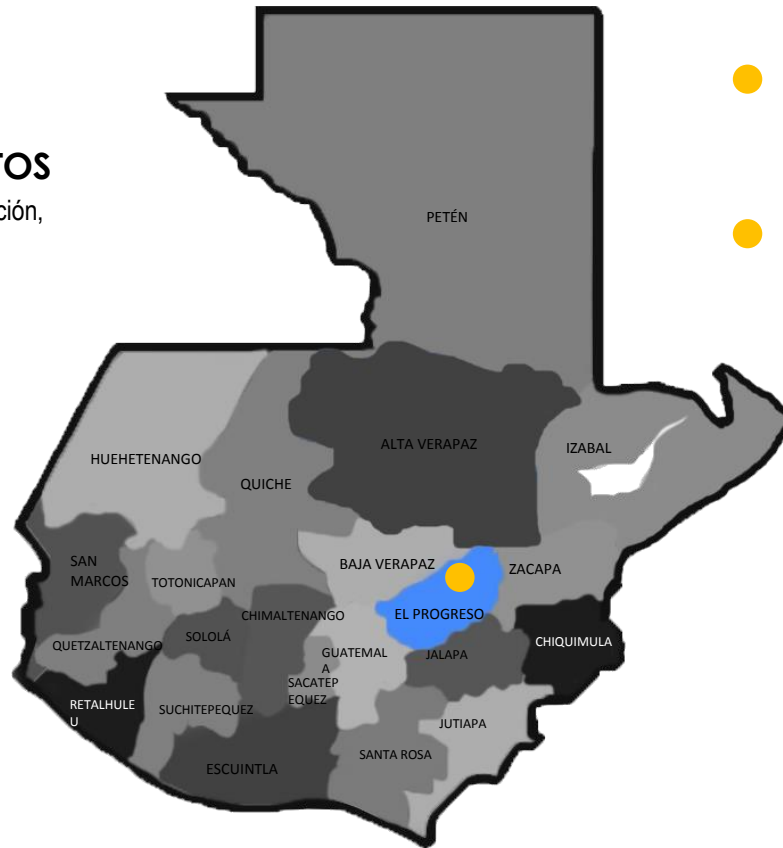

EDUCACIÓN

- **SNIP 242022** AMPLIACION INSTITUTO BASICO NACIONAL ERNESTO CHAVARRIA RIVADENEYRA, 1A. CALLE 3-32 ZONA 1, SANARATE, EL PROGRESO. CODIGO UDI : 02-07-0198-45
ESTADO FISICO : PERFIL TERMINADO
ESTADO FINANCIERO : DECRETO 25-2019 VII ART 75
ESTADO SINIP : PERFIL APROBADO, PENDIENTE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, CONTRATACIÓN EXTERNA
- **SNIP 242024** AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA SHALON, ZONA 4 SANARATE, EL PROGRESO. CODIGO UDI: 02-07-0446-43
ESTADO FISICO : PERFIL 100 %
ESTADO FINANCIERO : DECRETO 25-2019 VII ART 75
ESTADO SINIP : PERFIL APROBADO, PENDIENTE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, CONTRATACIÓN EXTERNA





EDUCACIÓN


● **SNIP 242030** AMPLIACION INSTITUTO BASICO NACIONAL, BARRIO EL CENTRO, ORATORIO, SANTA ROSA. CODIGO UDI: 06-06-0474-45

ESTADO FISICO : PERFIL TERMINADO
ESTADO FINANCIERO : DECRETO 25-2019 VII ART 75
ESTADO SINIP : PERFIL APROBADO, PENDIENTE
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, CONTRATACIÓN EXTERNA

● **SNIP 242038** AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO SAN FRANCISCO EL PINO, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA. CODIGO UDI: 06-10-0001-42

ESTADO FISICO : PERFIL TERMINADO
ESTADO FINANCIERO : DECRETO 25-2019 VII ART 75
ESTADO SINIP : PERFIL APROBADO, PENDIENTE
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, CONTRATACIÓN EXTERNA

PRE INVERSIÓN

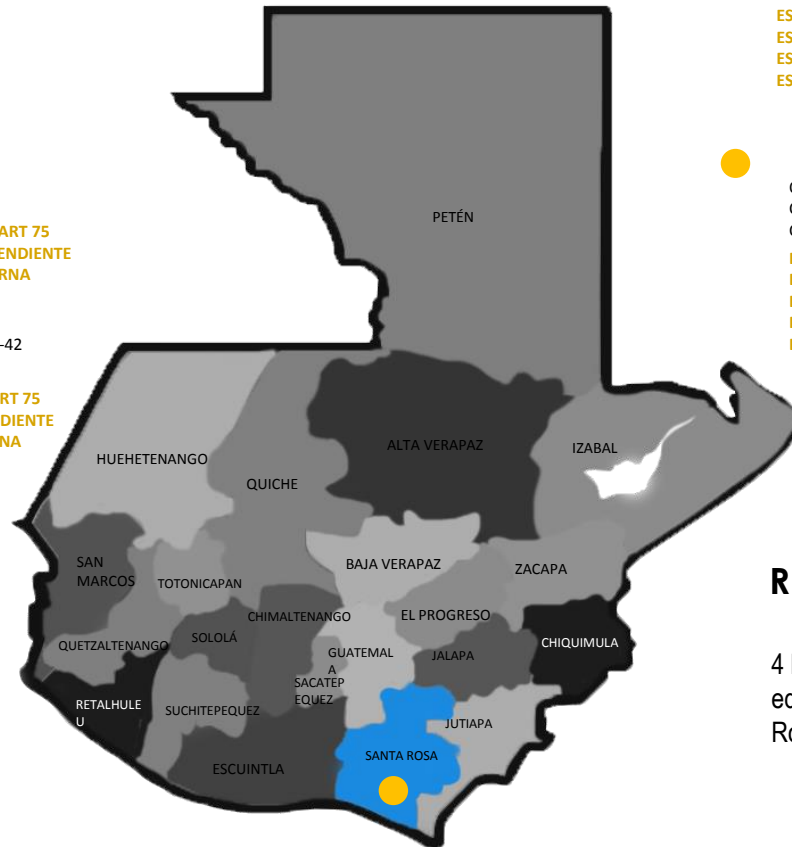

● **SNIP 242175** AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN FRANCISCO EL PINO, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA. CODIGO UDI: 06-10-0008-43

ESTADO FISICO : PERFIL 100 %
ESTADO FINANCIERO : DECRETO 25-2019 VII ART 75
ESTADO SINIP : PERFIL APROBADO, PENDIENTE
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, CONTRATACIÓN EXTERNA

● **SNIP 242181** AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN FRANCISCO LA CONSULTA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA. CODIGO UDI: 06-10-0330-43

ESTADO FISICO : PERFIL 100 %
ESTADO FINANCIERO : DECRETO 25-2019 VII ART 75
ESTADO SINIP : PERFIL APROBADO,
 PENDIENTE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, CONTRATACIÓN EXTERNA

RESUMEN

4 Proyectos de pre inversión , de educación en el departamento de Santa Rosa




PROYECTOS DE INVERSIÓN

EN PLANIFICACIÓN

Es el proceso que permite establecer los estudios de viabilidad técnica, económica, financiera, social, ambiental y legal con el objetivo de reunir información para la elaboración del proyecto.

16 Departamentos, de Guatemala con inversión

NOMENCLATURA	
2	Indica cantidad de proyectos
	Indica Departamento con inversión

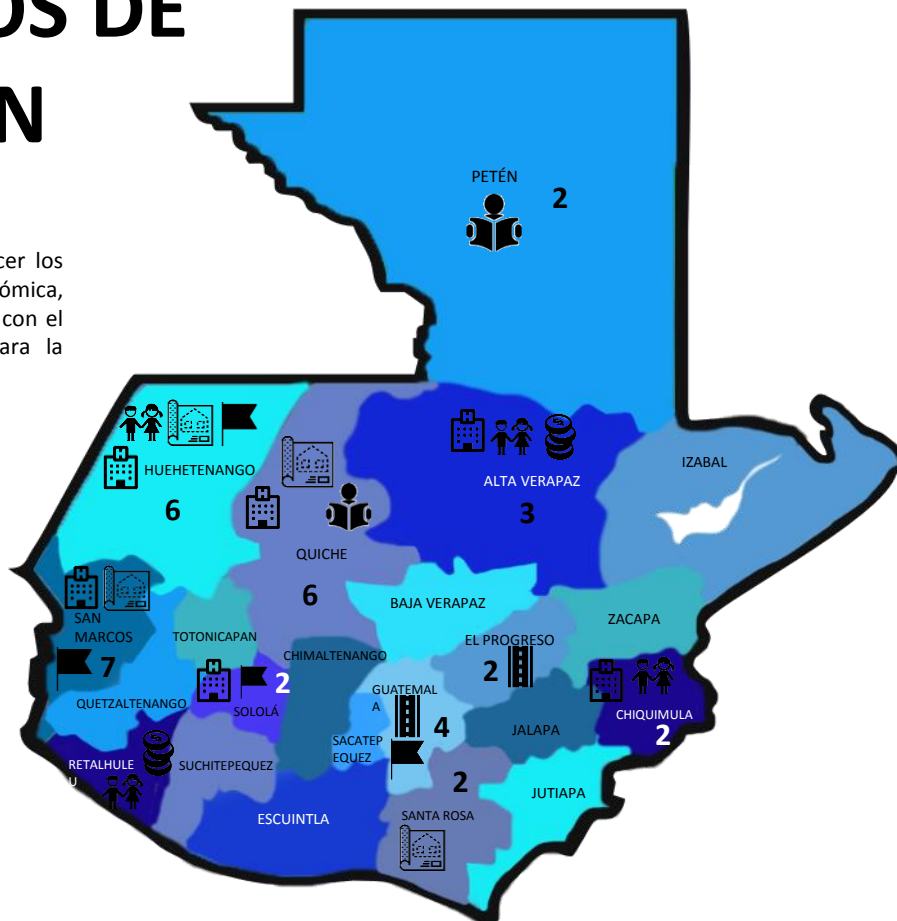

RESUMEN

- Escuelas de la reforma (EDR)**
4 Escuelas (Alta Verapaz, Retalhuleu Huehuetenango, Chiquimula)
- UBICACIÓN DE PROYECTOS GRUPAL**
Proyectos BCIE
2 Proyectos (Retalhuleu, Alta Verapaz,)
- UBICACIÓN DE PROYECTOS GRUPAL**
Proyectos Planificados sin presupuesto
7 Proyectos (Quiché, Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz, Santa Rosa)
- UBICACIÓN DE PROYECTOS GRUPAL**
Proyectos Fuente Nacional
9 proyectos (Huehuetenango, San Marcos, Sololá, Guatemala,)
- UBICACIÓN DE PROYECTOS GRUPAL**
Proyectos provincial
4 proyectos (Guatemala, El Progreso)
- UBICACIÓN DE PROYECTOS GRUPAL**
Proyectos infraestructura hospitalaria
11 proyectos (Quiché, Chiquimula, Alta Verapaz, Huehuetenango, San marcos, Sololá)
- UBICACIÓN DE PROYECTOS INDIVIDUAL**
Proyectos Segeplan
2 proyectos (Quiché, Petén)
- UBICACIÓN DE PROYECTOS GRUPAL**





INVERSIÓN


ESCUELAS DE LA REFORMA (EDR)

- **SNIP209034** CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ.
ESTADO FISICO : EN PROYECTO DE BASES
ESTADO FINANCIERO : DECRETO 25-2019 VII ,ART 75.
ESTADO SINIP : APROBADO PREFACTIBILIDAD ,
PENDIENTE PARA COTIZACIÓN Y LICITACION EN GUATECOMPRAS.
- **SNIP 209009** CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SANTA CRUZ MULUÁ, RETALHULEU.
ESTADO FISICO : PROCESO PGN
ESTADO FINANCIERO : DECRETO 25-2019 VII ART 75
ESTADO SINIP : APROBADO
PREFACTIBILIDAD , PENDIENTE PARA COTIZACIÓN Y LICITACION EN GUATECOMPRAS.
- **SNIP 242175** CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) ESQUIPULAS, CHIQUIMULA
ESTADO FISICO EN PROCESO DE PLANIFICACIÓN
ESTADO FINANCIERO : DECRETO 25-2019 VII ART 75
ESTADO SINIP : APROBADO
PREFACTIBILIDAD , PENDIENTE PARA COTIZACIÓN Y LICITACION EN GUATECOMPRAS.
- **SNIP 242181** CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) MALACANTANCITO, HUEHUETENANGO
ESTADO FISICO : EN PROCESO DE PLANIFICACIÓN
ESTADO FINANCIERO : DECRETO 25-2019 VII ART 75
ESTADO SINIP : APROBADO PREFACTIBILIDAD ,
PENDIENTE PARA COTIZACIÓN Y LICITACION EN GUATECOMPRAS.





ESCUELAS DE LA REFORMA (EDR)

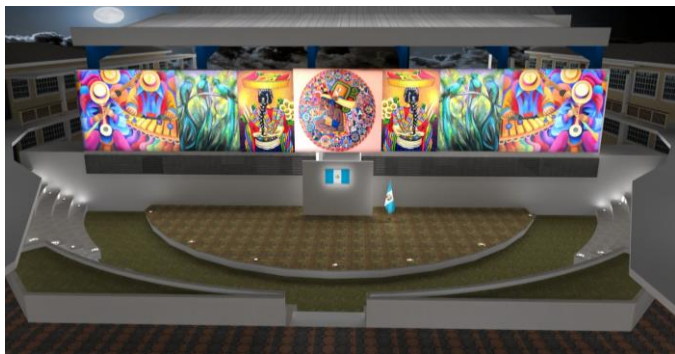

INVERSIÓN

PROYECTOS BCIE



● SNIP209034 CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ.
 ESTADO FISICO : EN PROYECTO DE BASES
 ESTADO FINANCIERO : EN REPROGRAMACION FINANCIERA PARA TRASLADO DE FONDOS
 ESTADO SINIP : APROBADO
 PENDIENTE ADJUDICACION DE EVENTO

● SNIP 209009 CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SANTA CRUZ MULUÁ, RETALHULEU.
 ESTADO FISICO : PROCESO PGN
 ESTADO FINANCIERO : EN REPROGRAMACION FINANCIERA PARA TRASLADO DE FONDOS
 ESTADO SINIP : APROBADO
 PREFACTIBILIDAD , PENDIENTE ADJUDICACION DE EVENTO



INVERSIÓN




PROYECTOS EN PLANIFICACIÓN SIN PRESUPUESTO

- SNIP 132781** REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VEGA, ZACUALPA, QUICHE.

ESTADO FISICO : **INGRESADO A SEGEPLAN**
 ESTADO FINANCIERO : **GESTION DE FINANCIAMIENTO BCIE**
 ESTADO SINIP : **PENDIENTE DE ACTIVAR EN SEGEPLAN**
- SNIP 170181** CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA PAVILTZAJ, CUILCO, HUEHUETENANGO.

ESTADO FISICO : **INGRESADO A SEGEPLAN**
 ESTADO FINANCIERO : **GESTION DE FINANCIAMIENTO BCIE**
 ESTADO SINIP : **PENDIENTE DE ACTIVAR EN SEGEPLAN**
- SNIP 170188** CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BASICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.

ESTADO FISICO : **INGRESADO A SEGEPLAN**
 ESTADO FINANCIERO : **GESTION DE FINANCIAMIENTO BCIE**
 ESTADO SINIP : **PENDIENTE DE ACTIVAR EN SEGEPLAN**

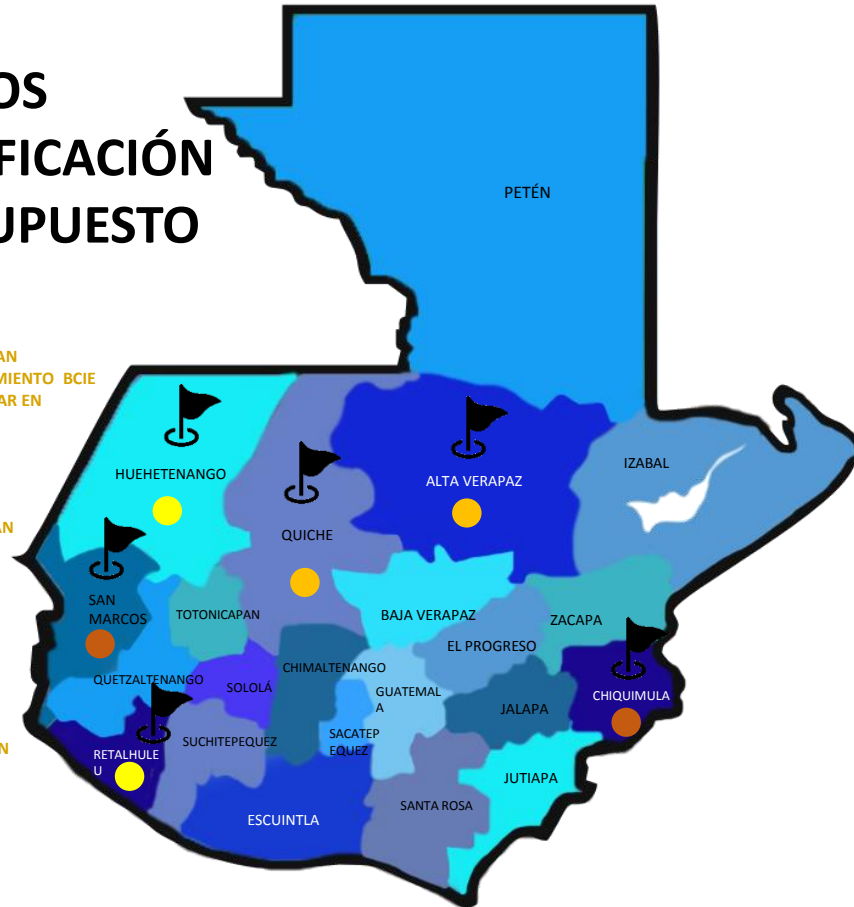

- SNIP 224685** CONTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.

ESTADO FISICO : **INGRESADO A SEGEPLAN**
 ESTADO FINANCIERO : **FINACIAMIENTO BCIE**
 ESTADO SINIP : **PENDIENTE DE ACTIVAR EN SEGEPLAN**
- SNIP 209034** CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ.

ESTADO FISICO : **EN PROYECTO DE BASES**
 ESTADO FINANCIERO : **FINACIAMIENTO BCIE**
 ESTADO SINIP : **APROBADO PREFACTIBILIDAD , PENDIENTE PARA COTIZACION Y LICITACION EN GUATECOMPRAS.**
- SNIP 155973** MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CANTÓN BUENA VISTA, SANTA MARÍA IXHUATÁN, SANTA ROSA

ESTADO FISICO : **APROBADO EN SEGEPLAN**
 ESTADO FINANCIERO : **FINACIAMIENTO BCIE**
 ESTADO SINIP : **PENDIENTE DE ACTIVAR EN SEGEPLAN**
- SNIP 226775** MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA FAJA CHIQUIMULLILLA SANTA ROSA.

ESTADO FISICO : **APROBADO EN SEGEPLAN**
 ESTADO FINANCIERO : **FINACIAMIENTO BCIE**
 ESTADO SINIP : **PENDIENTE DE ACTIVAR EN SEGEPLAN**



INVERSIÓN

Proyectos Fuente nacional


FT 11 "INGRESOS CORRIENTES"

- SNIP 133369** REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA JOVI, CUILCO, HUEHUETENANGO.

ESTADO FISICO : **INGRESADO A SEGEPLAN**
 ESTADO FINANCIERO : **DECRETO 25-2019 VII ,ART 75.**
 ESTADO SINIP : **ACTIVO, PENDIENTE DE CONCURSO DE LICITACIÓN**
- SNIP 131645** REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARÍA ALBERTINA GÁLVEZ GARCÍA, EL QUETZAL, SAN MARCOS.

ESTADO FISICO : **INGRESADO A SEGEPLAN**
 ESTADO FINANCIERO : **DECRETO 25-2019 VII ,ART 75.**
 ESTADO SINIP : **PENDIENTE DE ACTIVAR EN SEGEPLAN**
- SNIP 131626** REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO RAMAZZINI, EL RODEO, SAN MARCOS.

ESTADO FISICO : **EN PROYECTO DE BASES**
 ESTADO FINANCIERO : **DECRETO 25-2019 VII ,ART 75.**
 ESTADO SINIP : **PENDIENTE DE ACTIVAR EN SEGEPLAN**

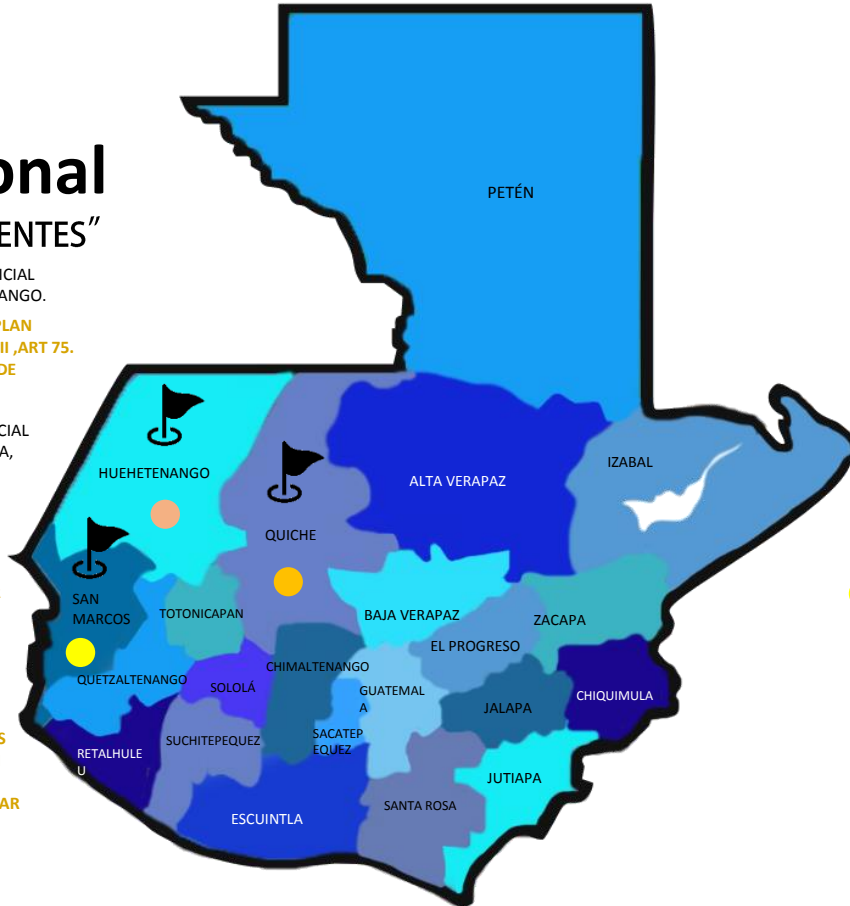

- SNIP 224915** CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO SAN CARLOS YAJAUCÚ, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO.

ESTADO FISICO : **INGRESADO A SEGEPLAN**
 ESTADO FINANCIERO : **DECRETO 25-2019 VII ,ART 75.**
 ESTADO SINIP : **PENDIENTE DE ACTIVAR EN SEGEPLAN**
- SNIP 131648** REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR. FRANCISCO ASTURIAS, LA REFORMA, SAN MARCOS.

ESTADO FISICO : **INGRESADO A SEGEPLAN**
 ESTADO FINANCIERO : **DECRETO 25-2019 VII ,ART 75.**
 ESTADO SINIP : **PENDIENTE DE ACTIVAR EN SEGEPLAN**




INVERSIÓN



Proyectos Fuente nacional

FT 11 "INGRESOS CORRIENTES"

- **SNIP 133658** REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO XOLCAJÁ, NAHULÁ, SOLOLÁ.
 ESTADO FISICO
 ESTADO FINANCIERO
 ESTADO SINIP
 SEGEPLAN
 INGRESADO A SEGEPLAN
 DECRETO 25-2019 VII ,ART 75.
 PENDIENTE DE ACTIVAR EN SEGEPLAN
- **SNIP 229966** MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PARA PRIVADOS DE LIBERTAD CENTRO ESPECIALIZADO DE REINSECCIÓN, FINCA SAN ANTONIO, ALDEA EL PLATANAR, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA.
 ESTADO FISICO
 ESTADO FINANCIERO
 ESTADO SINIP
 EVALUACION EN SEGEPLAN
 INGRESADO A SEGEPLAN
 FINANCIAMIENTO BCIE
 PENDIENTE DE

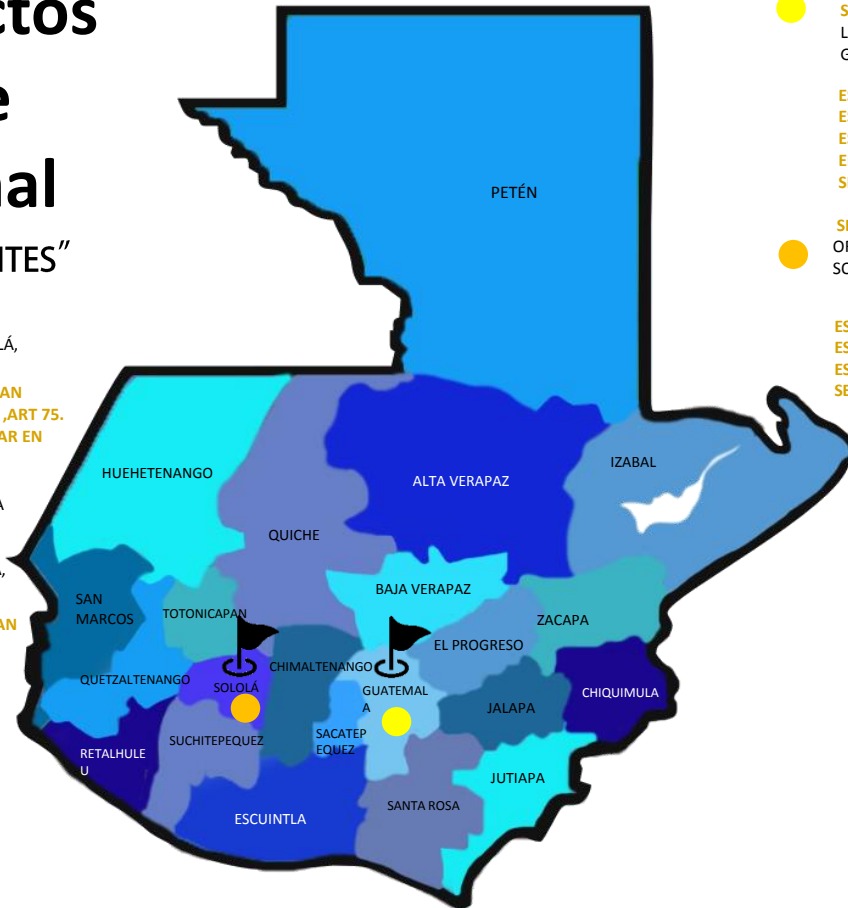


- **SNIP 243912** EORM JORNDA MATUTINA COLONIA LAS MARGARITAS EL BUCARO, ZONA 12 VILLA NUEVA, GUATEMALA.
 EN PROYECTO DE BASES
 DECRETO 25-2019 VII ,ART 75.
 PENDIENTE DE EVALUACION EN SEGEPLAN
- **SNIP 150614** AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUCUBAL, NAHUALÁ, SOLOLÁ.
 INGRESADO A SEGEPLAN
 DECRETO 25-2019 VII ,ART 75.
 PENDIENTE DE EVALUACION EN SEGEPLAN



INVERSIÓN

- **SNIP 133210** CONSTRUCCION EDIFICIO PARQUE VIAL, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA
 ESTADO FISICO INGRESADO A SEGEPLAN
 ESTADO FINANCIERO DECRETO 25-2019 VII ,ART 75.
 ESTADO SINIP PENDIENTE CONVENIO Y EVALUACIÓN EN SEGEPLAN
- **SNIP 55903** CONSTRUCCION EDIFICIO OPERATIVO, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.
 ESTADO FISICO INGRESADO A SEGEPLAN
 ESTADO FINANCIERO DECRETO 25-2019 VII ,ART 75.
 ESTADO SINIP PENDIENTE CONVENIO Y EVALUACIÓN EN SEGEPLAN

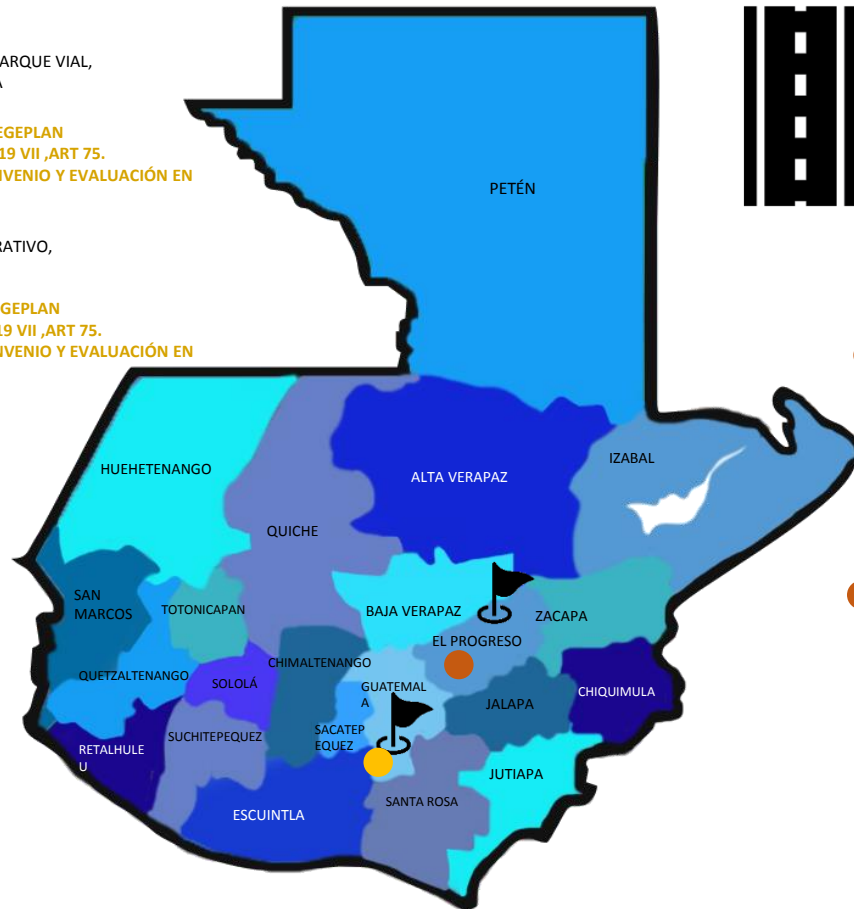

PROYECTOS PROVIAL


- **SNIP 205031** CONSTRUCCION EDIFICIO ACADEMIA DE FORMACIÓN DE BRIGADAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO.
 ESTADO FISICO INGRESADO A SEGEPLAN
 ESTADO FINANCIERO DECRETO 25-2019 VII ,ART 75.
 ESTADO SINIP PENDIENTE CONVENIO Y EVALUACIÓN EN SEGEPLAN
- **SNIP 133043** CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO, FASE 2..
 ESTADO FISICO EN PROYECTO DE BASES
 ESTADO FINANCIERO DECRETO 25-2019 VII ,ART 75.
 ESTADO SINIP PENDIENTE CONVENIO Y EVALUACIÓN EN SEGEPLAN





Proyectos Infraestructura Hospitalaria

INVERSIÓN

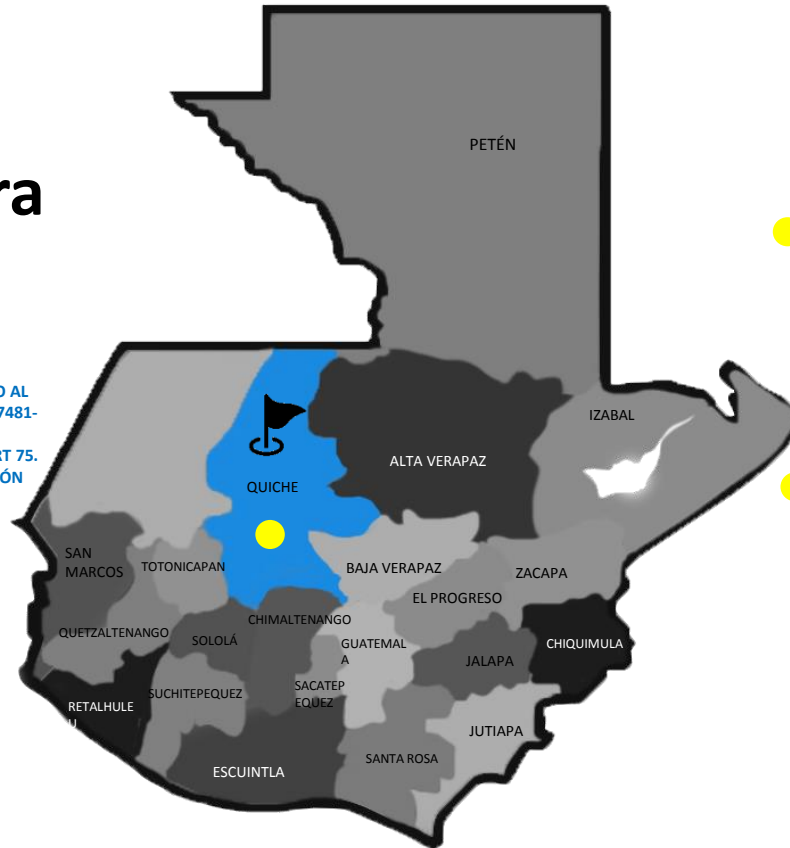

SNIP 224103 Mejoramiento Centro de Atención Permanente, (CAP) Zacualpa, Quiche

ESTADO FISICO: EL PROYECTO FUE INGRESADO AL MARN EL 03/DICIEMBRE/2018 No. Expediente: (EAI-7481-2018)

ESTADO FINANCIERO: DECRETO 25-2019 VII ,ART 75.
ESTADO SINIP PENDIENTE SU ACTIVACIÓN
EN SEGEPLAN

SNIP 224123 Mejoramiento Centro de Salud de Chupol, Chichicastenango, Quiche

ESTADO FISICO: SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EVALUACION DEL EXPEDIENTE POR PARTE DE USEPLAN / SEGEPLAN (para su Activación/Aprobación en el ejercicio fiscal 2019)

ESTADO FINANCIERO: DECRETO 25-2019 VII ,ART 75.

ESTADO SINIP PENDIENTE SU ACTIVACIÓN
EN SEGEPLAN

SNIP 223988 Mejoramiento Centro de atención permanente (CAP) San Gaspar Chajul, Quiche.

ESTADO FISICO: SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EVALUACION DEL EXPEDIENTE POR PARTE DE USEPLAN / SEGEPLAN (para su Activación/Aprobación en el ejercicio fiscal 2019)

ESTADO FINANCIERO DECRETO 25-2019 VII ,ART 75.
ESTADO SINIP PENDIENTE SU ACTIVACIÓN EN SEGEPLAN

SNIP 232678 Mejoramiento Centro de Salud, Aldea Tzetun, Ixcán, Quiche


ESTADO FISICO: EL PROYECTO FUE INGRESADO AL MARN EL 13/DICIEMBRE/2018 No. Expediente: (EAI-7898-2018)


ESTADO FINANCIERO DECRETO 25-2019 VII ,ART 75.
ESTADO SINIP PENDIENTE SU ACTIVACIÓN EN SEGEPLAN



INVERSIÓN

Proyectos Infraestructura Hospitalaria

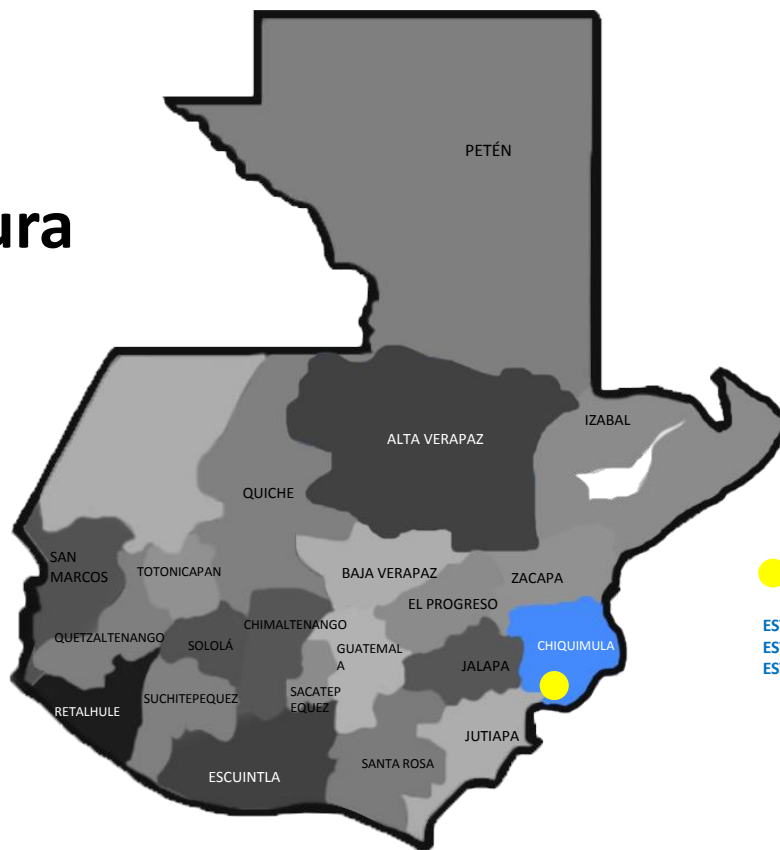


-  **SIN SNIP** Centro de Salud Ipala, Chiquimula
- ESTADO FISICO**
- ESTADO FINANCIERO**
- ESTADO SINIP**
- SE REQUIERE DE ESTUDIO AMBIENTAL**
DECRETO 25-2019 VII ,ART 75.
PENDIENTE CREACIÓN DE SNIP



INVERSIÓN

Proyectos Infraestructura Hospitalaria

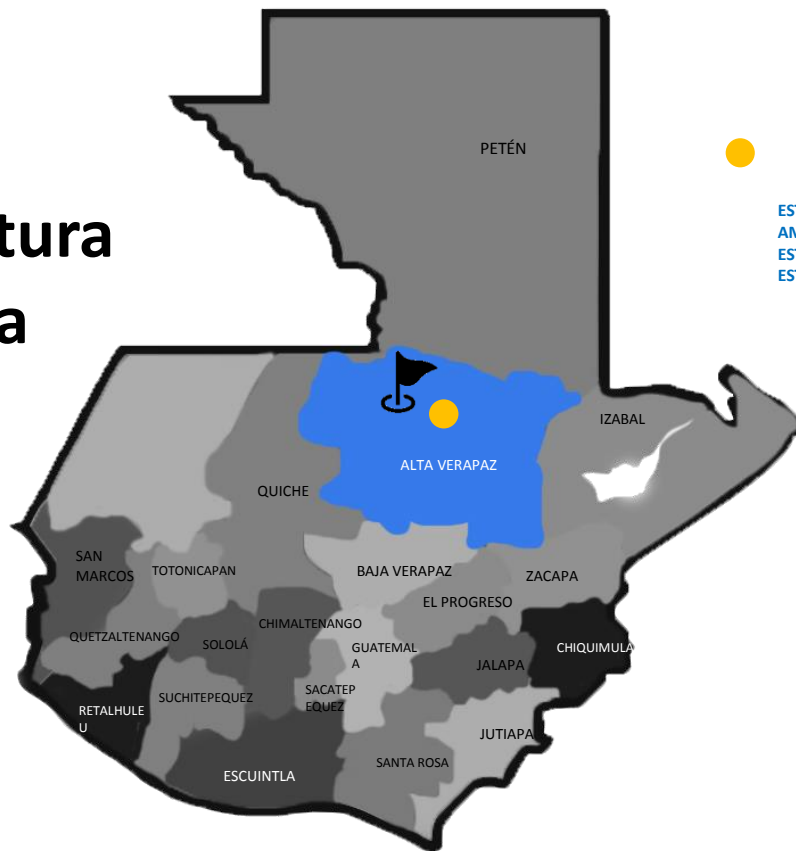

SIN SNIP Centro de Atención Permanente, Lanquin Verapaz.

ESTADO FÍSICO:
AMBIENTAL

SE REQUIERE DE ESTUDIO

ESTADO FINANCIERO:

DECRETO 25-2019 VII, ART 75.

ESTADO SINIP:


PENDIENTE CREACIÓN DE SNIP





Proyectos Infraestructura Hospitalaria

INVERSIÓN

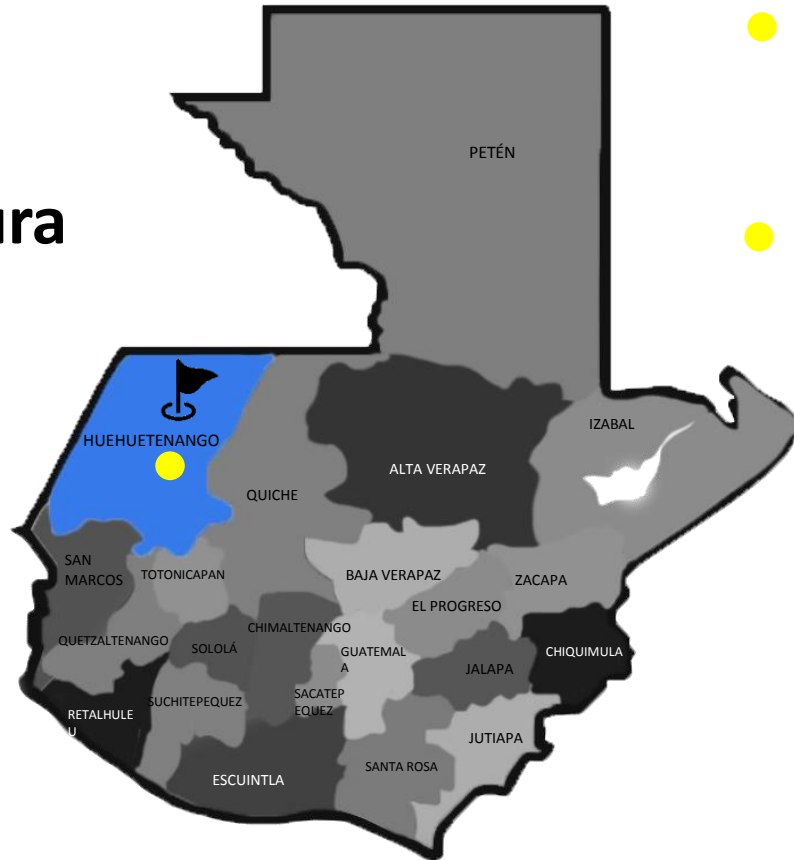


- **SNIP 224020** Mejoramiento Centro de Atención Permanente (CAP) Jacaltenango, Huehuetenango
ESTADO FISICO: SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EVALUACION DEL EXPEDIENTE POR PARTE DE USEPLAN / SEGEPLAN (para su Activación/Aprobación en el ejercicio fiscal 2019)
ESTADO FINANCIERO: DECRETO 25-2019 VII ,ART 75.
ESTADO SINIP : PENDIENTE DE ACTIVAR EN SEGEPLAN


- **SNIP 223945** CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA PAVILTZAJ, CUILCO, HUEHUETENANGO.
ESTADO FISICO: Mejoramiento Centro de Salud San Ildelfonso, Ixtahuacán, Huehuetenango
ESTADO FINANCIERO : DECRETO 25-2019 VII ,ART 75.
ESTADO SINIP : PENDIENTE DE ACTIVAR EN SEGEPLAN



INVERSIÓN



Proyectos Infraestructura Hospitalaria

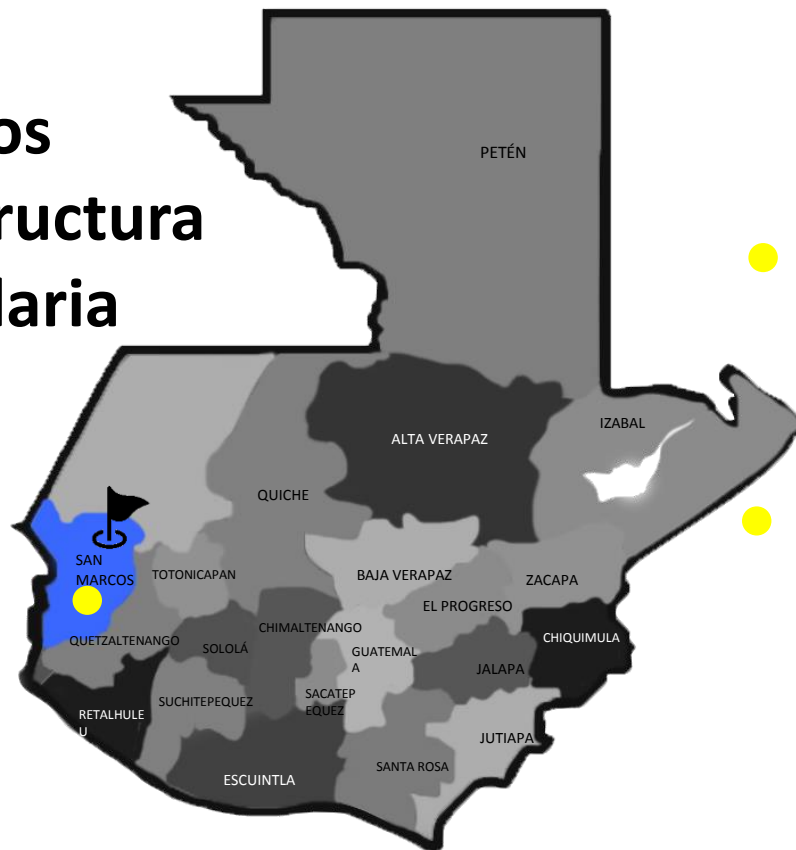

SIN SNIP Centro de Atención Permanente, Sibinal, San Marcos.

ESTADO FISICO : SE REQUIERE DE ESTUDIO AMBIENTAL
ESTADO FINANCIERO : DECRETO 25-2019 VII ,ART 75.
ESTADO SINIP : NO ACTIVO


SNIP 227552 Mejoramiento Centro de Atención Integral Materno-Infantil (CAIMI), Tejutla, San Marcos

ESTADO FISICO : EL PROYECTO FUE
INGRESADO AL MARN EL 13/DICIEMBRE/2018 No.
Expediente: (EAI-7881-2018)
ESTADO FINANCIERO : DECRETO 25-2019 VII ,ART
 75.
ESTADO SINIP : NO ACTIVO



INVERSIÓN

Proyectos Infraestructura Hospitalaria

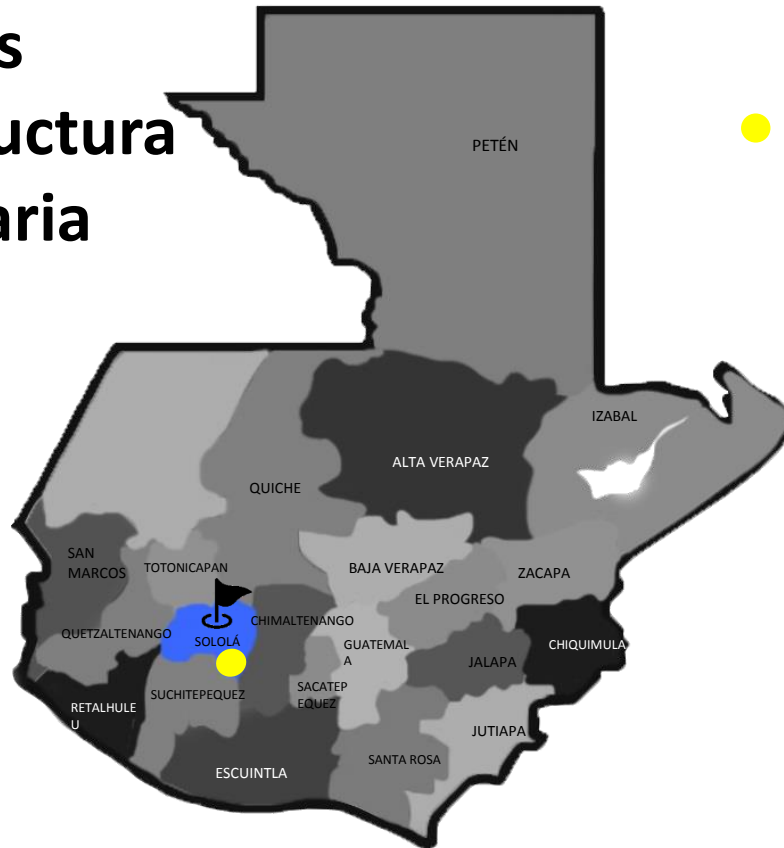

● **SNIP 224014** Mejoramiento Centro de Atención Permanente (CAP) San Lucas Tolimán, Sololá


ESTADO FÍSICO : SE ENCUENTRA EN ESPERA DE DICTAMEN DE CONAP (No. Expediente 2018-42103) Y POSTERIORMENTE EN ESPERA DE RESOLUCIÓN AMBIENTAL (MARN)
ESTADO FINANCIERO : DECRETO 25-2019 VII ,ART 75.
ESTADO SINIP : PENDIENTE ACTIVAR EN SEGEPLAN



PROYECTOS SEGEPLAN



INVERSIÓN

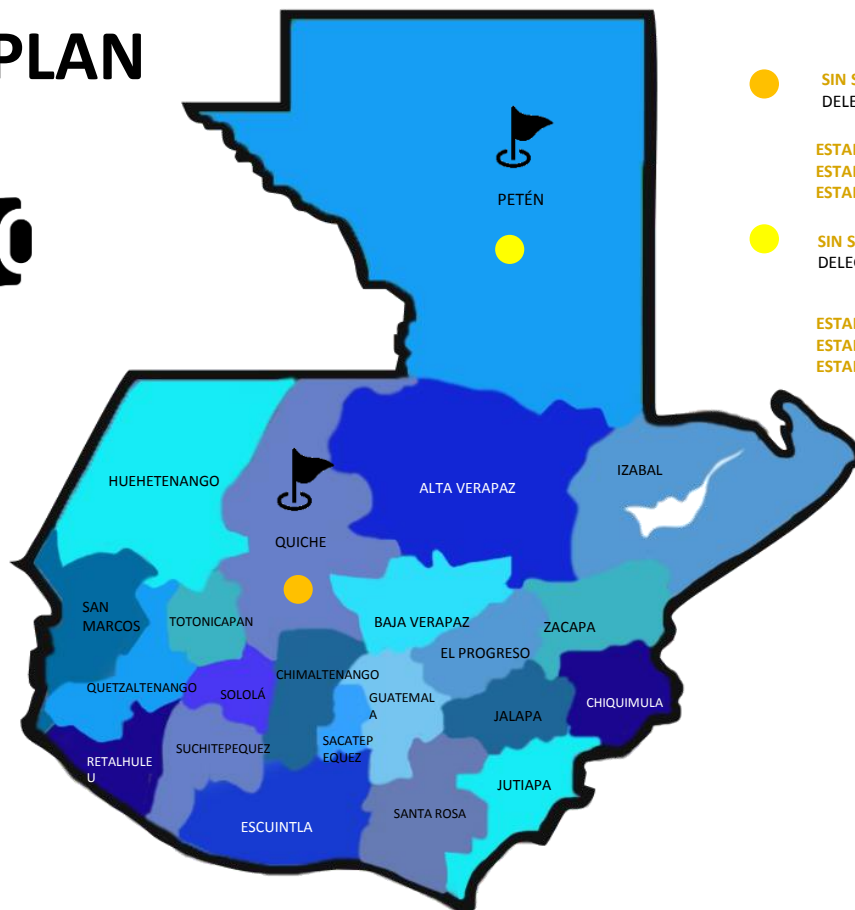

● **SIN SNIP** CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN SUBDEPARTAMENTAL DE IXCAN.

ESTADO FISICO : **INGRESADO A SEGEPLAN**
ESTADO FINANCIERO : **DECRETO 25-2019 VII ,ART 75**
ESTADO SNIP: **PENDIENTE CREAR SNIP**

● **SIN SNIP** CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE PETÉN

ESTADO FISICO : **INGRESADO A SEGEPLAN**
ESTADO FINANCIERO : **DECRETO 25-2019 VII ,ART 75.**
ESTADO SNIP: **PENDIENTE CREAR SNIP**




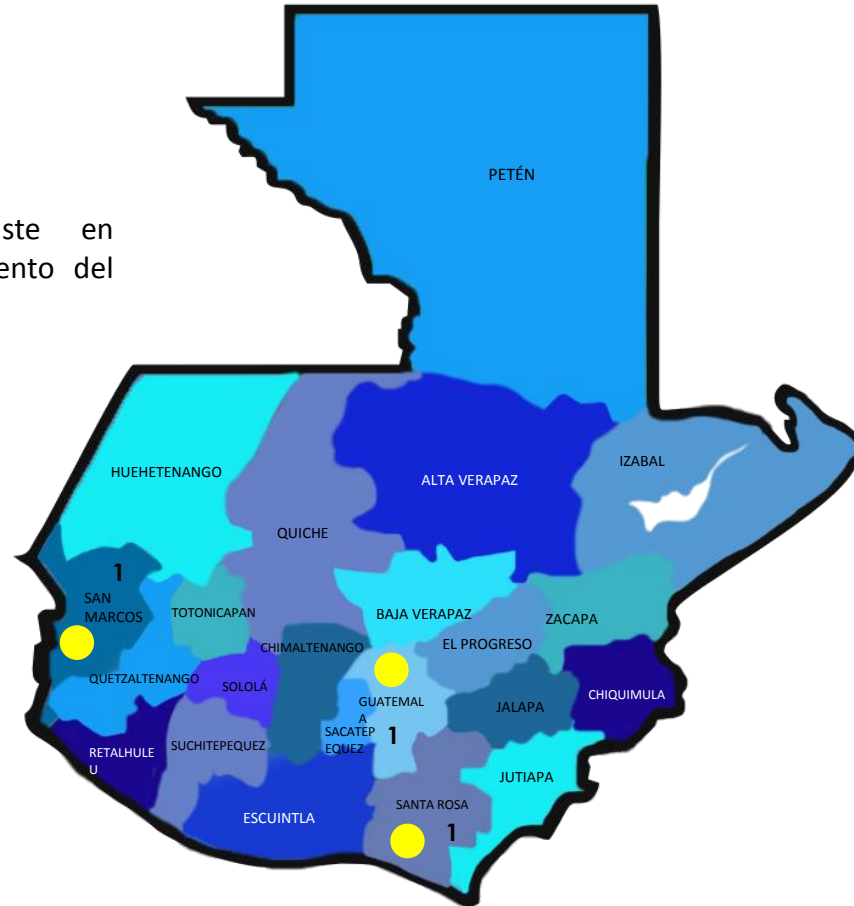
PROYECTOS DE FUNCIONAMIENTO

Remozamientos Integrales,

EN PLANIFICACIÓN

EL remozamiento consiste en rehabilitación o mejoramiento del espacio físico existente.


NOMENCLATURA	
1	Indica cantidad de proyectos
	Indica Departamento con pre inversión




Antes



Después

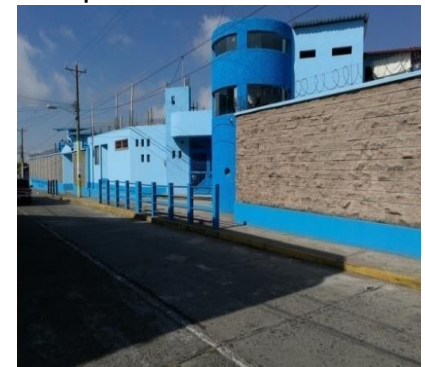

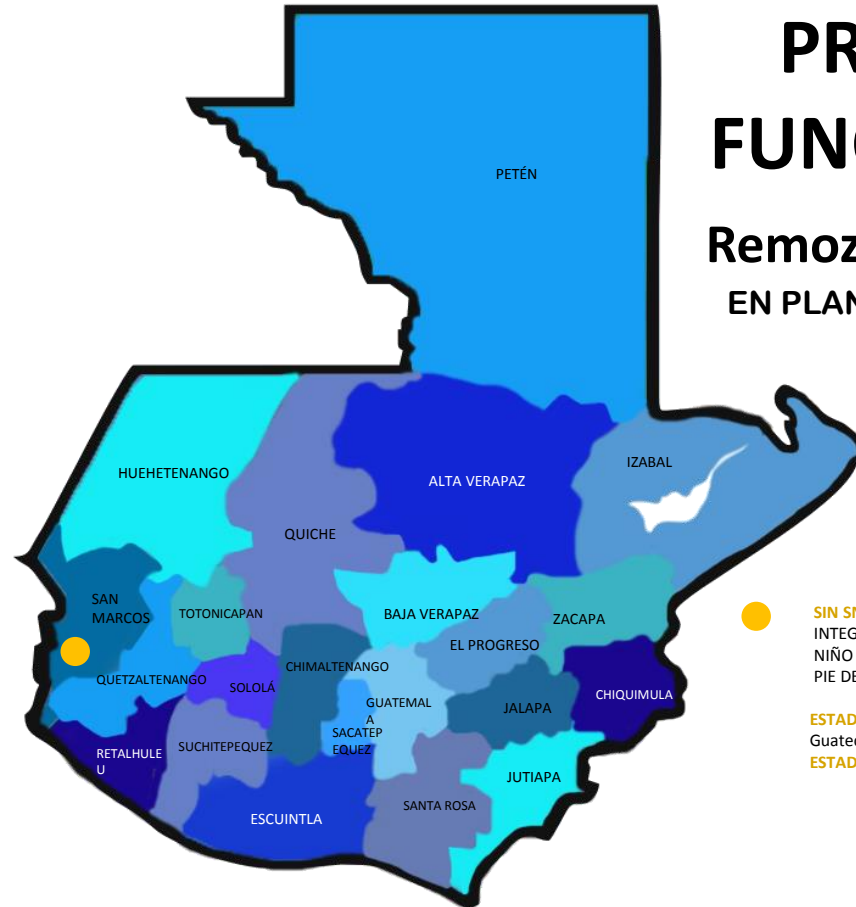

PROYECTOS DE FUNCIONAMIENTO

Remozamientos Integrales, EN PLANIFICACIÓN

● **SIN SNIP** REMOZAMIENTO CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL – PROYECTO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y LA NIÑA-, ALDEA EL NARANJO, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS

ESTADO FISICO : Proyecto a adjudicarse en Guatecompras


ESTADO FINANCIERO : DECRETO 25-2019 VII ,ART 75



INVERSIÓN

PROYECTOS DE FUNCIONAMIENTO

Remozamientos Integrales, EN PLANIFICACIÓN

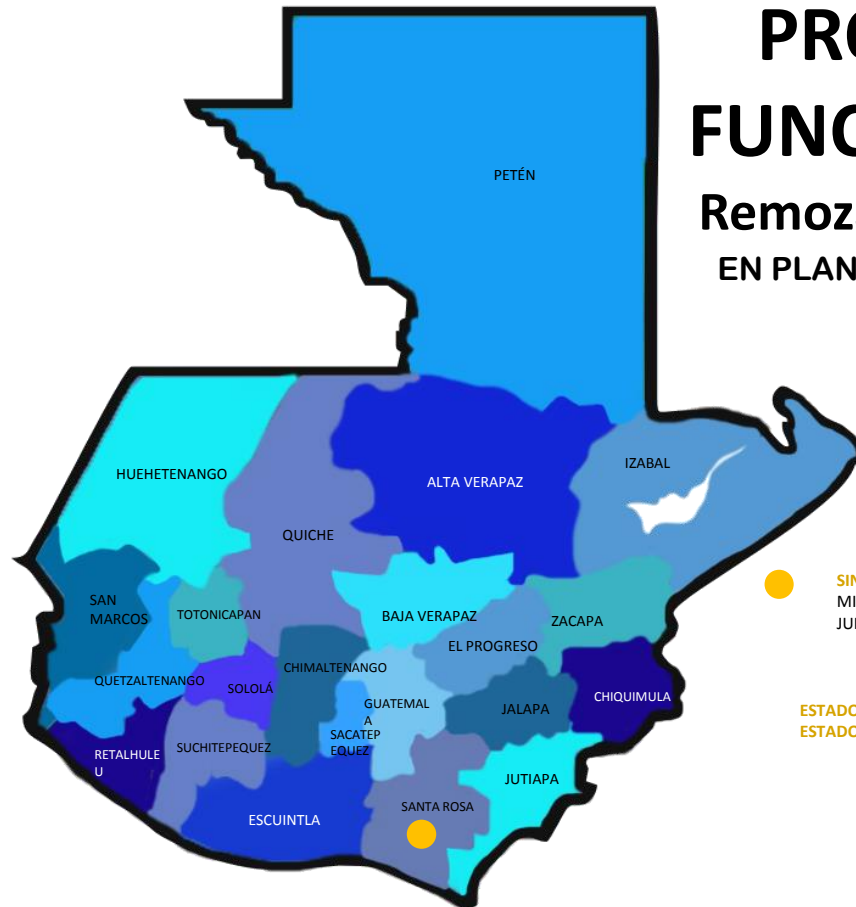

● **SIN SNIP** REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROF. GREGORIO GAITAN DUARTE, ALDEA EL JUNQUILLO, BARBERENA, SANTA ROSA


ESTADO FISICO : Proyecto a adjudicarse en Guatecompras
ESTADO FINANCIERO : **DECRETO 25-2019 VII ,ART 75**



INVERSIÓN

PROYECTOS DE FUNCIONAMIENTO

Remozamientos Integrales, EN PLANIFICACIÓN

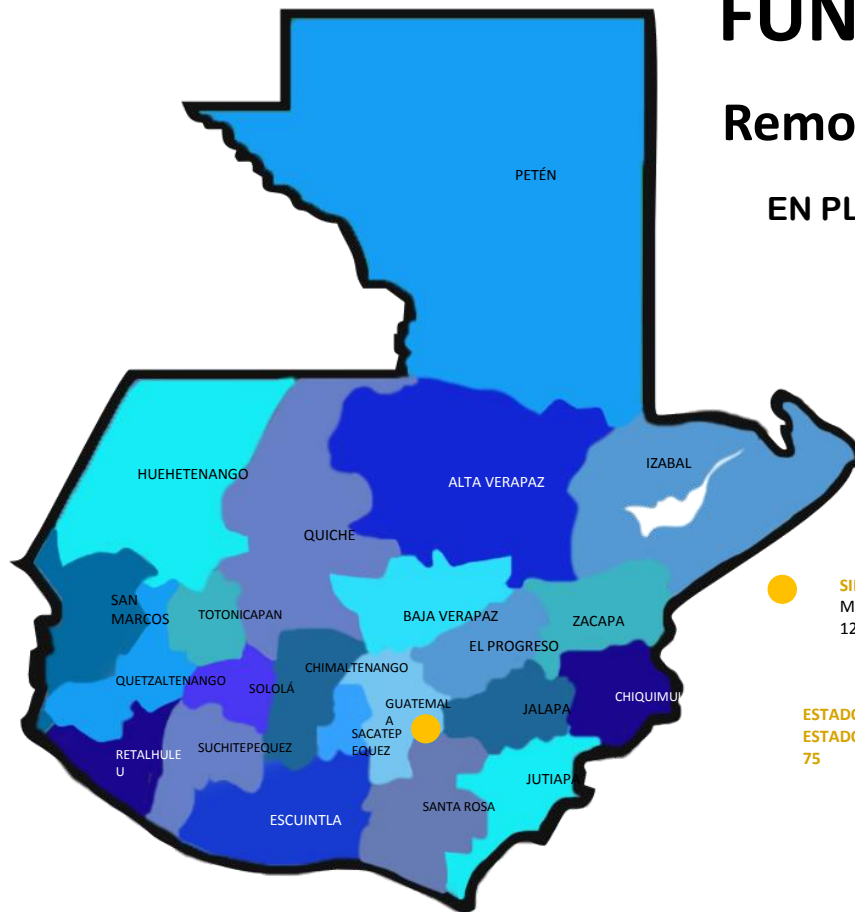

● SIN SNIP REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, LABORATORIO NO. 1 'RAYMOND H. RIGNALL', 12 AVE. 'B' 8-41, ZONA 2, CIUDAD CAPITAL

ESTADO FISICO Proyecto en Planificación
ESTADO FINANCIERO DECRETO 25-2019 VII ,ART 75



INVERSIÓN

Remozamientos EN GUAATECOMPRAS



RESUMEN

- 15 Remozamientos Jutiapa
- 17 Remozamientos Guatemala
- 2 Remozamientos Quetzaltenango
- 3 Remozamientos Huehuetenango
- 3 Remozamiento Escuintla
- 1 Remozamiento San Marcos
- 4 Remozamiento Santa Rosa
- 11 Remozamiento Petén
- 2 Remozamiento El Progreso
- 2 Remozamiento Suchitepéquez
- 2 Remozamiento Retalhuleu

43 EVENTOS TOTAL


62 REMOZAMIENTOS



REMOZAMIENTOS EN GUATECOMPRAS

GUATEMALA

- NOG 10669701** REMOZAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXP. CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DR. JOSE MATOS PACHECO, GUATEMALA, GUATEMALA
- NOG 10722750** REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PIOL, SAN SEBASTIÁN, HUEHUETENANGO, REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO CAMALMAPA 1, SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ Y REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES NO. 25 JOSE MARIA VELA IRRISARI, GUATE. GUATE.
- Nota. Este Nog. contiene 2 ubicaciones geográficas más
- NOG 10722939** REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, NO. 301 NIÑO VICTORIOSO, VILLA NUEVA, GUATEMALA
- NOG 10140085** REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, NO.301 NIÑO VICTORIOSO, VILLA NUEVA, GUATEMALA
- NOG 10139869** REMOZAMIENTO ESCUELA DE NIÑOS NO. 3 CAYETANO FRANCO Y MONROY, GUATEMALA, GUATEMALA Y REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 149 4 DE FEBRERO, GUATEMALA, GUATEMALA
- NOG 10139877** REMOZAMIENTO ESC. OFICIAL URB. DE NIÑAS NO.3 DOLORES BEDOYA DE MOLINA, GUATEMALA, GUATEMALA, REMOZAMIENTO ESC. OFICIAL URB. DE VARONES NO.25 JOSE MARIA VELA IRRISARI, GUATEMALA, GUATEMALA Y REMOZAMIENTO ESC. OFICIAL URB. MIXTA DE APLICACION NO.16 REPUBLICA DE BOLIVIA, GUATEMALA, GUATEMALA
- NOG 10139907** REMOZAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA EXP. CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DR. JOSE MATOS PACHECO, GUATEMALA, GUATEMALA Y REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO.148 ¿MUCHACHAS GUIAS DE NORUEGA¿, MIXCO, GUATEMALA
- NOG 10139958** REMOZ. INST. NAC. MIXTO DE EDUC. DIVERS. SAN PASCUAL III, GUATEM., GUATEM., REMOZ. ESC. OF. RURAL MIXTA VALLE DE NAZARETH, VILLA NUEVA, GUATEM., REMOZ. ESC. OFI. RURAL MIXTA, COL. ENRIQUETA, VILLA NUEVA, GUATEM. Y REMOZ. EODP ANEXA A ESC. VILLALOBOS NORTE ARMANDO VELASQUEZ VILLA NUEVA GUATE.
- NOG 10746455** REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS NO.49 JESUS CASTRO GOMEZ, GUATEMALA, GUATEMALA
- NOG 10731989** REMOZAMIENTO ESCUELA DE NIÑOS NO. 3 CAYETANO FRANCO Y MONROY, GUATEMALA, GUATEMALA Y REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE APLICACIÓN NO. 16 REPÚBLICA DE BOLIVIA, GUATEMALA, GUATEMALA
- NOG 10140077** REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS NO.49 JESUS CASTRO GOMEZ, GUATEMALA
- NOG 10730680** REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO 149 4 DE FEBRERO, GUATEMALA, GUATEMALA Y REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS NO. 3 DOLORES BEDOYA DE MOLINA, GUATEMALA, GUATEMALA

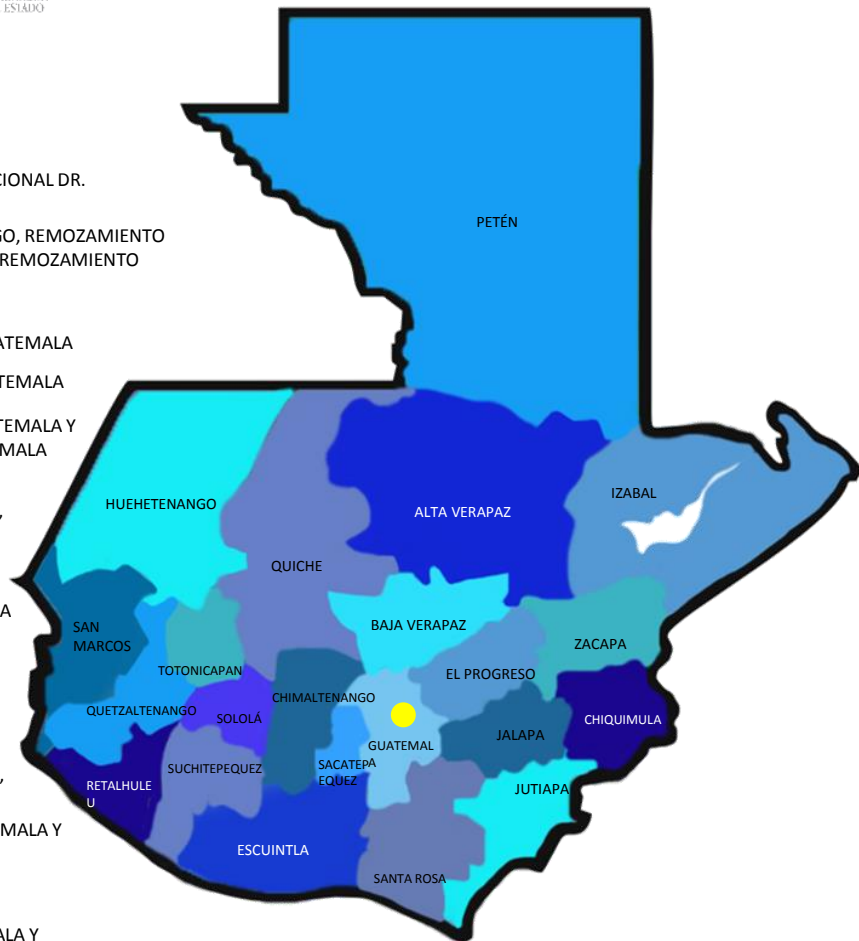

RESUMEN DE PROYECTOS


19 Remozamientos en Guatemala



REMOZAMIENTOS EN GUATECOMPRAS

JUTIAPA

- NOG 10414681** REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL BOTADERO, CANTON VALENCIA, JUTIAPA, JUTIAPA
- NOG 10453598** REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN SAN JOSÉ BUENA VISTA, JUTIAPA, JUTIAPA
- NOG 10453687** REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO EL BOTADERO, CANTÓN VALENCIA, JUTIAPA, JUTIAPA
- NOG 10453725** REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS TUNAS, JUTIAPA, JUTIAPA
- NOG 10453741** REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ASUNCIÓN GRANDE, ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA
- NOG 10453776** REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA GUEVARA, ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA
- NOG 10565795** REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN VALENCIA, JUTIAPA, JUTIAPA
- NOG 10413820** REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO LATINO, JUTIAPA, JUTIAPA
- NOG 10414010** REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA LABOR, MARIAS MONTAÑAS, JUTIAPA, JUTIAPA Y REMOZAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA ALDEA LOS ANONOS CANTÓN VALENCIA, JUTIAPA, JUTIAPA
- NOG 10414061** REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON ANIMAS LOMAS, JUTIAPA, JUTIAPA
- NOG 10414150** GRUPO 20 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL COCO, JALPATAGUA, JUTIAPA Y REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL ANEXA A EORM REPUBLICA DE ALEMANIA, ALDEA EL COCO, JALPATAGUA, JUTIAPA
- NOG 10414401** REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA LA UNION, JALPATAGUA, JUTIAPA Y REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA PEDRO MOLINA, JALPATAGUA, JUTIAPA
- NOG 10414584** REMOZAMIENTO ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FISICA 8a CALLE ZONA 1, BARRIO LATINO, JUTIAPA, JUTIAPA

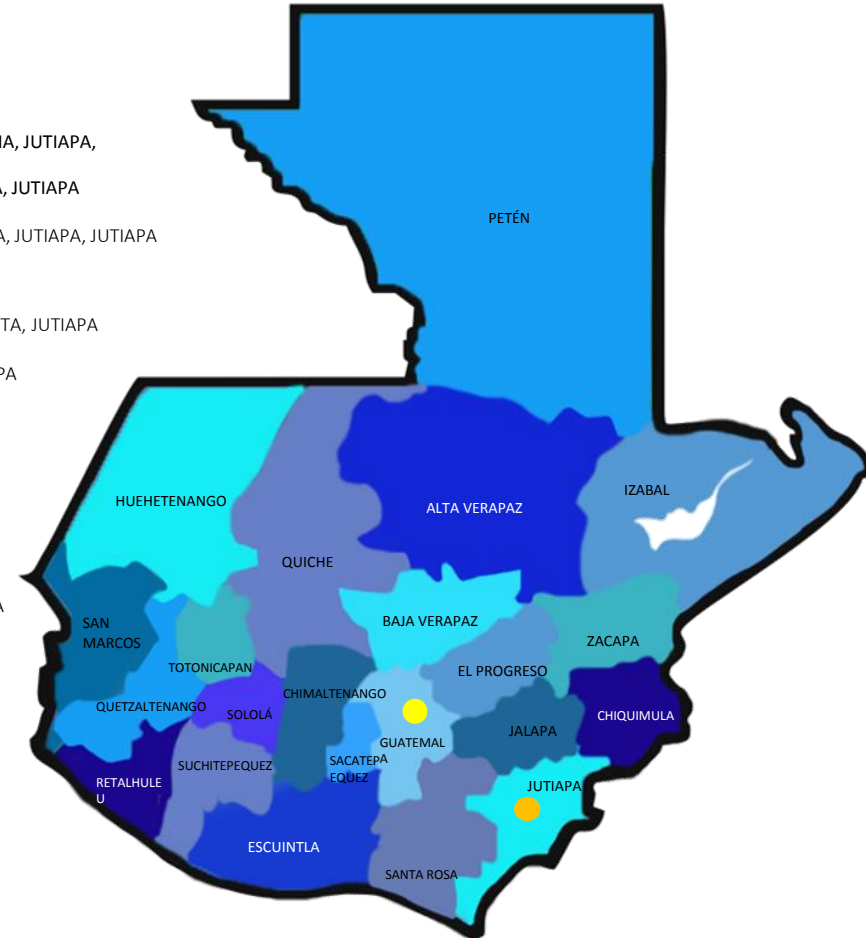

RESUMEN DE PROYECTOS

15 Remozamientos en Jutiapa



REMOZAMIENTOS EN GUATECOMPRAS

QUETZALTENANGO Y SUCHITEPEQUEZ

NOG 10140069 REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA ESPERANZA, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO

NOG 10731008 REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, LABOR PARRASQUIN, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ Y REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA ESPERANZA, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO

HUEHUETENANGO

NOG 10723137 REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN LORENZO, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO

NOG 10139818 REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN LORENZO, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO Y REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PIOL, SAN SEBASTIÁN, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO

ESCUINTLA Y PROGRESO

NOG 10730850 REMOZAMIENTO INSTITUTO NACIONAL EDUCACIÓN BÁSICA ERNESTO CHAVARRIA RIVADENEYRA, SANARATÉ, EL PROGRESO Y REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL REPARO, NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA

SAN MARCOS

NOG 10993649 REMOZAMIENTO CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL -PROYECTO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y LA NIÑA-, ALDEA EL NARANJO, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS.

SANTA ROSA


NOG 10993754 REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROF. GREGORIO GAITAN DUARTE, ALDEA EL JUNQUILLO, BARBERENA, SANTA ROSA.

NOG 10140050 REMOZ. ESC. OF. DE PÁRVULOS ANEXA A EORM, ALDEA SAN JOSÉ EL RINCONCITO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA, REMOZ. DE ESC. OF. DE PARVULOS, ANEXA A EORM PEDRO ISAAC CRESPO, GUASACAPAN, SANTA ROSA Y REMOZ. ESC. OF. RURAL MIXTA, ALDEA CERRO GORDO SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA

RESUMEN DE PROYECTOS

3 Remozamientos en Huehuetenango
2 Remozamiento en Quetzaltenango
1 Remozamiento en San marcos

1 Remozamientos en Escuintla
4 Remozamientos en Santa Rosa
1 Remozamiento en Suchitépéquez
1 Remozamientos en El progreso

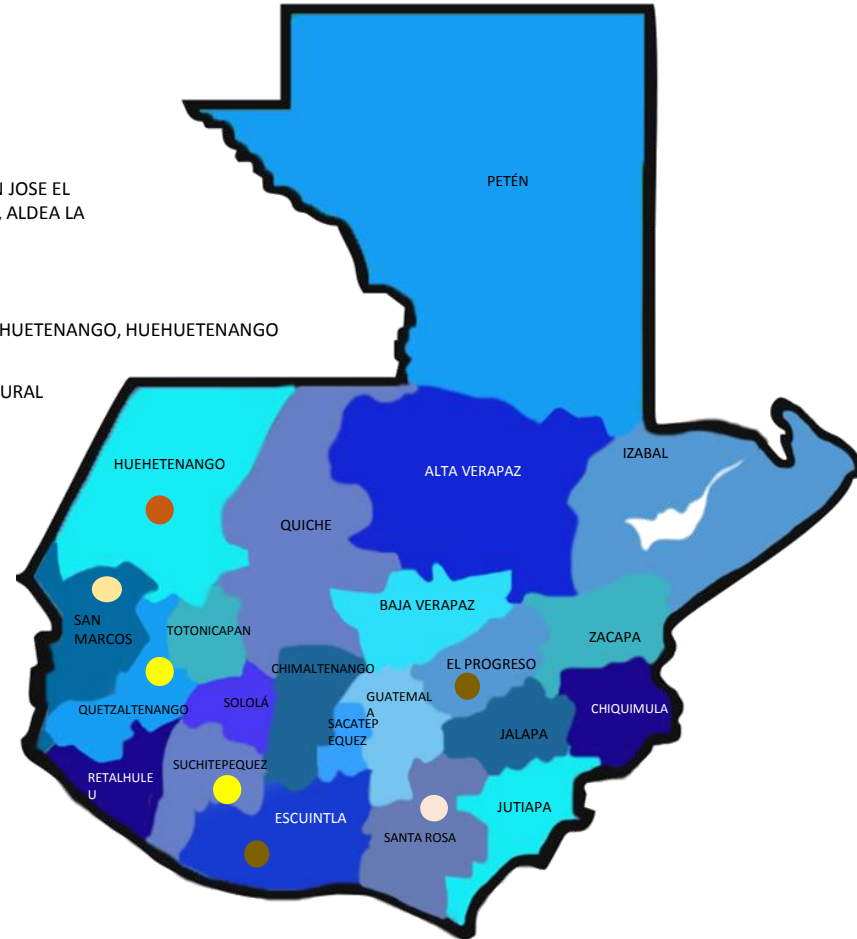

REMOZAMIENTOS EN GUATECOMPRAS

PETÉN

[NOG 10140042](#)

REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO EL PORVENIR, SAN BENITO, PETEN Y REMOZAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, CASERIO LAS VIÑAS, FLORES, PETEN

[NOG 10139990](#)

REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA MACANCHE, FLORES, PETEN Y REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, 13 AVENIDA 2-47 ZONA 2, TERCERA LOTIFICACION SANTA ELENA, FLORES, PETEN

[NOG 10140018](#)

REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO IXLU, FLORES, PETEN Y REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PROFESOR ANTONIO ENRIQUE JUAREZ OBANDO, SAN BENITO, PETEN

[NOG 10140026](#)

REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS TULIPANES, FLORES, PETEN

[NOG 10745955](#)

REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA MACANCHE, FLORES, PETEN

[NOG 10746145](#)


REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, 13 AVENIDA 2-47 ZONA 2, TERCERA LOTIFICACION SANTA ELENA, FLORES, PETEN Y REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO IXLU, FLORES, PETEN

[NOG 10746331](#)

REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PROFESOR ANTONIO ENRIQUE JUAREZ OBANDO, SAN BENITO, PETEN

RESUMEN DE PROYECTOS

11 remozamiento en Peten

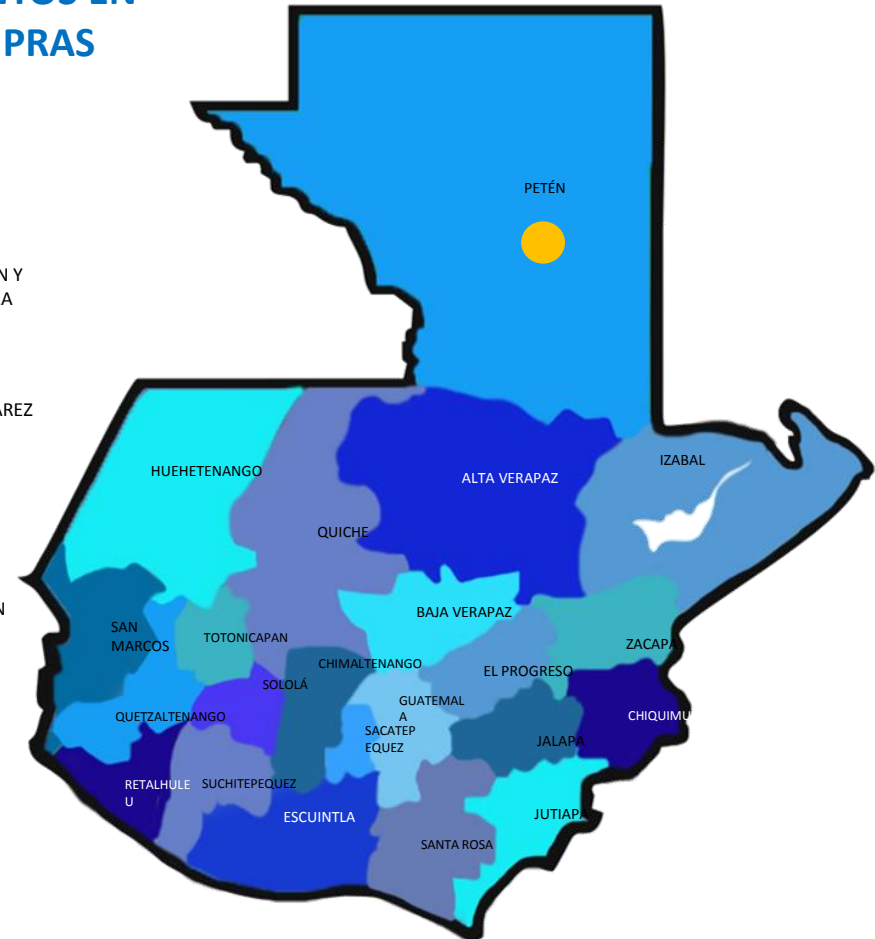

REMOZAMIENTOS EN GATECOMPRAS



EL PROGRESO

[NOG 10139966](#)

REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CAMALMAPA 1, SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ Y REMOZAMIENTO INSTITUTO NACIONAL EDUCACIÓN BÁSICA ERNESTO CHAVARRIA RIVADENEYRA, SANARATE, EL PROGRESO



SUCHITEPEQUEZ Y ESCUINTLA

[NOG 10139982](#)


REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL REPARO, NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA Y REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, LABOR PARRASQUIN, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ



RETALHULEU Y ESCUINTLA

[NOG 10139974](#)

REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA HUNAPU, ESCUINTLA, ESCUINTLA Y REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR EL ESPAÑOL, CHAMPERICO RETALHULEU

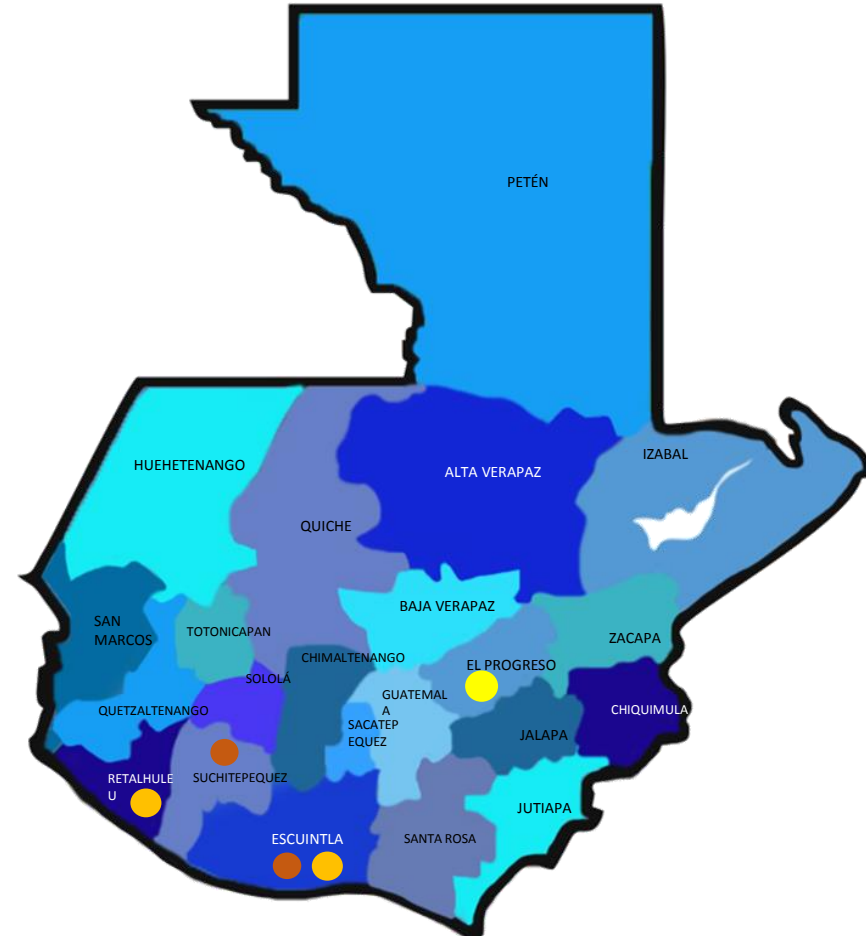

RESUMEN DE PROYECTOS

- 1 Remozamiento en Suchitepéquez
- 1 Remozamiento en Retalhuleu
- 1 Remozamiento en progreso
- 2 Remozamiento Escuintla





PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2019



INVERSIÓN

PROYECTOS DE EDUCACIÓN:

- DEPARTAMENTO QUICHE..... 1 PROYECTO
- DEPARTAMENTO SANTA ROSA..... 3 PROYECTO



PROYECTOS DE SALUD:


- • DEPARTAMENTO QUICHE..... 2 PROYECTO
- • DEPARTAMENTO SAN MARCOS..... 1 PROYECTO
- • DEPARTAMENTO ALTA VERAPAZ..... 2 PROYECTO
- • DEPARTAMENTO SOLOLA..... 1 PROYECTO
- • DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO..... 1 PROYECTO

TOTAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE INVERSIÓN

PROYECTOS DE EDUCACION: ➔ 04

PROYECTOS DE SALUD: ➔ 07

SIMBOLOGIA	DESCRIPCION
	PROYECTOS EDUCACION
	PROYECTOS SALUD

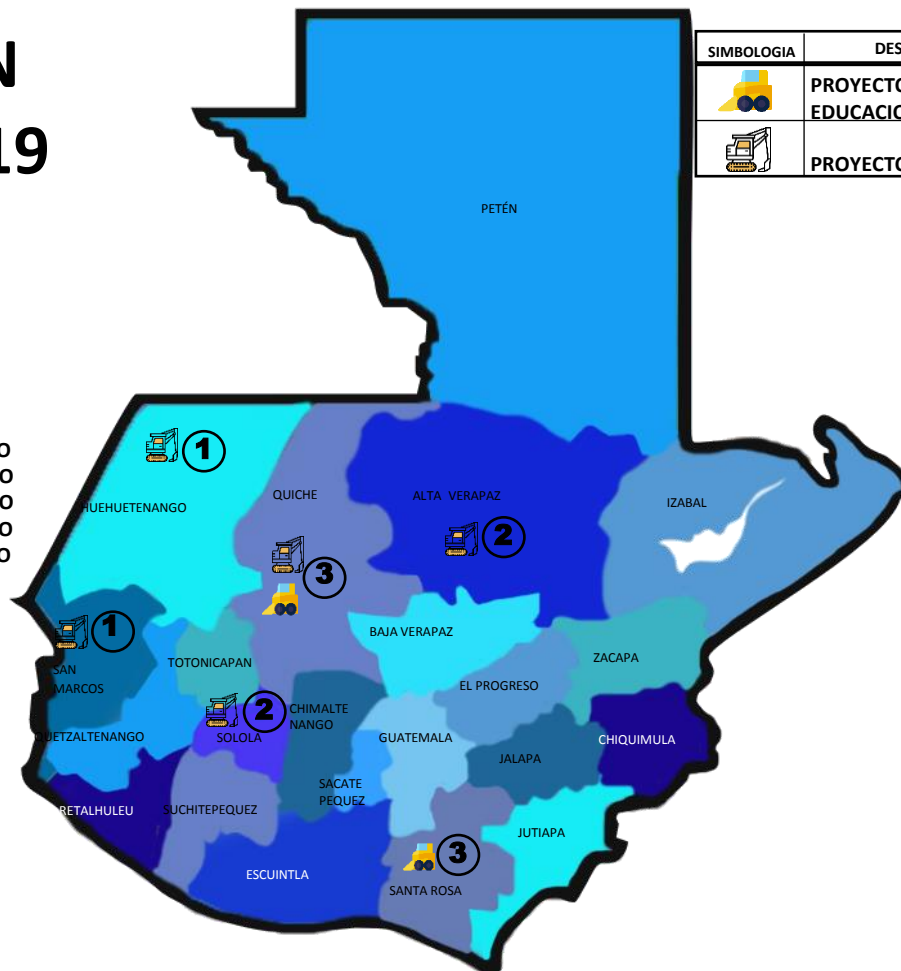

TOTAL DE PROYECTOS EN EJECUCION A NIVEL NACIONAL

PROYECTOS DE EDUCACION + SALUD: ➔ 12




PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN 2019 EDUCACIÓN



VER FICHA TECNICA

● SNIP 33423 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA
 OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL,
 SACAPULAS, QUICHE CONTRATO No. 83-2014-UCEE
 FECHA DE INICIO: 19-SEPTIEMBRE-2018
 FECHA FINALIZACION: 14-OCTUBRE-2019
 ESTADO FISICO 91.48%
 ESTADO FINANCIERO 83.96%
 MONTO CONTRATO MODIFICADO:
 Q.3,529,441.99
 CONTRATISTA: COCESA
 UBICACIO: SACAPULAS, QUICHE

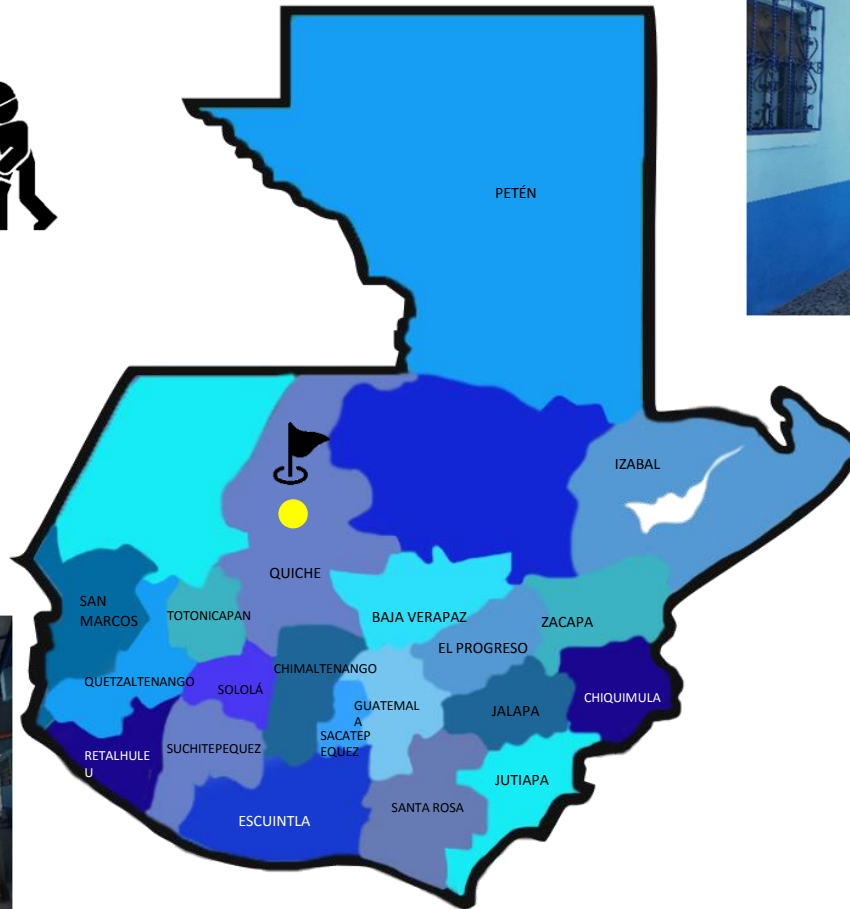




PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN 2019 EDUCACIÓN

VER FICHA TECNICA

- **SNIP 224376** REPOSICION ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LAS ASTAS, BARBERENA, SANTA ROSA
CONTRATO No. 159-2018-UCEE
ECHA DE INICIO: 07-ENERO-2019
FECHA FINALIZACION: 26-ENERO-2020
ESTADO FISICO 78.87 %
ESTADO FINANCIERO 42.44%
MONTO CONTRATO MODIFICADO:
Q.4,187,151.62
CONTRATISTA: EMPRESA X.W.
UBICACION: BARBERENA, SANTA ROSA

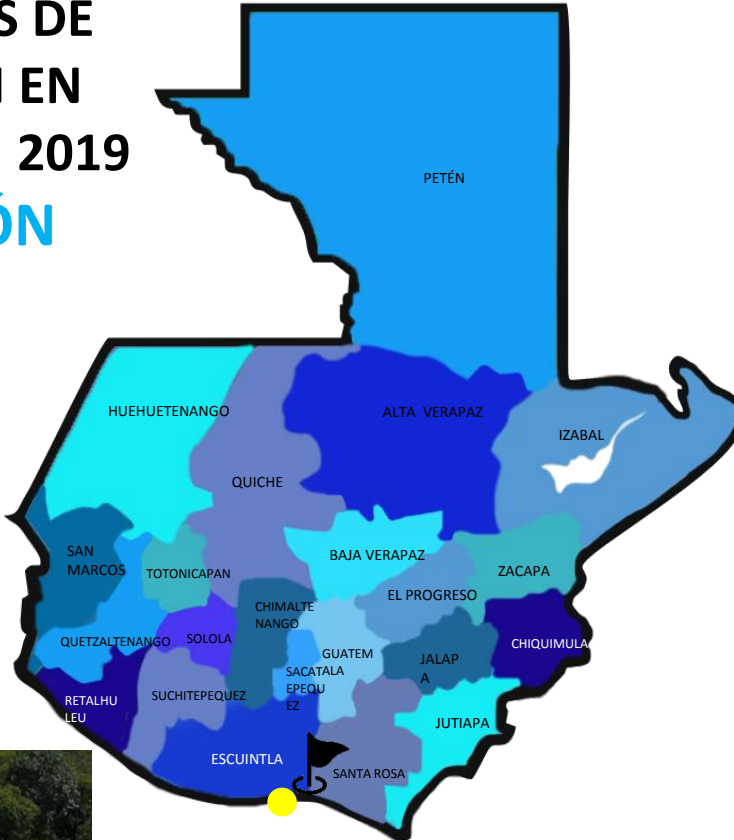

VER FICHA TECNICA

- **SNIP 224215** REPOSICION ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LLANO GRANDE, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA
CONTRATO No. 160-2019-UCEE
FECHA DE INICIO: 01-FEBRERO-2019
FECHA FINALIZACION: 25-MARZO-2019
ESTADO FISICO 51.86%
ESTADO FINANCIERO 38.43%
MONTO CONTRATO MODIFICADO: Q.4,121,369.97
CONTRATISTA: DIRYA
UBICACION: SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA



VER FICHA TECNICA

- **SNIP 155983** MEJORAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA
CONTRATO No. 161-2019-UCEE
FECHA DE INICIO: 01-FEBRERO-2019
FECHA FINALIZACION: 27-NOVIEMBRE-2019
ESTADO FISICO 58.21%
ESTADO FINANCIERO 31.52%
MONTO CONTRATO MODIFICADO: Q.4,967,812.38
CONTRATISTA: EL DESVIO
UBICACION: SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA






PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION 2019

SALUD

VER FICHA TECNICA

SNIP 209399 MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE
 ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN COTZAL,
 QUICHE CONTRATO No. 149-2018-UCEE

FECHA DE INICIO: 28-SEPTIEMBRE-2018
FECHA FINALIZACION: 28-OCTUBRE-2019
ESTADO FISICO: 53.80%
ESTADO FINANCIERO: 32.78%
MONTO CONTRATO MODIFICADO:
 Q.2,669,848.04
CONTRATISTA: COMERCIAL CRISOL
UBICACION: SAN JUAN COTZAL, QUICHE

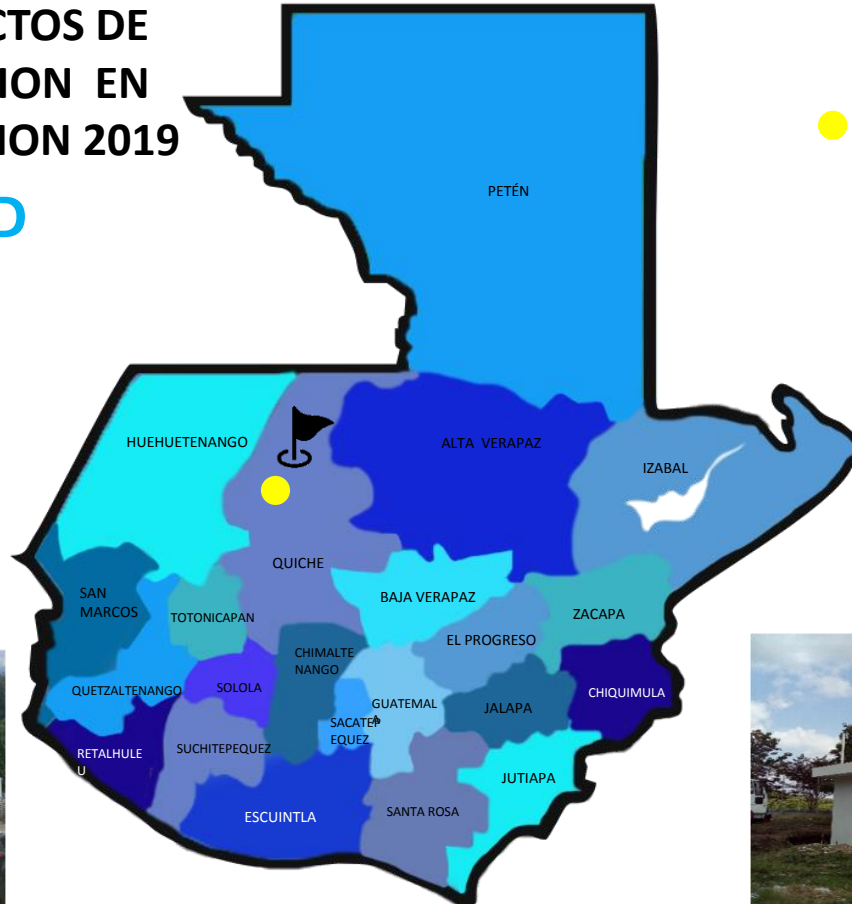

VER FICHA TECNICA

SNIP 209398 MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE
 SALUD ALDEA INGENIEROS, PLAYA GRANDE, IXCAN,
 QUICHE CONTRATO No. 150-2018-UCEE

FECHA DE INICIO: 28-SEPTIEMBRE-2018
FECHA FINALIZACION: 28-OCTUBRE-2019
ESTADO FISICO: 69.67%
ESTADO FINANCIERO: 44.22%
MONTO CONTRATO MODIFICADO:
 Q.3,811.317.70
CONTRATISTA: COMERCIAL CRISOL
UBICACION: IXCAN, QUICHE





PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN 2019

SALUD

VER FICHA TECNICA

- **SNIP209397** MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACANA, SAN MARCOS
- CONTRATO No. 147-2018-UCEE
- FECHA DE INICIO: 27-SEPTIEMBRE-2018
- FECHA FINALIZACION: 27-SEPTIEMBRE-2019
- ESTADO FISICO 95.51%
- ESTADO FINANCIERO 77.85%
- MONTO CONTRATO MODIFICADO: Q.2,504,954.63
- CONTRATISTA:
- CONSTRUCTORA BM MULTIPROYECTOS
- UBICACIO: TACANA, SAN MARCOS



ENTRE MODULOS



SALA DE ESPERA






PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN 2019

SALUD

VER FICHA TECNICA

SNIP 209400 MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SANTA CRUZ, ALTA VERAPAZ
 CONTRATO No. 148-2018-UCEE

FECHA DE INICIO: 27-SEPTIEMBRE-2018
FECHA FINALIZACION: 02-AGOSTO-2019
ESTADO 94.56%
ESTADO FINANCIERO 96.62%
MONTO CONTRATO MODIFICADO: Q,4,043,854.30
CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA BM MULTIPROYECTOS
UBICACION: SANTA CRUZ, ALTA VERAPAZ

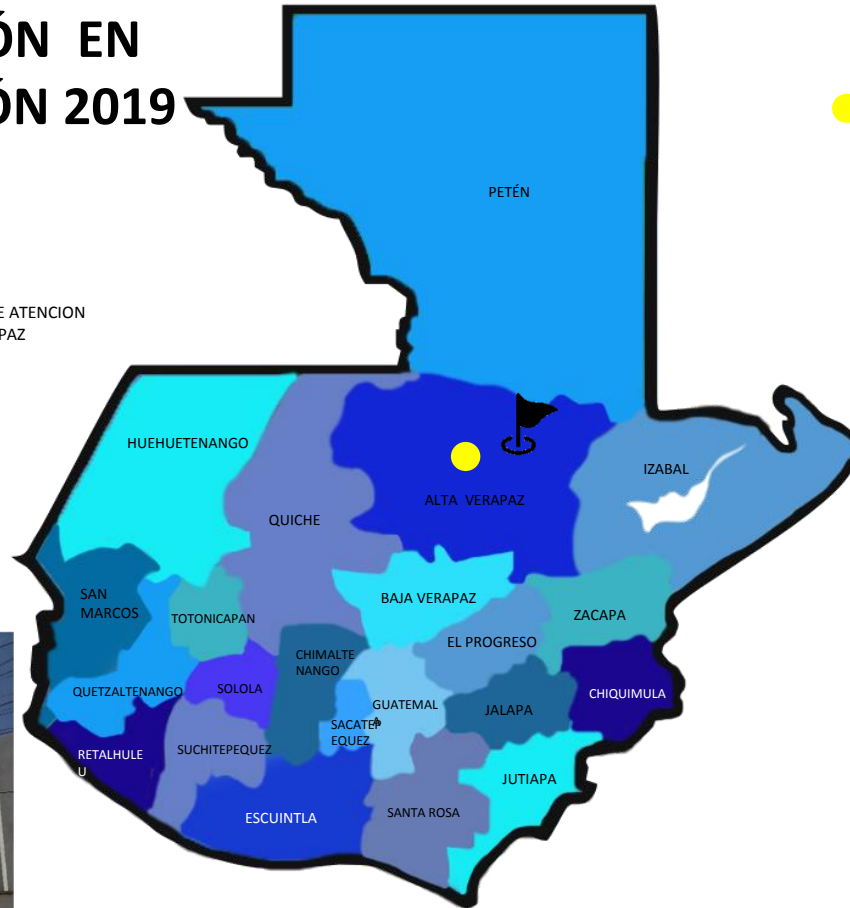

VER FICHA TECNICA

SNIP 223854 MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACTIC. ALTA VERAPAZ CONTRATO No. 98-2018-UCEE
FECHA DE INICIO: 30-JULIO-2019
FECHA FINALIZACION: 24-ENERO-2020
ESTADO FISICO 25.52%
ESTADO FINANCIERO 0%
MONTO CONTRATO MODIFICADO: Q,3,988,360.10
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA L & t
UBICACION: TACTIC, ALTA VERAPAZ





PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN 2019

SALUD


VER FICHA TECNICA

SNIP 206196 MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE SOLOLA, SOLOLA
 CONTRATO No. 151-2018-UCEE

FECHA DE INICIO: 19-OCTUBRE-2018
 FECHA FINALIZACION: 22-OCTUBRE-2019
 ESTADO FISICO 76.01%
 ESTADO FINANCIERO 61.40%
 MONTO CONTRATO MODIFICADO:
 Q.3,729,464.49
 CONTRATISTA:
 CONSULTORA Y CONSTRUCTORA DEL KYRIOS
 UBICACION: SOLOLA, SOLOLA



PASILLO ENTRE CLINICAS

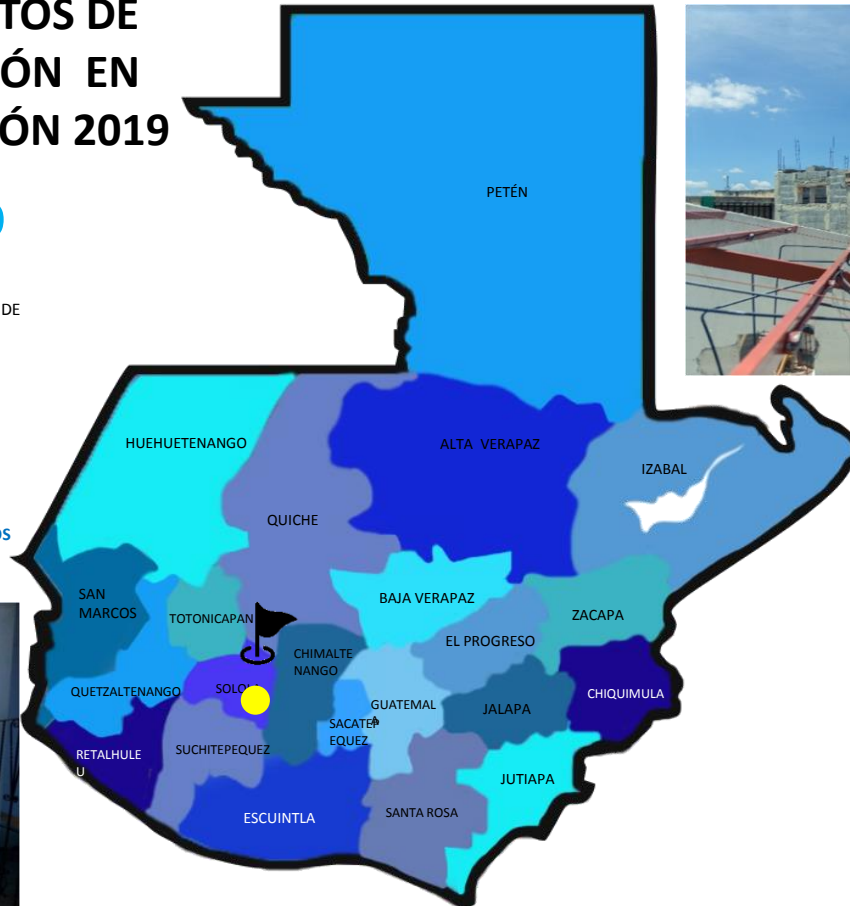



PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN 2019


SALUD

- **SNIP 223891** MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE (CAP) SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO
- CONTRATO No.108-2018-UCEE
- FECHA DE INICIO: 30-JULIO-2019
- FECHA FINALIZACION: 24-FEBRERO-2020
- ESTADO FISICO 36.86%
- ESTADO FINANCIERO 0 %
- MONTO CONTRATO MODIFICADO: Q.2,981,143.47
- CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA L & T
- UBICACIO: SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO



PROYECTOS DE FUNCIONAMIENTO EN EJECUCIÓN


REMOZAMIENTOS EN EJECUCIÓN 38	
• DEPARTAMENTO GUATEMALA	13 PROYECTOS
• DEPARTAMENTO SACATEPEQUEZ	1 PROYECTO
• DEPARTAMENTO ESCUINTLA	2 PROYECTOS
• DEPARTAMENTO RETALHULEU	1 PROYECTO
• DEPARTAMENTO PETÉN	6 PROYECTOS
• DEPARTAMENTO SANTA ROSA	4 PROYECTOS
• DEPARTAMENTO JUTIAPA	4 PROYECTOS
• DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO	2 PROYECTOS
• DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ	1 PROYECTO
• DEPARTAMENTO EL PROGRESO	1 PROYECTO
• DEPARTAMENTO SUCHITEPEQUEZ	1 PROYECTO
• DEPARTAMENTO QUETZALTENANGO	1 PROYECTO
• DEPARTAMENTO SAN MARCOS	1 PROYECTO
• Total	38 total

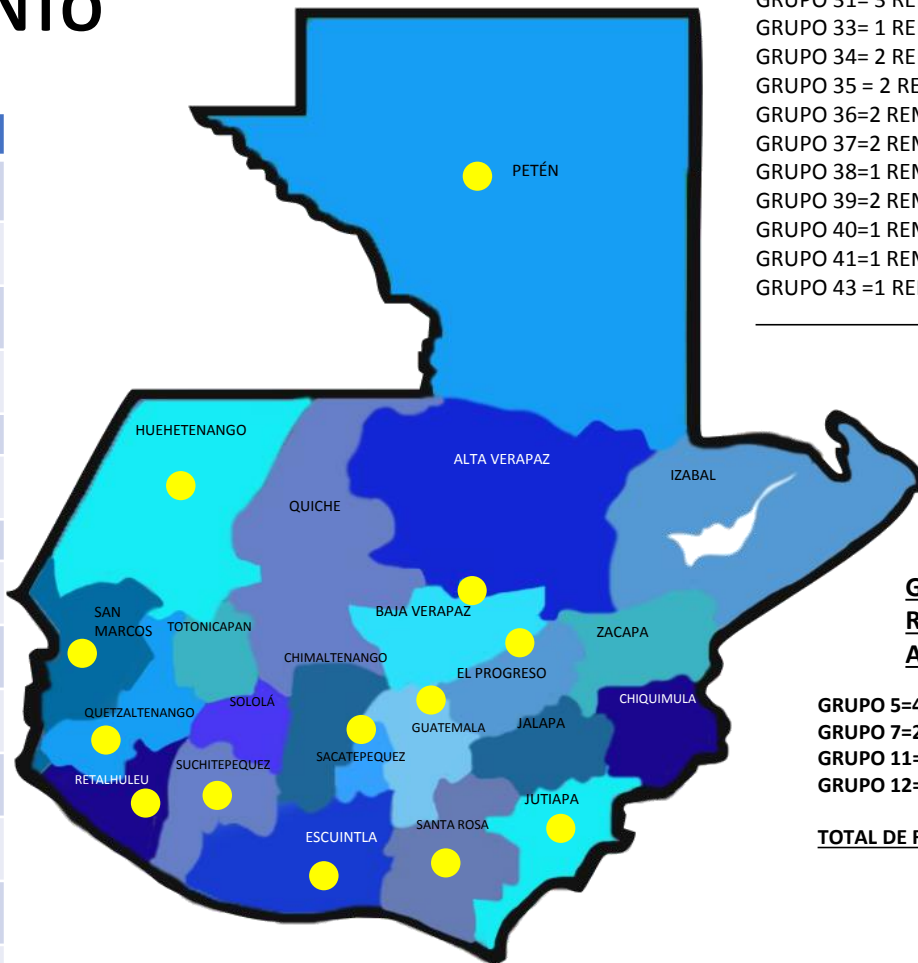

GRUPOS DE REMOZAMIENTO ADJUDICADOS

- GRUPO 27= 1 REMOZAMIENTOS = Q.790,990.00
- GRUPO 29 = 1 REMOZAMIENTOS = Q.475,000.00
- GRUPO 30= 1REMOZAMIENTOS = Q.744,699.00
- GRUPO 31= 3 REMOZAMIENTOS = Q.612,943.67
- GRUPO 33= 1 REMOZAMIENTOS = Q.571,662.97
- GRUPO 34= 2 REMOZAMIENTOS = Q.547.492,42
- GRUPO 35 = 2 REMOZAMIENTOS = Q.879,841,09
- GRUPO 36=2 REMOZAMIENTOS = Q.810.045,45
- GRUPO 37=2 REMOZAMIENTOS = Q.561.291,98
- GRUPO 38=1 REMOZAMIENTOS = Q.709014.49
- GRUPO 39=2 REMOZAMIENTOS = Q.422,814,89
- GRUPO 40=1 REMOZAMIENTOS =
- GRUPO 41=1 REMOZAMIENTOS =
- GRUPO 43 =1 REMOZAMIENTOS =

TOTAL DE REMOZAMIENTOS 26

NOMENCLATURA	
	Indica Departamento con remozamiento

GRUPOS DE REMOZAMIENTO CON ACUERDO MINISTERIAL

- GRUPO 5=4 REMOZAMIENTOS = Q.715,307.13
- GRUPO 7=2 REMOZAMIENTOS = Q.878,386.34
- GRUPO 11=1 REMOZAMIENTO = Q.282,072.94
- GRUPO 12=2 REMOZAMIENTOS = Q.0721,051.6

TOTAL DE REMOZAMIENTOS 9





PROYECTOS DE FUNCIONAMIENTO EN EJECUCIÓN 2019 EDUCACIÓN

VER FICHA TECNICA

REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 71
 FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, GUATEMALA, GUTEMALA
 CONTRATO No. 157-2018-UCEE

FECHA DE INICIO: 28-SEPTIEMBRE-2018

FECHA FINALIZACION: 18-FEBRERO-2019

ESTADO FISICO 100 %

ESTADO FINANCIERO 97.81 %

MONTO CONTRATO MODIFICADO: Q.1,371,026.05

CONTRATISTA:

SERVICIOS GENERALES INDUSTRIALES, S.A. –SEGEISA-

UBICACION:

CALZADA SAN JUAN ZONA 7 COL. EL RODEO,
 GUATEMALA

REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS No. 40,
 JESUS CASTRO GOMEZ, GUATEMALA, GUATEMALA
 CONTRATISTA: NRIQUE PONS MOLINA CONSULTORIA Y
 CONSTRUCTORA DEL KYRIOS



VISTA EXTERIOR






PROYECTOS DE FUNCIONAMIENTO EN EJECUCIÓN 2019 EDUCACIÓN



GRUPO No. 5 CONTRATO No. 117-2019-UCEE
MONTO DE CONTRATO: Q.715,307.13

1. REMOZAMIENTO INSTITUTO NACIONAL MIXTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA SAN PASCUAL III, GUATEMALA
2. REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VALLE DE NAZARETH, VILLA NUEVA
3. REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, COLONIA ENRIQUETA, VILLA NUEVA
4. REMOZAMIENTO EODP ANEXA A ESCUELA VILLALOBOS NORTE "ARMANDO VELAZQUES F., VILLA NUEVA

FECHA DE ADJUDICACION 5-AGOSTO-2019
 ESTADO FISICO 59.80 %
 ESTADO FINANCIERO 0.00 %
 CONTRATISTA: KENNY STEVEN ALFARO ESTRADA
 UBICACIO: GUATEMALA, GUATEMALA

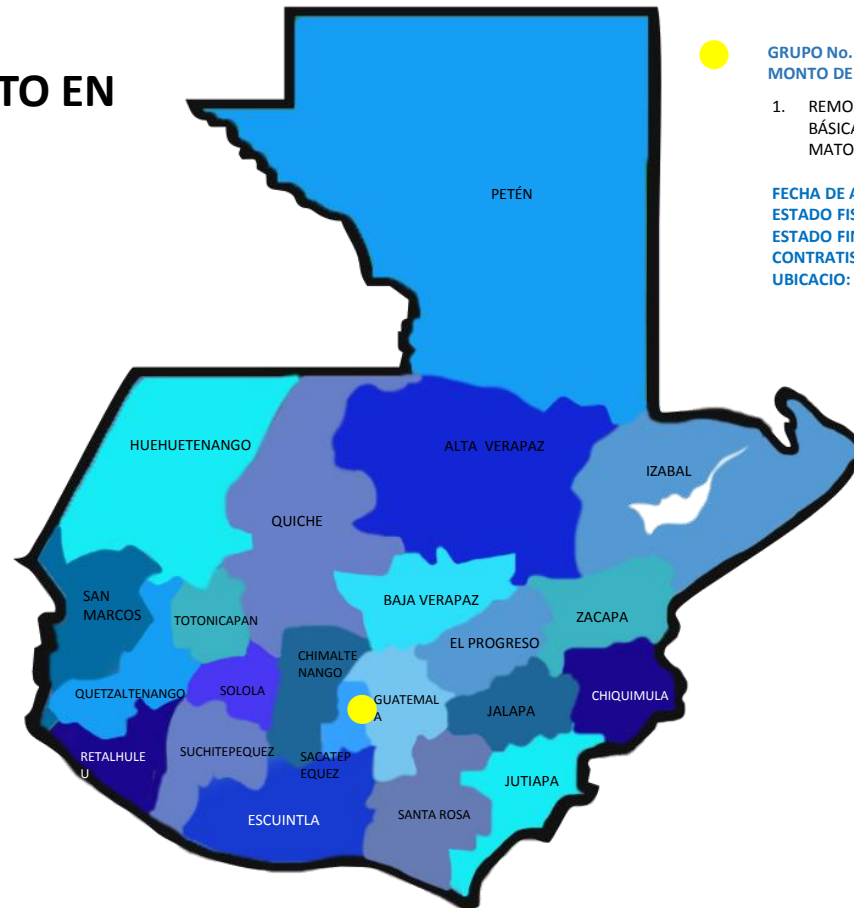

GRUPO No. 30 CONTRATO: ADJUDICADO
MONTO DE CONTRATO: Q.744,699.00

1. REMOZAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXP. CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DR. JOSE MATOS PACHECO, GUATEMALA, GUATEMALA

FECHA DE ADJUDICACION
 ESTADO FISICO 0.00 %
 ESTADO FINANCIERO 0.00 %
 CONTRATISTA: ENRIQUE PONSA MOLINA
 UBICACIO: GUATEMALA, GUATEMALA





PROYECTOS DE FUNCIONAMIENTO EN EJECUCIÓN 2019 EDUCACIÓN

GRUPO No. 31 CONTRATO: ADJUDICADO
MONTO DE CONTRATO: Q.612,943.67

1. REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES NO. 25 JOSE MARIA VELA IRRISARI, GUATEMALA, GUATEMALA

FECHA DE ADJUDICACION 5-AGOSTO-2019

ESTADO FISICO 79.76 %

ESTADO FINANCIERO 0.00 %

CONTRATISTA: IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA
UBICACIO: GUATEMALA, GUATEMALA

GRUPO No. 34 CONTRATO: ADJUDICADO
MONTO DE CONTRATO: Q.547,492.42


1. REMOZAMIENTO ESCUELA DE NIÑOS NO. 3 CAYETANO FRANCO Y MONROY, GUATEMALA, GUATEMALA
2. REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE APLICACIÓN NO. 16 REPÚBLICA DE BOLIVIA, GUATEMALA, GUATEMALA

FECHA DE ADJUDICACION

ESTADO FISICO 40.00 %

ESTADO FINANCIERO 0.00 %

CONTRATISTA: MARCOS VINICIO ROMERO CHOJOLAN
UBICACIO: GUATEMALA, GUATEMALA

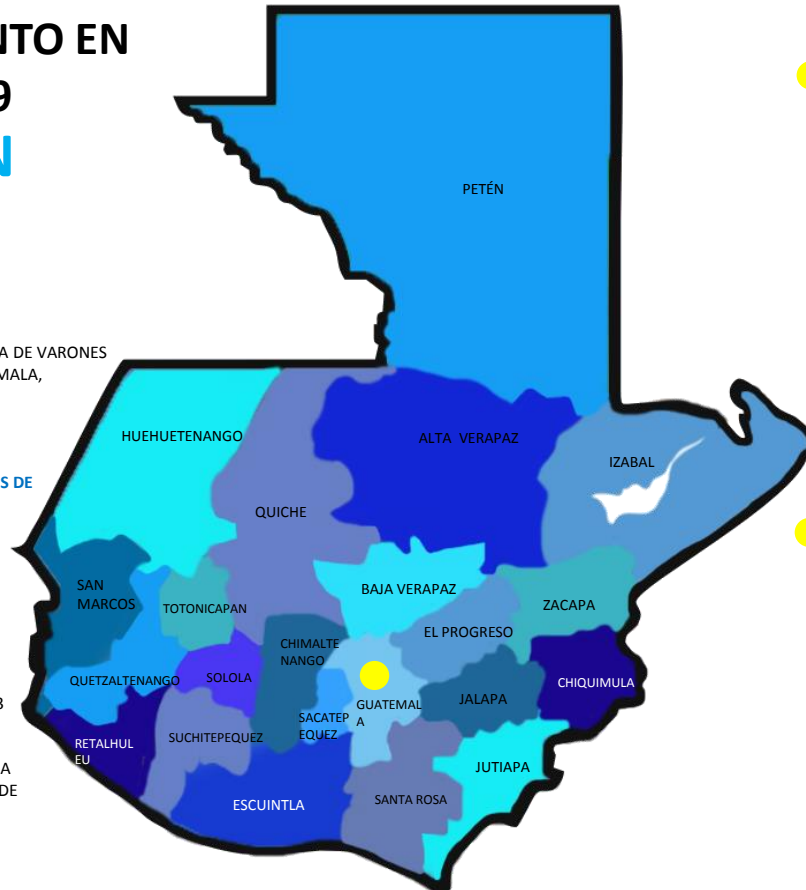

GRUPO No. 35 CONTRATO: ADJUDICADO
MONTO DE CONTRATO: Q.879,841.09

1. REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO 149 4 DE FEBRERO, GUATEMALA, GUATEMALA
2. REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS NO. 3 DOLORES BEDOYA DE MOLINA, GUATEMALA, GUATEMALA

FECHA DE ADJUDICACION

ESTADO FISICO 40.00 %

ESTADO FINANCIERO 0.00 %

CONTRATISTA: MARCOS VINICIO ROMERO CHOJOLAN
UBICACIO: GUATEMALA, GUATEMALA

GRUPO No. 41 CONTRATO: ADJUDICADO
MONTO DE CONTRATO: Q. 687,856.64

1. REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS NO.49 JESUS CASTRO GOMEZ, GUATEMALA, GUATEMALA

FECHA DE ADJUDICACION

ESTADO FISICO 0.00 %

ESTADO FINANCIERO 0.00 %

CONTRATISTA: ENRIQUE PONSA MOLINA
UBICACIO: GUATEMALA, GUATEMALA






PROYECTOS DE FUNCIONAMIENTO EN EJECUCIÓN 2019

EDUCACIÓN

VER FICHA TECNICA


 REMOZAMIENTO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES
 ANTONIO LARRAZABAL, ANTIGUA GUATEMALA,
 SACATEPEQUEZ CONTRATO No. 158-2018-UCEE

FECHA DE INICIO: 05-OCTUBRE-2018
 FECHA FINALIZACION: 09-AGOSTO-2019
 ESTADO FISICO 90.86%
 ESTADO FINANCIERO 83.79%
 MONTO CONTRATO MODIFICADO:
 Q.1,968,892.26
 CONTRATISTA:
 CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA DEL KYRIOS
 UBICACION:
 ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ

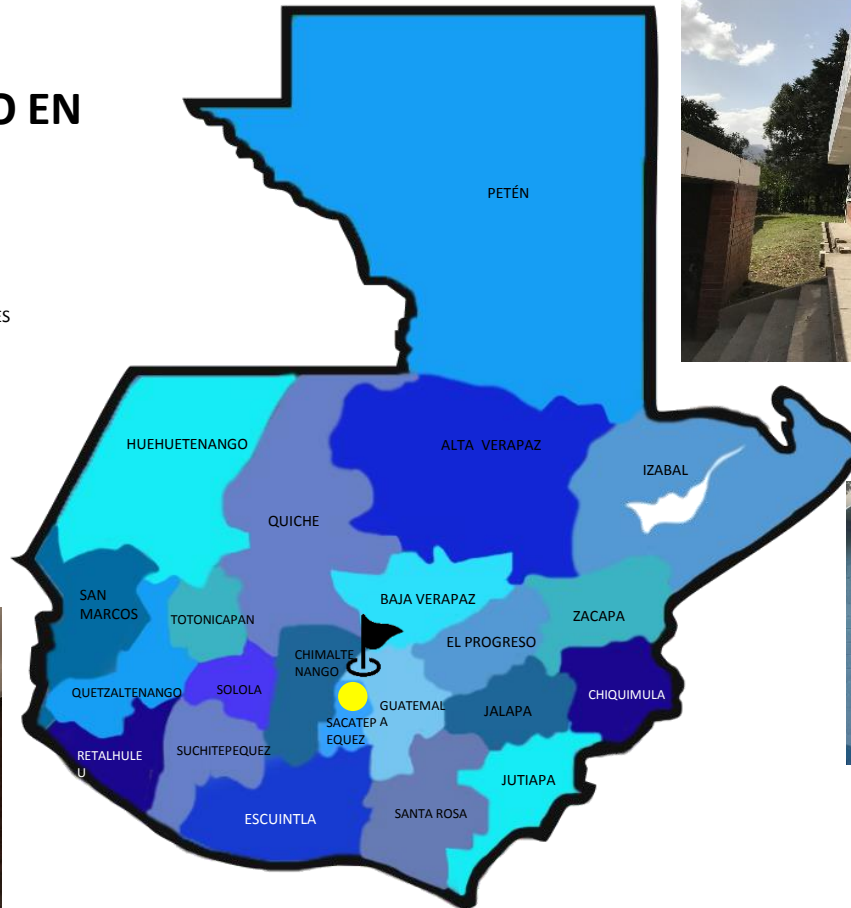

VISTA EXTERIOR



MODULO ANEXO






PROYECTOS DE FUNCIONAMIENTO EN ADJUDICADO 2019 EDUCACIÓN



GRUPO No. 7 CONTRATO: 115-2019-UCEE
MONTO DE CONTRATO: Q.878,386.34

1. REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA
COLONIA HUNAPU, ESCUINTLA, ESCUINTLA

FECHA DE ADJUDICACION 5-AGOSTO-2019
ESTADO FISICO 66.05 %
ESTADO FINANCIERO 0.00 %
CONTRATISTA: SHAYDA PRISCILA RAMIREZ DIAZ
UBICACIO: ESCUINTLA, ESCUINTLA

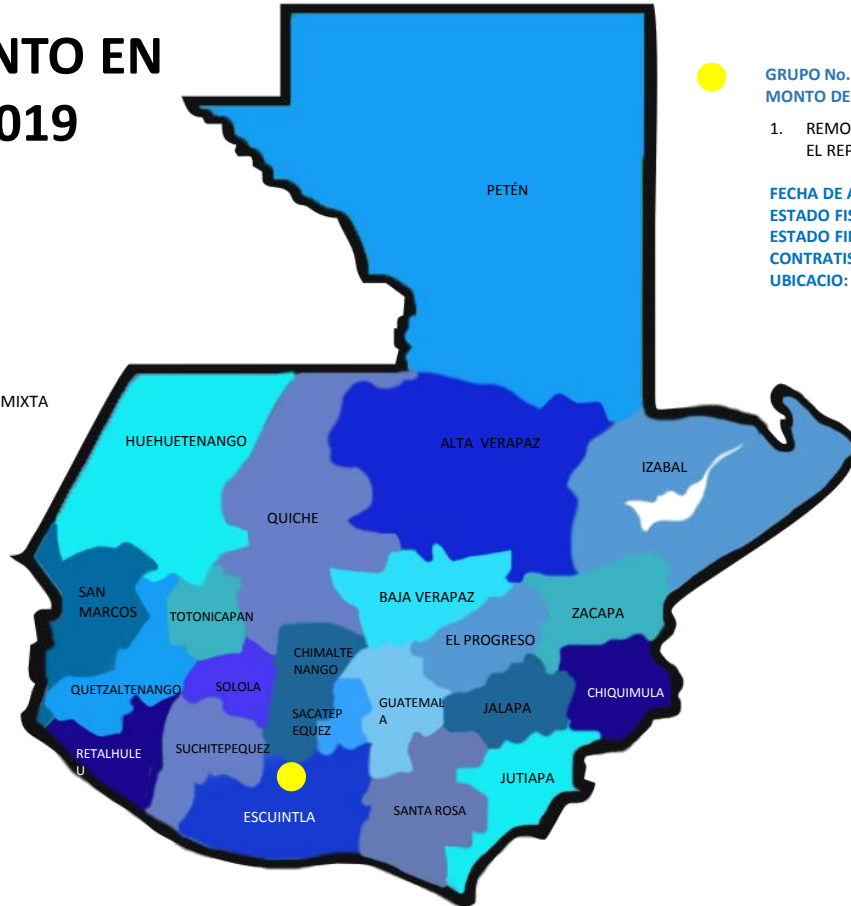

GRUPO No. 36 CONTRATO: ADJUDICADO
MONTO DE CONTRATO: Q. 810,045.45

1. REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA
EL REPARO, NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA

FECHA DE ADJUDICACION 5-AGOSTO-2019
ESTADO FISICO 79.56 %
ESTADO FINANCIERO 0.00 %
CONTRATISTA: MARCOS VINICIO ROMERO CHOJOLAN
UBICACIO: NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA





PROYECTOS DE FUNCIONAMIENTO EN ADJUDICADO 2019 EDUCACIÓN



GRUPO No. 42 CONTRATO: 145-2019-UCEE
MONTO DE CONTRATO: Q.878,386.34

1. REMOZAMIIENTO CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL
PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL AL INÑO Y A LA NIÑA
ALDEA EL NARAJO SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN
MARCOS


CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAJAVERAPACENSE





PROYECTOS DE FUNCIONAMIENTO EN ADJUDICADO 2019

EDUCACIÓN

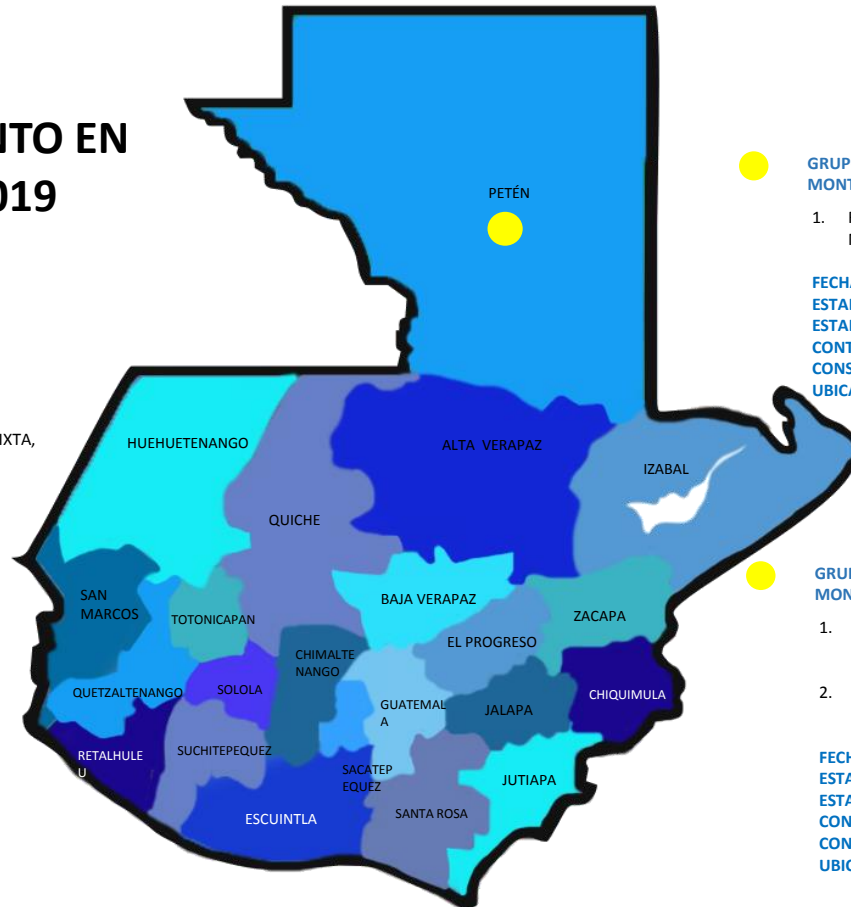

GRUPO No. 11 CONTRATO: 122-2019-UCEE
MONTO DE CONTRATO: Q.282,072.94

1. REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS TULIPANES, FLORES, PETEN

FECHA DE ADJUDICACION 5-AGOSTO-2019
ESTADO FISICO 15.89 %
ESTADO FINANCIERO 0.00 %
CONTRATISTA: SHAYDA PRISCILA RAMIREZ DIAZ
UBICACION: FLORES, PETEN

GRUPO No. 12 CONTRATO: 123-2019-UCEE
MONTO DE CONTRATO: Q.721,051.60

1. REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO EL PORVENIR, SAN BENITO, PETEN
2. REMOZAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, CASERIO LAS VIÑAS, FLORES, PETEN

FECHA DE ADJUDICACION 5-AGOSTO-2019
ESTADO FISICO 51.28 %
ESTADO FINANCIERO 0.00 %
CONTRATISTA: IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA
UBICACION: SAN BENITO Y FLORES, PETEN

GRUPO No. 38 CONTRATO: ADJUDICADO
MONTO DE CONTRATO: Q. 709,014.49

1. REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA MACANCHE, FLORES, PETEN

FECHA DE ADJUDICACION
ESTADO FISICO 40.00 %
ESTADO FINANCIERO 0.00 %
CONTRATISTA: IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA
UBICACION: FLORES, PETEN

GRUPO No. 39 CONTRATO: ADJUDICADO
MONTO DE CONTRATO: Q. 422,814.89


1. REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, 13 AVENIDA 2-47 ZONA 2, TERCERA LOTIFICACION SANTA ELENA, FLORES, PETEN
2. REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO IXLU, FLORES, PETEN

FECHA DE ADJUDICACION
ESTADO FISICO 40.00 %
ESTADO FINANCIERO 0.00 %
CONTRATISTA: IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA
UBICACION: FLORES, PETEN





PROYECTOS DE FUNCIONAMIENTO EN ADJUDICADO 2019 EDUCACIÓN

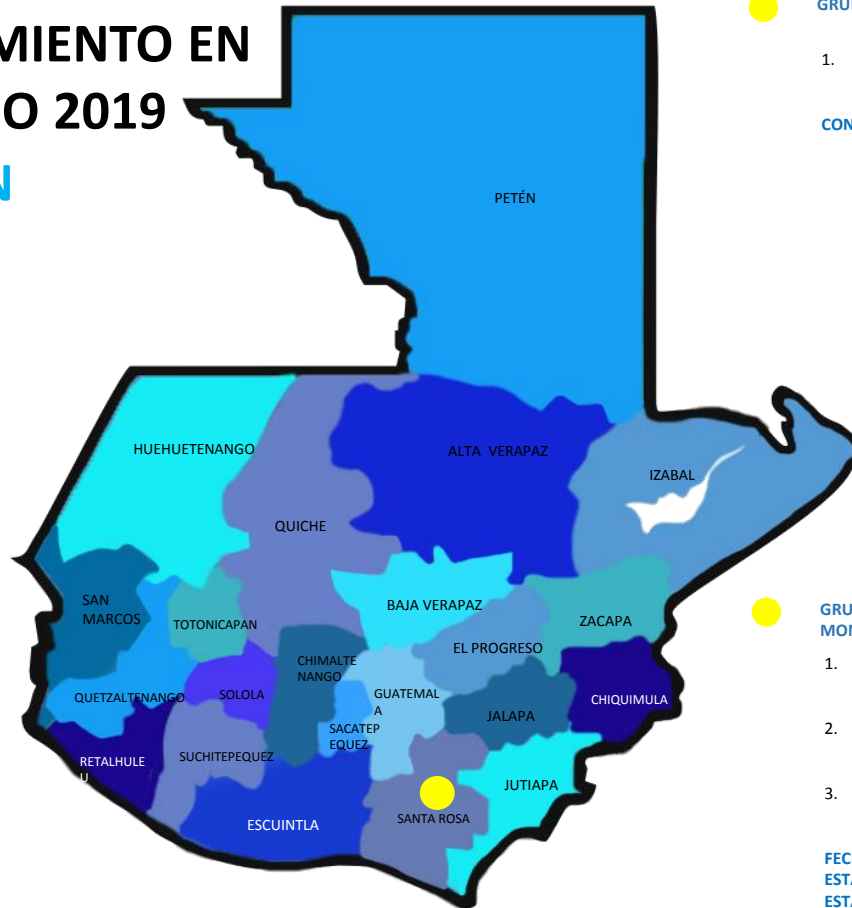

GRUPO No. GRUPO 43 146-2019-UCEE: ADJUDICADO

1. REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, GREGORIO GAITAN DUARTE, ALDEA EL JUNQUILLO, BARBERENA SANTA ROSA.
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA BAJAVERAPACENSE

**GRUPO No. 13 CONTRATO: ADJUDICADO
MONTO DE CONTRATO: Q. 280,441.98**

1. REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM, ALDEA SAN JOSÉ EL RINCONCITO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA
2. REMOZAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, ANEXA A EORM PEDRO ISAAC CRESPO, GUASACAPAN, SANTA ROSA
3. REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CERRO GORDO, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA

FECHA DE ADJUDICACION
ESTADO FISICO 33.74 %
ESTADO FINANCIERO 0.00 %
CONTRATISTA: JENNIFER EDYT RAMÍREZ DÍAZ
UBICACION:
SANTA ROSA DE LIMA Y GUASACAPAN, SANTA ROSA





PROYECTOS DE FUNCIONAMIENTO EN ADJUDICADO 2019

EDUCACIÓN



GRUPO No. 17 CONTRATO: ADJUDICADO
MONTO DE CONTRATO: Q. 733,444.97

1. REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA
 BARRIO LATINO, JUTIAPA, JUTIAPA


FECHA DE ADJUDICACION
ESTADO FISICO 43.87 %
ESTADO FINANCIERO 0.00 %
CONTRATISTA: IMPORTADORA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA
UBICACIO: JUTIAPA, JUTIAPA



GRUPO No. 22 CONTRATO: ADJUDICADO
MONTO DE CONTRATO: Q. 525,019.02

1. REMOZAMIENTO ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN
 FISICA 8ª CALLE ZONA 1, BARRIO LATINO, JUTIAPA,
 JUTIAPA

FECHA DE ADJUDICACION
ESTADO FISICO 42.68 %
ESTADO FINANCIERO 0.00 %
CONTRATISTA: IMPORTADORA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA
UBICACIO: JUTIAPA, JUTIAPA

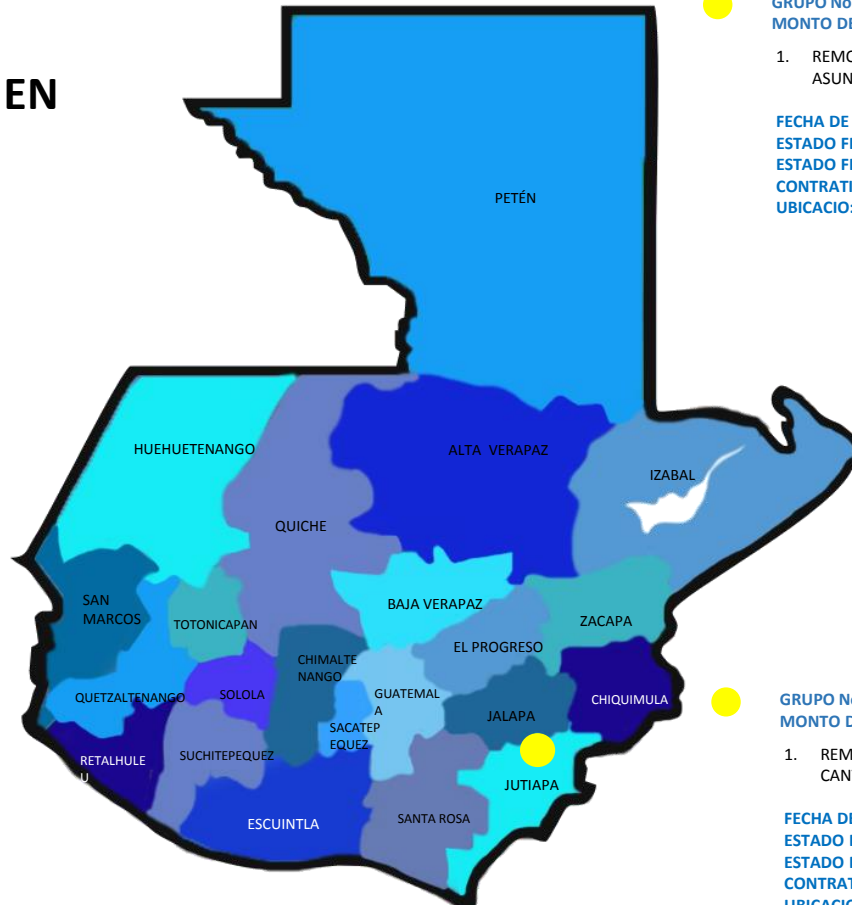

GRUPO No. 27 CONTRATO: ADJUDICADO
MONTO DE CONTRATO: Q. 790,990.00

1. REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA
 ASUNCIÓN GRANDE, ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA

FECHA DE ADJUDICACION
ESTADO FISICO 60.00 %
ESTADO FINANCIERO 0.00 %
CONTRATISTA: ALBA LUZ DUQUE GIRÓN
UBICACIO: ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA



GRUPO No. 29 CONTRATO: ADJUDICADO
MONTO DE CONTRATO: Q. 475,000.00

1. REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
 CANTÓN VALENCIA, JUTIAPA, JUTIAPA

FECHA DE ADJUDICACION
ESTADO FISICO 40.00 %
ESTADO FINANCIERO 0.00 %
CONTRATISTA: ALBA LUZ DUQUE GIRÓN
UBICACIO: JUTIAPA, JUTIAPA





PROYECTOS DE FUNCIONAMIENTO EN ADJUDICADO 2019

EDUCACIÓN



● GRUPO No. 33 CONTRATO: ADJUDICADO
MONTO DE CONTRATO: Q. 571,662.97

1. REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN LORENZO, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO

FECHA DE ADJUDICACION
ESTADO FISICO 79.76 %
ESTADO FINANCIERO 0.00 %
CONTRATISTA: IMPORTADORA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA
UBICACIO: HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO

● GRUPO No. 31 CONTRATO: ADJUDICADO
MONTO DE CONTRATO: Q. 612,943.67

1. REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PIOL, SAN SEBASTIÁN, HUEHUETENANGO

FECHA DE ADJUDICACION
ESTADO FISICO 79.76 %
ESTADO FINANCIERO 0.00 %
CONTRATISTA: IMPORTADORA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA
UBICACIO: SAN SEBASTIÁN, HUEHUETENANGO





PROYECTOS DE FUNCIONAMIENTO EN ADJUDICADO 2019

EDUCACIÓN



GRUPO No. 31 CONTRATO: ADJUDICADO
MONTO DE CONTRATO: Q. 612,943.67

1. REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA,
CASERÍO CAMALMAPA 1, SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA
VERAPAZ


FECHA DE ADJUDICACION
ESTADO FISICO 79.76 %
ESTADO FINANCIERO 0.00 %
CONTRATISTA: IMPORTADORA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA
UBICACION: SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ





PROYECTOS DE FUNCIONAMIENTO EN ADJUDICADO 2019

EDUCACIÓN

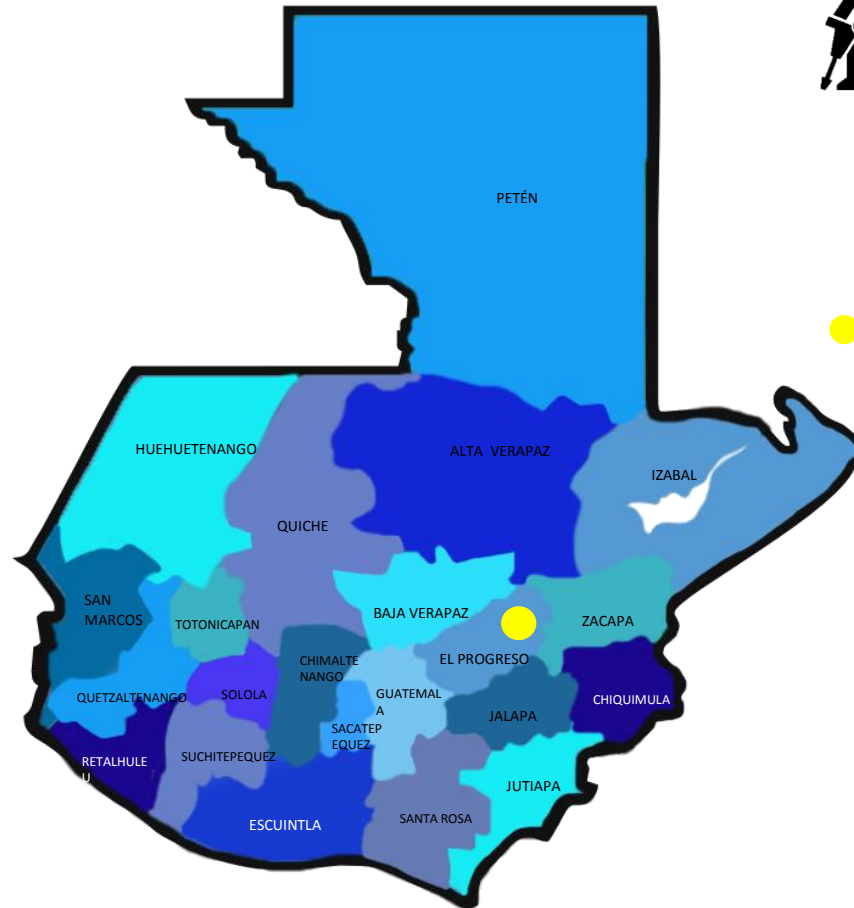

GRUPO No. 36 CONTRATO: ADJUDICADO
MONTO DE CONTRATO: Q. 810,045.45

1. REMOZAMIENTO INSTITUTO NACIONAL EDUCACIÓN BÁSICA "ERNESTO CHAVARRIA RIVADENEYRA", SANARATE, EL PROGRESO

FECHA DE ADJUDICACION
ESTADO FISICO 79.56 %
ESTADO FINANCIERO 0.00 %
CONTRATISTA: MARCOS VINICIO ROMERO CHOJOLAN
UBICACION: SANARATE, EL PROGRESO





PROYECTOS DE FUNCIONAMIENTO EN ADJUDICADO 2019


EDUCACIÓN

● GRUPO No. 37 CONTRATO: ADJUDICADO
MONTO DE CONTRATO: Q. 561,291.98

1. REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA,
LABOR PARRASQUIN, SAN JOSE EL IDOLO,
SUCHITEPEQUEZ

FECHA DE ADJUDICACION
ESTADO FISICO 79.18 %
ESTADO FINANCIERO 0.00 %
CONTRATISTA: MARCOS VINICIO ROMERO CHOJOLAN
UBICACION: SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ



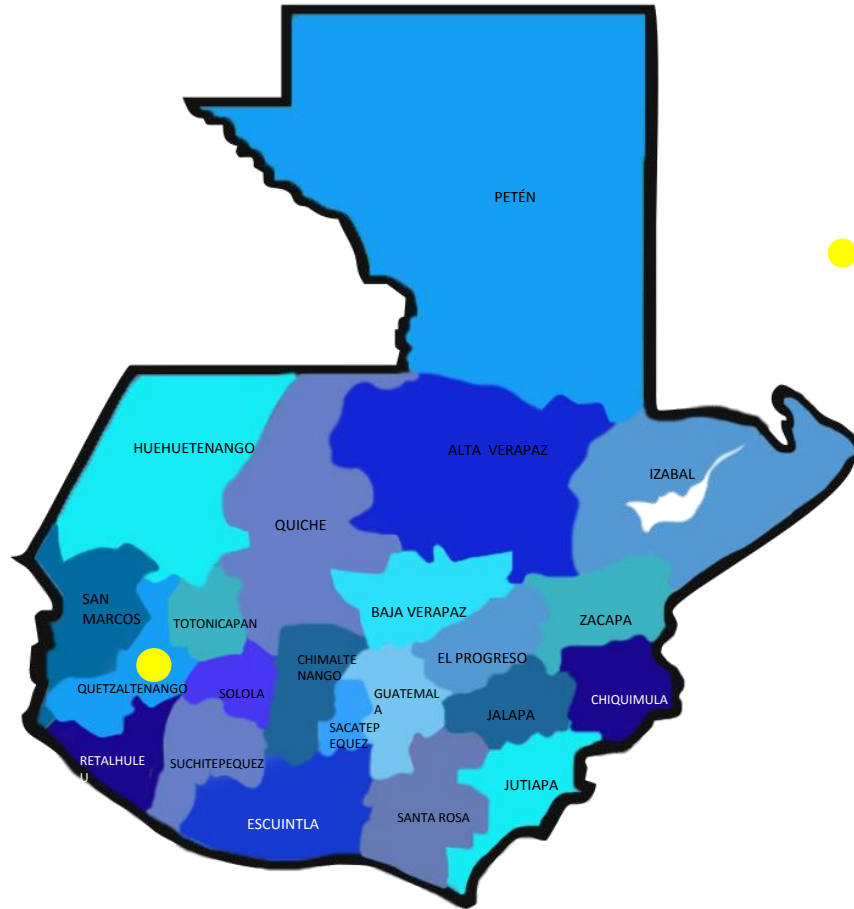

PROYECTOS DE FUNCIONAMIENTO EN ADJUDICADO 2019 EDUCACIÓN




GRUPO No. 37 CONTRATO: ADJUDICADO
MONTO DE CONTRATO: Q. 561,291.98

1. REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA ESPERANZA, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO

FECHA DE ADJUDICACION
ESTADO FISICO 79.18 %
ESTADO FINANCIERO 0.00 %
CONTRATISTA: MARCOS VINICIO ROMERO CHOJOLAN
UBICACION: COATEPEQUE, QUETZALTENANGO



PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ARRASTRE

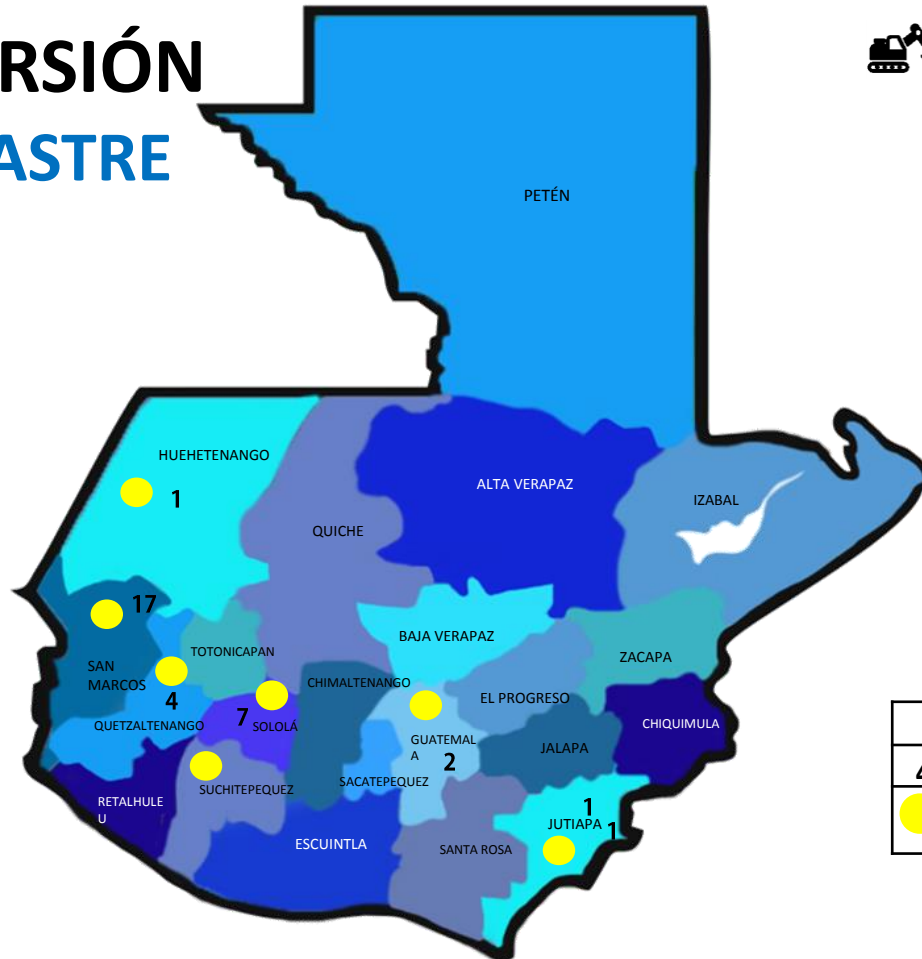

PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ARRASTRE

- DEPARTAMENTO GUATEMALA 2 PROYECTO
- DEPARTAMENTO JUTIAPA 1 PROYECTO
- DEPARTAMENTO SAN MARCOS.....17 PROYECTO
- DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ..... 7 PROYECTO
- DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO..... 1 PROYECTO
- DEPARTAMENTO QUETZALTENANGO..... 4 PROYECTO
- DEPARTAMENTO SUCHITEPEQUEZ..... 1 PROYECTO


TOTAL DE PROYECTOS DE ARRASTRE

PROYECTOS DE ARRASTRE: **33**

NOMENCLATURA	
4	Indica cantidad de proyectos
●	Indica Departamento con pre inversión



PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ARRASTRE

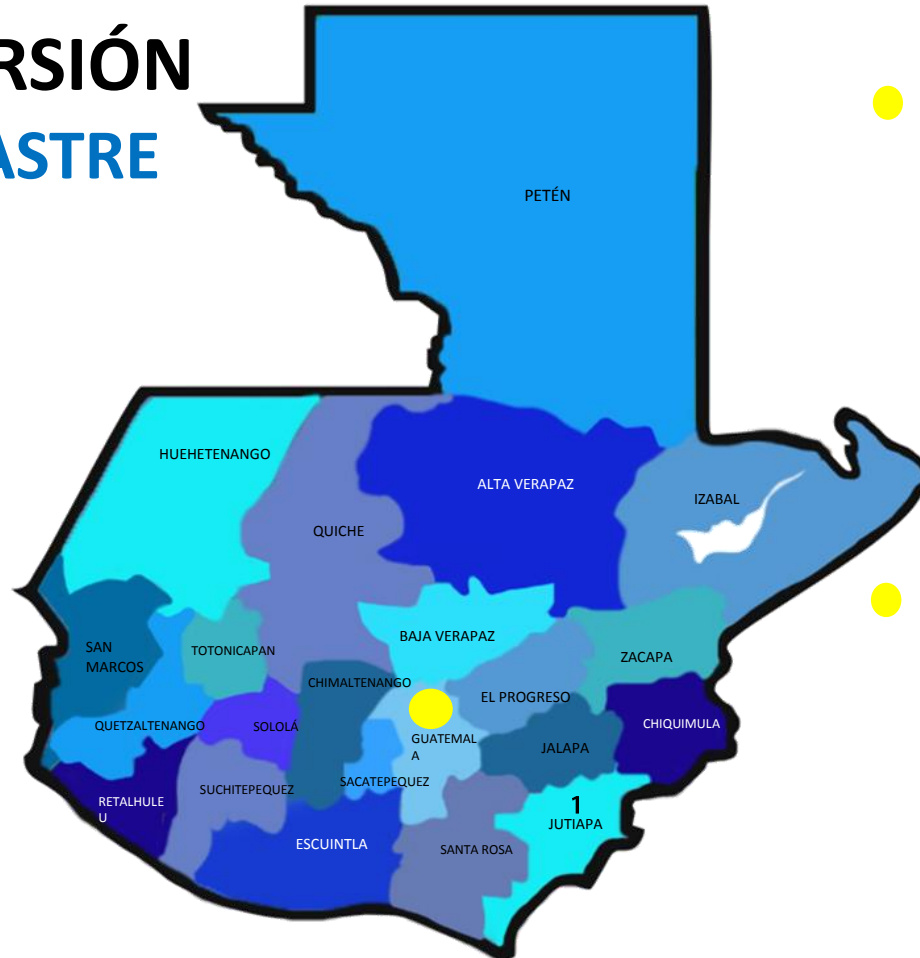


● **SNIP 31359** (REMOZAMIENTO INSTITUTO NACIONAL MIXTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA SAN PASCUAL III, GUATEMALA, GUATEMALA,)
FECHA DE ADJUDICACION AÑO 2012
ESTADO FISICO 100%%
ESTADO FINANCIERO 98.00%
MONTO DEL CONTRATO: Q4,121,558.62
MONTO PAGADO: Q4,030,060.25
MONTO DE SALDO: Q91,498.37
UBICACIÓN: GUATEMALA, GUATEMALA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA CONGUSA
ESTADO: FINALIZADO Y PENDIENTE DE RECEPCIÓN

● **SNIP 113758** (AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA. NOG. 3252914)
FECHA DE ADJUDICACION AÑO 2014
ESTADO FISICO 100%%
ESTADO FINANCIERO 100 %
MONTO DEL CONTRATO: Q7,286,516.59
MONTO PAGADO: Q7,280,125.10
MONTO DE SALDO: Q6,391.49
UBICACIÓN: VILLA CANALES, GUATEMALA
CONTRATISTA: BM MULTIPROYECTOS
ESTADO: FINALIZADO Y PENDIENTE DE RECEPCIÓN




PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ARRASTRE

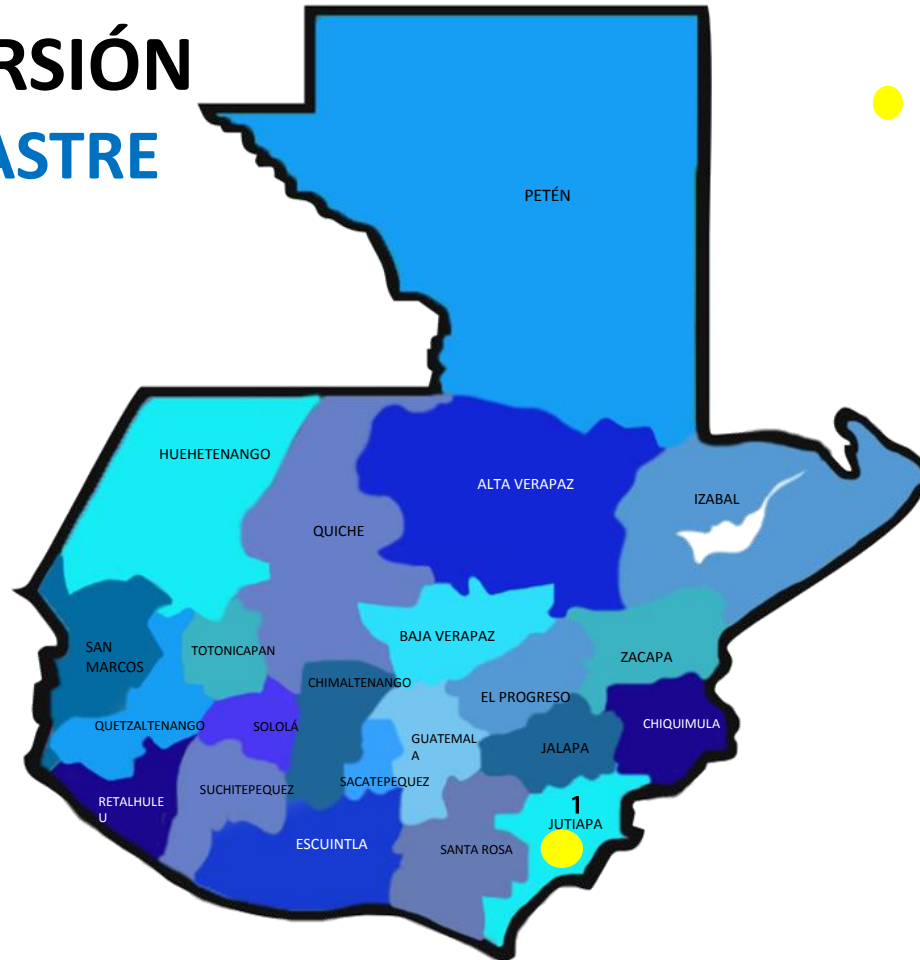


- **SNIP 7325 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA NOG. 3246906**
- **FECHA DE ADJUDICACION AÑO 2014**
- **ESTADO FISICO 100%**
- **ESTADO FINANCIERO 99.00%**
- **MONTO DEL CONTRATO: Q2,196,396.62**
- **MONTO PAGADO: Q2,181,944.78**
- **MONTO DE SALDO: Q14,451.84**
- **UBICACIÓN: CONGUACO JUTIAPA**
- **CONTRATISTA: BM MULTIPROYECTOS**
- **ESTADO: FINALIZADA Y PENDIENTE DE RECEPCIÓN**





PROYECTOS DE INVERSIÓN, DE ARRASTRE


 **SNIP 133898** AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. NOG. 3301907
FECHA DE ADJUDICACION AÑO 2014
ESTADO FISICO 100.00%
ESTADO FINANCIERO 93.00%
MONTO DEL CONTRATO: Q3,330,519.90
MONTO PAGADO: Q3,105,056.48
MONTO DE SALDO: Q225,463.42
UBICACIÓN: SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS
CONTRATISTA: PROYECTOS DE CONSTRUCCION GRUPO MAC
ESTADO: FINALIZADA Y PENDIENTE DE RECEPCIÓN


 **SNIP 131314** REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0092-43

FECHA DE ADJUDICACION AÑO 2018
ESTADO FISICO 8.00%
ESTADO FINANCIERO 0.0%
MONTO DEL CONTRATO: Q903,514.62
MONTO PAGADO: Q.0.00
MONTO DE SALDO: Q903,514.62
UBICACIÓN: SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS
CONTRATISTA: F.A.C.
ESTADO: PENDIENTE DE RESOLUCIÓN DE SESIÓN DE DERECHOS

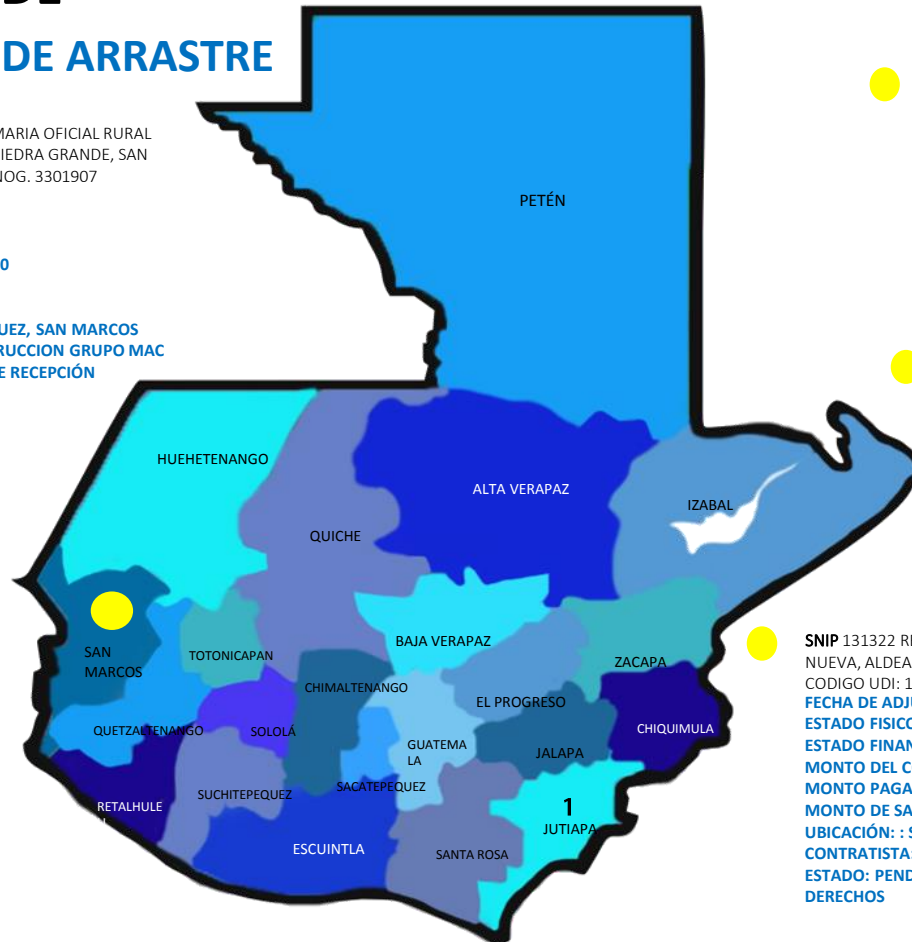

 **SNIP 131315** REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0085-43
FECHA DE ADJUDICACION AÑO 2018
ESTADO FISICO 7.00%
ESTADO FINANCIERO 0.0%
MONTO DEL CONTRATO: Q995,059.40
MONTO PAGADO: Q.0.00
MONTO DE SALDO: Q995,059.40
UBICACIÓN: : SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS
CONTRATISTA: F.A.C.
ESTADO: PENDIENTE DE RESOLUCIÓN DE SESIÓN DE DERECHOS

 **SNIP 131316** REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0077-43
FECHA DE ADJUDICACION AÑO 2018
ESTADO FISICO 3.00%
ESTADO FINANCIERO 0.0%
MONTO DEL CONTRATO: Q2,392,405.84
MONTO PAGADO: Q.0.00
MONTO DE SALDO: 2,392,405.84
UBICACIÓN: : SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS
CONTRATISTA: F.A.C.
ESTADO: PENDIENTE DE RESOLUCIÓN DE SESIÓN DE DERECHOS

 **SNIP 131322** REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON VILLA NUEVA, ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0037-43
FECHA DE ADJUDICACION AÑO 2018
ESTADO FISICO 11.00%
ESTADO FINANCIERO 0.0%
MONTO DEL CONTRATO: Q683,823.68
MONTO PAGADO: Q.0.00
MONTO DE SALDO: Q683,823.68
UBICACIÓN: : SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS
CONTRATISTA: F.A.C.
ESTADO: PENDIENTE DE RESOLUCIÓN DE SESIÓN DE DERECHOS



PROYECTOS DE INVERSIÓN, DE ARRASTRE

SNIP 131332 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0128-42


FECHA DE ADJUDICACION: AÑO 2014
ESTADO FISICO 6.00%
ESTADO FINANCIERO 0.00%
MONTO DEL CONTRATO: Q1,290,978.13
MONTO PAGADO: Q.0.00
MONTO DE SALDO: Q1,290,978.13
UBICACIÓN: SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS
CONTRATISTA: F.A.C.
ESTADO: PENDIENTE DE RESOLUCIÓN DE SESIÓN DE DERECHOS

SNIP 131297 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BELLA VISTA, ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0027-43

FECHA DE ADJUDICACION: AÑO 2014
ESTADO FISICO 0.00%
ESTADO FINANCIERO 0.00%
MONTO DEL CONTRATO: Q1,014,585.16
MONTO PAGADO: Q0.00
MONTO DE SALDO: Q1,014,585.16
UBICACIÓN: SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS
CONTRATISTA:F.A.C.
ESTADO: Expediente se encuentra en el MINCIV, cesión de derechos del contrato.

SNIP 131303 REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA SAN ANDRES CHAPIL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-1208-42

FECHA DE ADJUDICACION: AÑO 2014
ESTADO FISICO 0.00%
ESTADO FINANCIERO 0.0%
MONTO DEL CONTRATO: Q711,073.13
MONTO PAGADO: Q.0.00
MONTO DE SALDO: Q711,073.13
UBICACIÓN: SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS
CONTRATISTA: F.A.C.
ESTADO: Expediente se encuentra en el MINCIV, cesión de derechos del contrato.

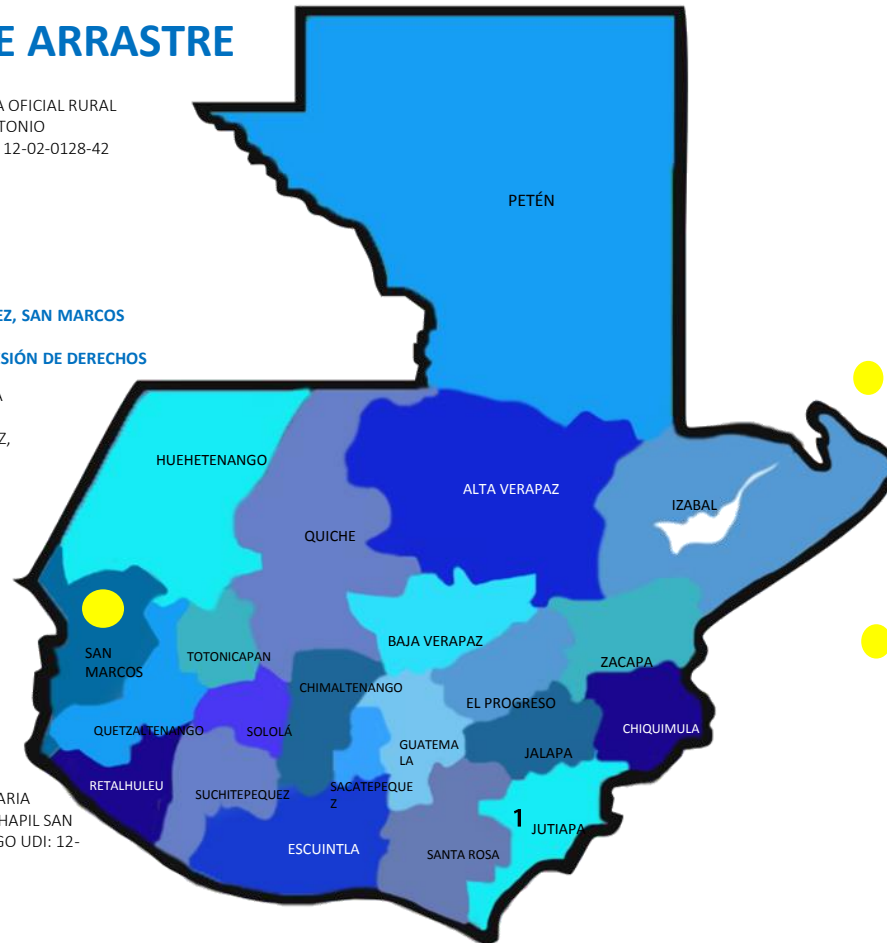

SNIP 131311 REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.

FECHA DE ADJUDICACION: AÑO 2014
ESTADO FISICO 0.00%
ESTADO FINANCIERO 0.0%
MONTO DEL CONTRATO: Q201,751.74
MONTO PAGADO: Q.0.00
MONTO DE SALDO: Q201,751.74
UBICACIÓN: SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS
CONTRATISTA: F.A.C.
ESTADO: Expediente se encuentra en el MINCIV, cesión de derechos del contrato.

SNIP 131320 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON PALENCIA, ALDEA SACUCHUM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0024-43

FECHA DE ADJUDICACION: AÑO 2014
ESTADO FISICO 0.00%
ESTADO FINANCIERO 0.0%
MONTO DEL CONTRATO: Q529,356.46
MONTO PAGADO: Q.0.00
MONTO DE SALDO: Q529,356.46
UBICACIÓN: : SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS
CONTRATISTA: F.A.C.
ESTADO: Expediente se encuentra en el MINCIV, cesión de derechos del contrato.

SNIP 131325 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN FRANCISCO EL TABLERO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-02-0076-43

FECHA DE ADJUDICACION: AÑO 2014
ESTADO FISICO 0.00%
ESTADO FINANCIERO 0.0%
MONTO DEL CONTRATO: Q164,808.46
MONTO PAGADO: Q.0.00
MONTO DE SALDO: Q164,808.46
UBICACIÓN: : SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS
CONTRATISTA: F.A.C.
ESTADO: Expediente se encuentra en el MINCIV, cesión de derechos del contrato.



PROYECTOS DE INVERSIÓN, DE ARRASTRE

SNIP 135234 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO BOJON, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-20-0834-43


FECHA DE ADJUDICACION AÑO 2014
ESTADO FISICO 100.00%
ESTADO FINANCIERO 99.00%
MONTO DEL CONTRATO: Q1,069,394.54
MONTO PAGADO: Q1,061,035.94
MONTO DE SALDO: Q8,358.60
UBICACIÓN: EL QUETZAL, SAN MARCOS
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ROZA
ESTADO: FINALIZADA Y PENDIENTE DE RECEPCIÓN

SNIP 131684 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA TANIL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-27-0008-43

FECHA DE ADJUDICACION AÑO 2014
ESTADO FISICO 92.59 %
ESTADO FINANCIERO 89.00%
MONTO DEL CONTRATO: Q283,821.40
MONTO PAGADO: Q253,539.40
MONTO DE SALDO: Q30,282.00
UBICACIÓN: ESQUIPULAS ,PALO GORDO, SAN MARCOS
CONTRATISTA: SEPROVAL
ESTADO: Proyectos Suspensión temporal de la ejecución por medio de Resolución 0.1-001A-2019/amv

SNIP 131686 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA TANIL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-27-0008-43

FECHA DE ADJUDICACION AÑO 2014
ESTADO FISICO 91.96 %
ESTADO FINANCIERO 90.00%
MONTO DEL CONTRATO: Q410,265.15
MONTO PAGADO: Q368,895.00
MONTO DE SALDO: Q.41,370.15
UBICACIÓN: ESQUIPULAS ,PALO GORDO, SAN MARCOS
CONTRATISTA: SEPROVAL
ESTADO: Proyectos Suspensión temporal de la ejecución por medio de Resolución 0.1-001A-2019/amv

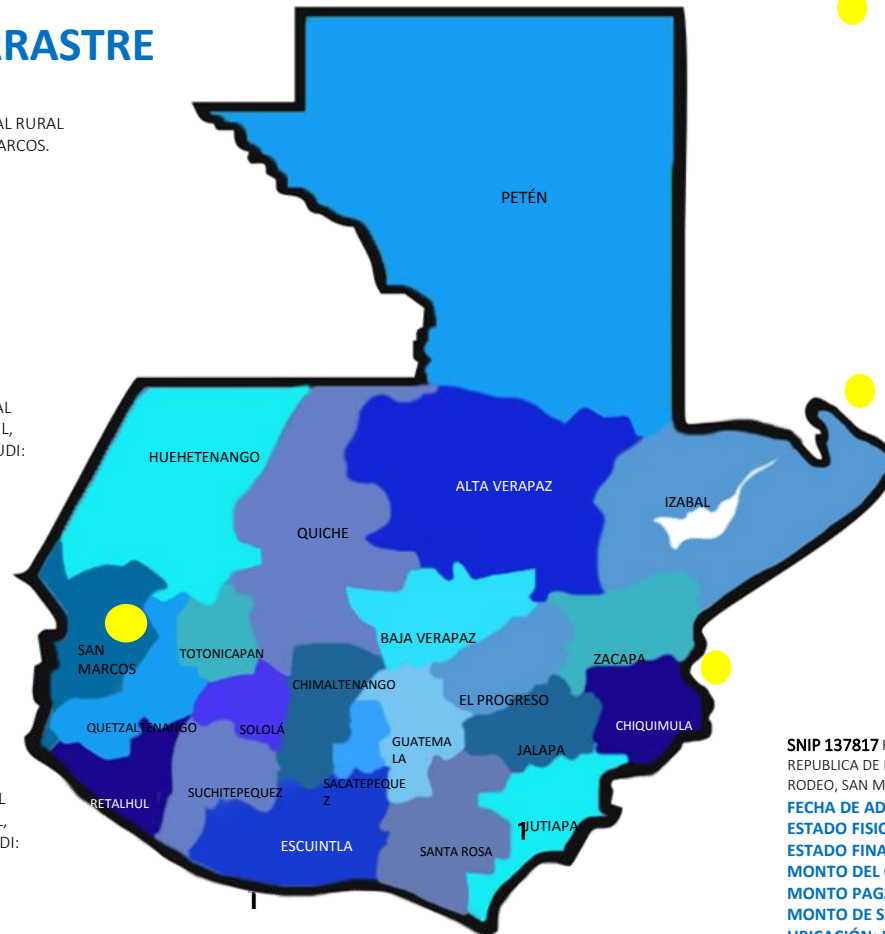

SNIP 131699 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CARRIZAL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS CODIGO UDI: 12-27-1002-43

FECHA DE ADJUDICACION AÑO 2014
ESTADO FISICO 17.93%
ESTADO FINANCIERO 58%
MONTO DEL CONTRATO: Q725,335.90
MONTO PAGADO: Q422,395.00
MONTO DE SALDO: Q302,940.90
UBICACIÓN: ESQUIPULAS ,PALO GORDO, SAN MARCOS
CONTRATISTA: SEPROVAL
ESTADO: Proyectos Suspensión temporal de la ejecución por medio de Resolución 0.1-001A-2019/amv

SNIP 131701 REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-27-1117-42

FECHA DE ADJUDICACION AÑO 2014
ESTADO FISICO 98.31%
ESTADO FINANCIERO 82.00%
MONTO DEL CONTRATO: Q396,799.00
MONTO PAGADO: Q.327,087.04
MONTO DE SALDO: Q69,711.96
UBICACIÓN: ESQUIPULAS ,PALO GORDO, SAN MARCOS
CONTRATISTA: SEPROVAL
ESTADO: Proyectos Suspensión temporal de la ejecución por medio de Resolución 0.1-001A-2019/amv

SNIP 137817 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE, ALDEA SAN FRANCISCO, EL RODEO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-14-0637-43

FECHA DE ADJUDICACION AÑO 2014
ESTADO FISICO 3.50 %
ESTADO FINANCIERO 29 %
MONTO DEL CONTRATO: Q396,662.70
MONTO PAGADO: Q.113,294.00
MONTO DE SALDO: Q283,368.70
UBICACIÓN: EL RODEO, SAN MARCOS
CONTRATISTA: SEPROVAL
ESTADO: Proyectos Suspensión temporal de la ejecución por medio de Resolución 0.1-001A-2019/amv




PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ARRASTRE

SNIP 1132818 REPOSICION INSTITUTO DIVERSIFICADO NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, 13 CALLE Y 5A AVENIDA ESQUINA, ZONA 1, SOLOLA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-01-0499-46

FECHA DE ADJUDICACION AÑO 2014
 ESTADO FISICO 75.99 %
 ESTADO FINANCIERO 98.00%
 MONTO DEL CONTRATO: Q1,078,387.99
 MONTO PAGADO: Q1,568,250.41
 MONTO DE SALDO: Q29,082.06
 UBICACIÓN: SOLOLÁ, SOLOLA
 CONTRATISTA: TRANSPORTE HENRY MORALES
 ESTADO: SE ENCUENTRA EN FASE DE CONSILIACION CON LA CONTRATISTA

SNIP 133673 POSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1 CANTÓN XIPRIÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLÁ. CODIGO UDI: 07-07-0243-43

FECHA DE ADJUDICACION AÑO 2014
 ESTADO FISICO: 73.80 %
 ESTADO FINANCIERO 58.00%
 MONTO DEL CONTRATO: Q1,078,387.99
 MONTO PAGADO: Q626,667.58
 MONTO DE SALDO: Q451,720.41
 UBICACIÓN: SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA
 CONTRATISTA: TRANSPORTE HENRY MORALES
 ESTADO: SE ENCUENTRA EN FASE DE CONSILIACION CON LA CONTRATISTA

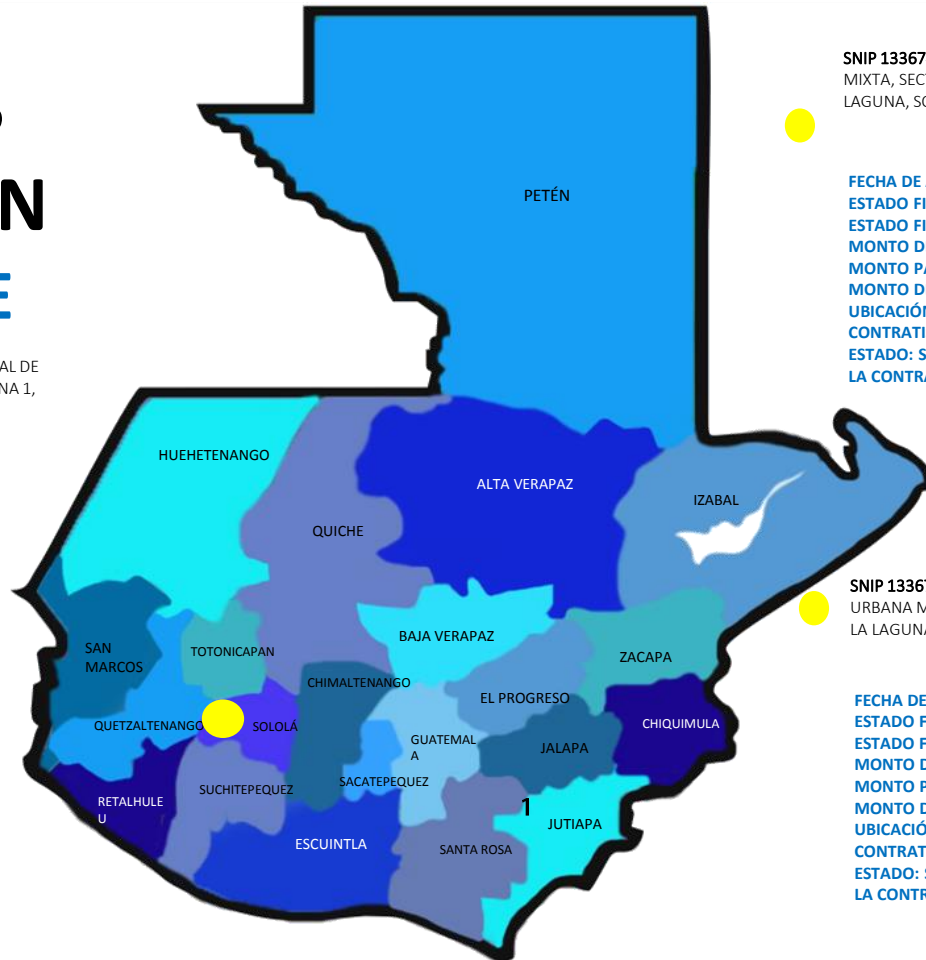

SNIP 133674 POSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR PABEYA Y CHICHYAL, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-07-0008-43


FECHA DE ADJUDICACION AÑO 2014
 ESTADO FISICO 95.83%
 ESTADO FINANCIERO 75.00%
 MONTO DEL CONTRATO: Q556,510.28
 MONTO PAGADO: Q416,189.78
 MONTO DE SALDO: Q140,320.50
 UBICACIÓN: SANTA CLARA LAGUNA, SOLOLA
 CONTRATISTA: TRANSPORTE HENRY MORALES
 ESTADO: SE ENCUENTRA EN FASE DE CONSILIACION CON LA CONTRATISTA

SNIP 133678 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 1, 1A. AV. 1-77 ZONA 1, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-07-0242-43


FECHA DE ADJUDICACION AÑO 2014
 ESTADO FISICO 95.02 %
 ESTADO FINANCIERO 89.00%
 MONTO DEL CONTRATO: Q178,227.61
 MONTO PAGADO: Q158,452.61
 MONTO DE SALDO: Q19,775.00
 UBICACIÓN: SANTA CLARA LAGUNA, SOLOLA
 CONTRATISTA: TRANSPORTE HENRY MORALES
 ESTADO: SE ENCUENTRA EN FASE DE CONSILIACION CON LA CONTRATISTA




PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ARRASTRE


 **SNIP 1132818** REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN, ALDEA XEJUUP, NAHUALA, SOLOLA. CÓDIGO UDI.07-05-0136-43

FECHA DE ADJUDICACION AÑO 2014
ESTADO FISICO 30.40 %
ESTADO FINANCIERO 0.00%
MONTO DEL CONTRATO: Q1,074,558.71
MONTO PAGADO: Q0.00
MONTO DE SALDO: Q1,074,558.71
UBICACIÓN: NAHUALA , SOLOLA
CONTRATISTA: CARRESA
ESTADO: Proyecto Suspendido temporalmente la ejecución por medio de Resolución 0.1-001A-2019/amv

 **SNIP 133663** REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CHUISAICAP, ALDEA TZUCUBAL, NAHUALA, SOLOLA. CÓDIGO UDI. 07-05-0145-43

FECHA DE ADJUDICACION AÑO 2014
ESTADO FISICO 20.48 %
ESTADO FINANCIERO 98.00%
MONTO DEL CONTRATO: Q848,504.46
MONTO PAGADO: Q0.00
MONTO DE SALDO: Q848,504.46
UBICACIÓN: NAHUALA , SOLOLA
CONTRATISTA: CARRESA
ESTADO: Proyecto Suspendido temporalmente la ejecución por medio de Resolución 0.1-001A-2019/amv

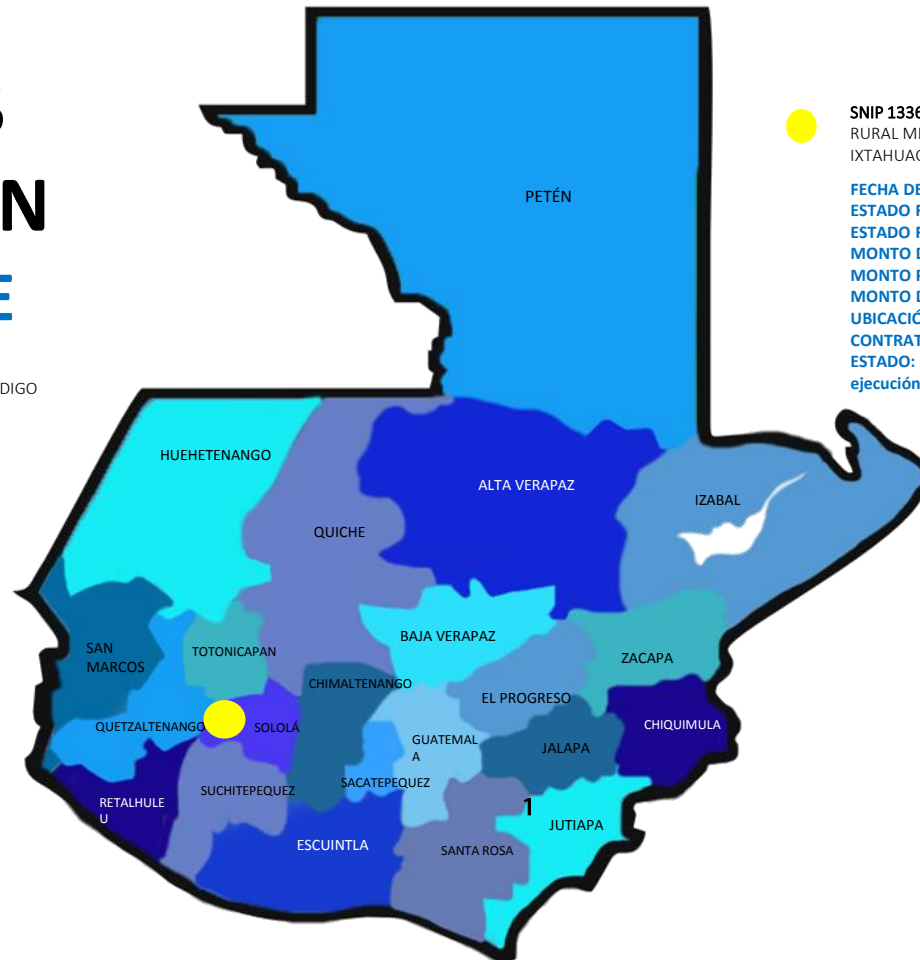


 **SNIP 133671** REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-06-0214-43

FECHA DE ADJUDICACION AÑO 2014
ESTADO FISICO 12.86 %
ESTADO FINANCIERO 0.00 %
MONTO DEL CONTRATO: Q,2,596,182.38
MONTO PAGADO: Q0.00
MONTO DE SALDO: Q,2,596,182.38
UBICACIÓN: NAHUALA , SOLOLA
CONTRATISTA: CARRESA
ESTADO: Proyecto Suspendido temporalmente la ejecución por medio de Resolución 0.1-001A-2019/amv




PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ARRASTRE

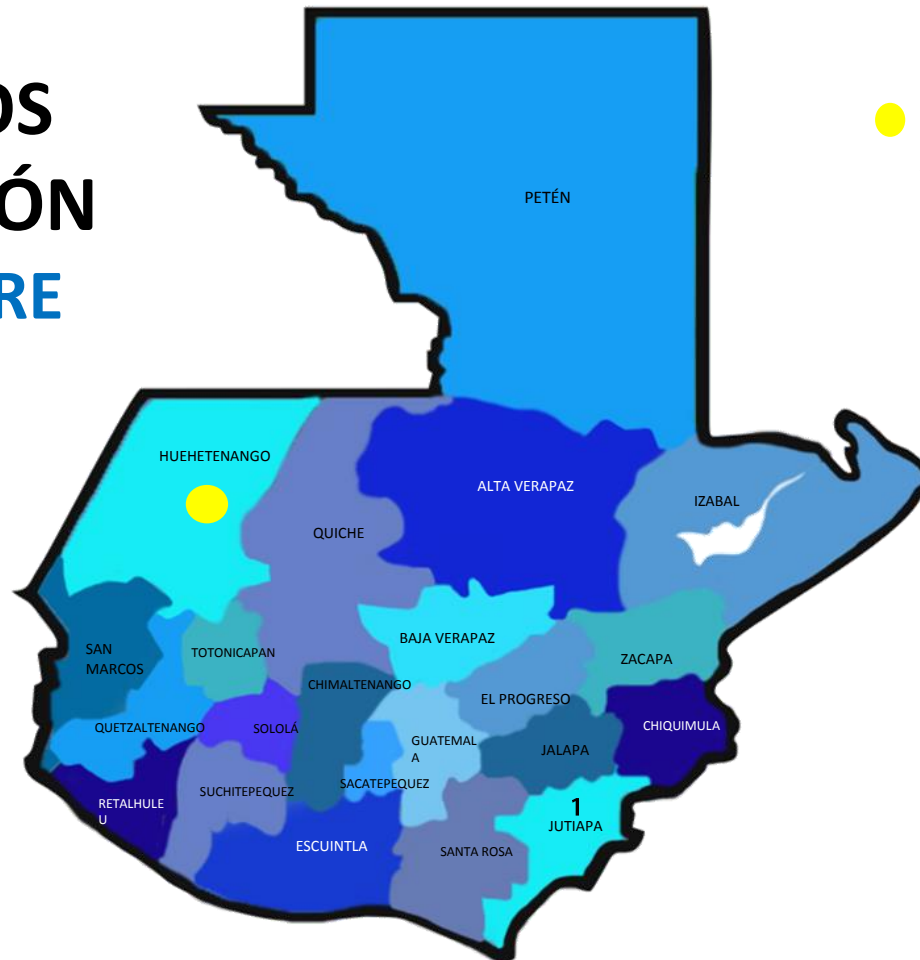


- **SNIP 16730 AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO. NOG. 3396312**
FECHA DE ADJUDICACION AÑO 2014
ESTADO FISICO 100%
ESTADO FINANCIERO 98.00%
MONTO DEL CONTRATO: Q1,918,992.99
MONTO PAGADO: Q1,885,581.47
MONTO DE SALDO: Q33,411.52
UBICACIÓN: AGUACATAN HUEHUETENANGO
CONTRATISTA: PERFIL INMOBILIARIO
ESTADO: FINALIZADA Y PENDIENTE DE RECEPCIÓN




PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ARRASTRE

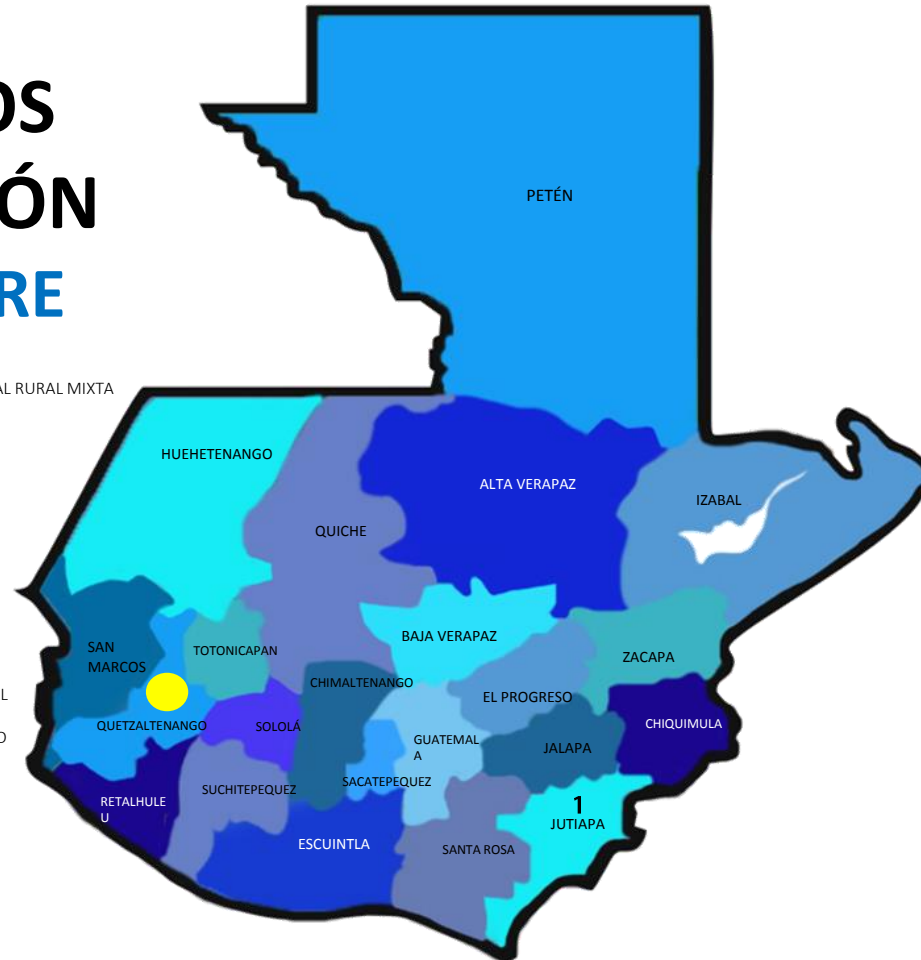



 **SNIP 132718** REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-24-0733-43

FECHA DE ADJUDICACION AÑO 2014
ESTADO FISICO 100.00 %
ESTADO FINANCIERO 90.00%
MONTO DEL CONTRATO: Q479,801.65
MONTO PAGADO: Q431,993.10
MONTO DE SALDO: Q47,808.55
UBICACIÓN: PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO
CONTRATISTA: E.M.E
ESTADO: PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN

 **SNIP 132713** REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PIMUT CENTRO, CANTON LA CUMBRE, OLINTEPEQUE, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-03-0009-43

FECHA DE ADJUDICACION AÑO 2014
ESTADO FISICO 100.00 %
ESTADO FINANCIERO 97.00%
MONTO DEL CONTRATO: Q1,291,020.02
MONTO PAGADO: Q1,255,617.28
MONTO DE SALDO: Q35,402.74
UBICACIÓN: OLINTEPEQUE, QUETZALTENANGO
CONTRATISTA: E.M.E
ESTADO: PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN

 **SNIP 132732** REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CANTON EL CALVARIO, ZUNIL, QUETZALTENANGO.(JORNADA MATUTINA) CÓDIGO UDI: 09-16-0430-43
FECHA DE ADJUDICACION AÑO 2014
ESTADO FISICO 100.00 %
ESTADO FINANCIERO 95.00%
MONTO DEL CONTRATO: Q859,008.54
MONTO PAGADO: Q821,540.12
MONTO DE SALDO: Q37,468.42
UBICACIÓN: ZUNIL, QUETZALTENANGO
CONTRATISTA: E.M.E
ESTADO: PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN


 **SNIP 133328** REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR CENTRO ESTANCIA DE LA CRUZ, ZUNIL, QUETZALTENANGO. CÓDIGO UDI: 09-16-0435-43

FECHA DE ADJUDICACION AÑO 2014
ESTADO FISICO 100.00 %
ESTADO FINANCIERO 94.00%
MONTO DEL CONTRATO: Q282,060.85
MONTO PAGADO: Q267,418.57
MONTO DE SALDO: Q14,642.28
UBICACIÓN: ZUNIL, QUETZALTENANGO
CONTRATISTA: E.M.E
ESTADO: PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN



PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ARRASTRE

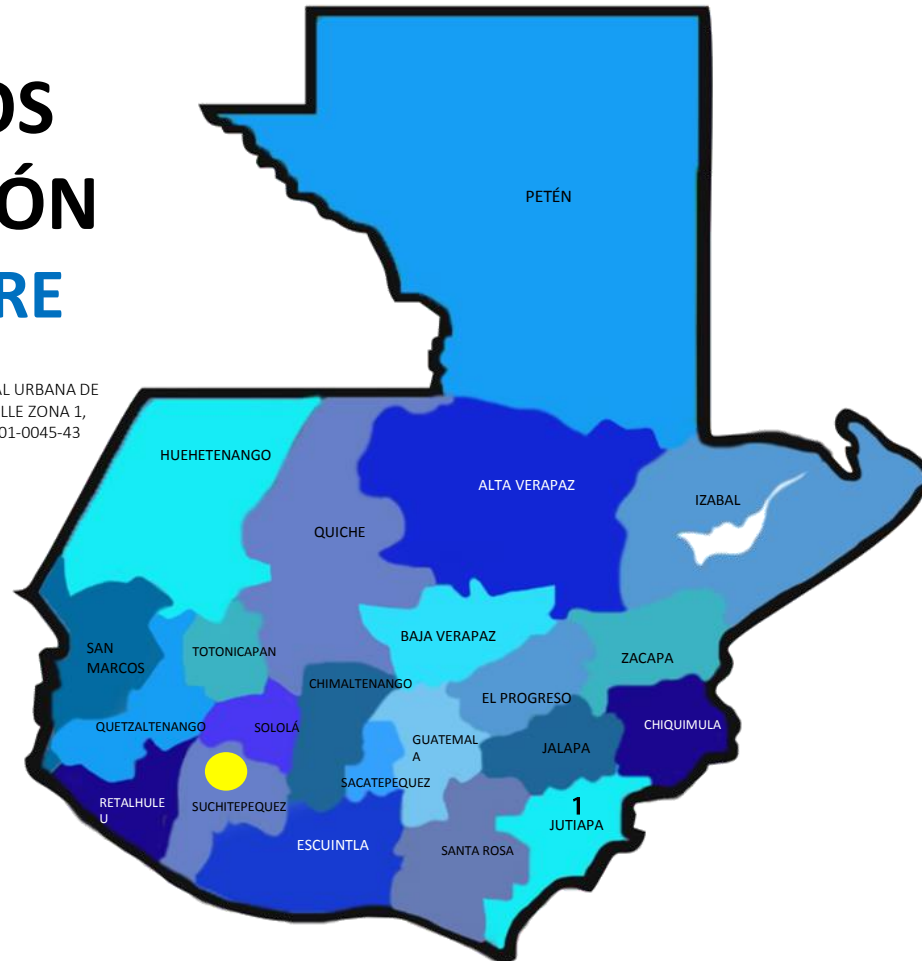

- **SNIP 133378** REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE VARONES NO.2 MARIANO GALVEZ, 7A. AVE. Y 8A. CALLE ZONA 1, MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. CÓDIGO UDI: 10-01-0045-43
- FECHA DE ADJUDICACION AÑO 2014**
- ESTADO FISICO 100.00 %**
- ESTADO FINANCIERO 87.00%**
- MONTO DEL CONTRATO: Q734,444.37**
- MONTO PAGADO: Q639,077.19**
- MONTO DE SALDO: Q95,367.18**
- UBICACIÓN: MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ**
- CONTRATISTA: E.M.E**
- ESTADO: PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN**





PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION 2019

AMPLIACION ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL SACAPULAS, QUICHE



		NOMBRE DE PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL SACAPULAS, QUICHE						
DIRECCION: Municipio de Sacapulas, departamento de Quiché		CONTRATO: 83-2018-UCCE		SNIP: 33423	NOG: 3302903	LATITUD: 15°25'27.52" N	LONGITUD: 91°14'14.85" W	
FICHA TECNICA PROYECTO:								
1-DATOS DE PROYECTO.				5. DOCUMENTOS GENERALES				
1.1	NOMBRE DEL PROYECTO	AMPLIACION ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL SACAPULAS QUICHE	No.	TIPO DOCUMENTO	RESPONSABLE	FECHA	OBSERVACION	
1.2	MONTO DEL PROYECTO ORIGINAL	Q 3,529,441.99	5.1	BITACORA	COCESA	26-jul-18	YA EN OBRA	
1.3	MONTO DEL PROYECTO MODIFICADO	5.2	LIBRO DE ACTAS	OPERACIONES	9-sep-18	YA EN UCCEE	
1.3	CONTRATO NUMERO	83-2018-UCCE	5.3	ENTREGA DE SITIO	DIRECTOR UCCEE	19-sep-18		
1.4	TIEMPO DE EJECUCION	150 DIAS CALENDARIO	5.4	ESTIMACION 1	ARG. CARLOS GONZALEZ	16-oct-18	PAGADA	
1.5	FECHA DE INICIO	19-sep-18	5.5	ESTIMACION 2	ARG. CARLOS GONZALEZ	7-nov-18	PAGADA	
1.6	FECHA DE FINALIZACION	16-feb-19	5.6	ESTIMACION 3	ARG. MARIA ETELVINA ORDOÑEZ	24-abr-19	VIGENTE	
1.7	SUSPENSION/INICIO	20/1/2019 23/04/2019	5.7	ESTATUS LEGAL	UCCEE	7-feb-19	VIGENTE	
1.8	PRORROGA/FINALIZACION	7/06/2019 15/10/2019	5.8					
2.1	NOMBRE DE LA EMPRESA	COCESA	5.9					
2.2	REPRESENTANTE LEGAL / PROPIETARIO	JENNIFER EDY RAMIREZ DIAZ	5.10					
2.3	PROFESIONAL RESIDENTE	ING. CARLOS ENRIQUE CORONA ARENALES CDL. 15456	5.11					
3. HISTORIAL DE SUPERVISION				6- ORDEN DE CAMBIO 1				
3	FECHA DE INFORME	RESPONSABLE	% AVANCE FISICO	No.	TIPO DOCUMENTO	MONTO	PERCENTAJE	FECHA
3.1	juenes, 18 de octubre de 2018	Arg. Carlos Gonzalez	32.01%	6.1	DECREMENTO
3.2	martes, 27 de noviembre de 2018	Arg. Carlos Gonzalez	34.49%	6.2	SUPLEMENTARIO
3.3	No. ESTIMACIONES PAGADAS	Arg. Aura Verónica Cabrera	43.83%	6.3	EXTRA
3.4	juenes, 10 de enero de 2019	Arg. Etelvina Ordoñez	50.54%					
3.5	viernes, 15 de marzo de 2019	Arg. Etelvina Ordoñez	62.17%	No.	TIPO DOCUMENTO	MONTO	PERCENTAJE	FECHA
3.6	viernes, 5 de abril de 2019	Arg. Etelvina Ordoñez	64.01%	7.1	DECREMENTO
3.7	juenes, 25 de abril de 2019	Arg. Etelvina Ordoñez	64.98%	7.2	SUPLEMENTARIO
3.8	martes, 14 de mayo de 2019	Arg. Etelvina Ordoñez	65.49%		EXTRA
3.9	lunes, 3 de junio de 2019	Arg. Etelvina Ordoñez	68.47%					
3.9	martes, 6 de agosto de 2019	Arg. Etelvina Ordoñez	90.13%	7.3				
4- DATOS FISICO/FINANCIEROS				8. INFORMACION DE FIANZAS				
4.1	AVANCE FISICO (FECHA ACTUAL)	90.13%	No.	TIPO DOCUMENTO	CORRELATIVO DE FIANZA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	
4.2	AVANCE FINANCIERO (FECHA ACTUAL)	ESTIMACION 7	8.1	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	188714 SEGUROS FIANZA	12-jul-18	sábado, 8 de diciembre de 2018	
4.3	TIEMPO EN EJECUCION	150 DIAS	8.2	ANTICIPO	188718 SEGUROS FIANZA	12-jul-18	sábado, 8 de diciembre de 2018	
4.4	No. ESTIMACIONES PAGADAS	7	8.3	CONSERVACION DE OBRA	
4.5	DIAS DE ATRASO		8.4	SALDOS DEUDORES	
9. DATOS DE ESTIMACIONES Y SUPERVISION MENSUAL								
9	ESTIMACION NO.	FECHA	MONTO	% FINANCIERO	PROFESIONAL QUE EVALUO	OBSERVACIONES GENERALES		
9.1	ANTICIPO	19-sep-18	Q 352,944.19	10.000%		PAGADO		
9.2	ESTIMACION 1	16-oct-18	Q 808,544.95	22.900%	Arg. Carlos Gonzalez	PAGADO		
9.3	ESTIMACION 2	7-nov-18	Q 408,795.99	11.580%	Arg. Carlos Gonzalez	PAGADO		
9.4	ESTIMACION 3	25-abr-19	Q 335,548.27	9.51%	Arg. Maria Etelevina Ordoñez	PAGADO		
9.5	ESTIMACION 4	25-abr-19	Q 1,302,883.29	36.91%	Arg. Maria Etelevina Ordoñez	PAGADO		
9.6	ESTIMACION 5	6-may-19	Q 107,612.88	3.05%	Arg. Maria Etelevina Ordoñez	PAGADO		
9.7	ESTIMACION 6	6-jun-19	Q 42,609.79	1.21%	Arg. Maria Etelevina Ordoñez	PAGADO		
9.8	ESTIMACION 7	5-jul-19	Q 143,292.25	4.06%	Arg. Maria Etelevina Ordoñez	PAGADO		
9.9	TOTAL		Q 3,502,181.61	96.220%				





PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION 2019

REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA LAS ASTAS. BARBERENA. SANTA ROSA



 REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASTAS, BARBERENA, SANTA ROSA		 UCCEE	
DIRECCION: ALDEA LAS ASTAS, BARBERENA, SANTA ROSA		LATITUD	LONGITUD
CONTRATO: 159-2018-UCCEE		14°20' 0.03" N	90°21.8 8.16" O
SNIP: 224376		NOG: 8295964	
FICHA TECNICA PROYECTO:			
1. DATOS DE PROYECTO.		4. DOCUMENTOS GENERALES	
1.1	NOMBRE DEL PROYECTO	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ASTAS, BARBERENA, SANTA ROSA	No.
1.2	MONTO DEL PROYECTO ORIGINAL	Q 3,545,876.68	5.1
1.3	MONTO DEL PROYECTO MODIFICADO	Q 4,187,154.62	5.2
1.3	CONTRATO NUMERO	159-2018-UCCEE	5.3
1.4	TIEMPO DE EJECUCION	390 DIAS CALENDARIO	5.4
1.5	FECHA DE INICIO	02-ene-19	5.5
1.6	FECHA DE FINALIZACION	30-ene-20	5.6
1.7	SUSPENSION/INICIO		5.7
1.8	PRORROGA/FINALIZACION		5.8
2.1	NOMBRE DE LA EMPRESA	EMPRESA X.W.	5.9
2.2	REPRESENTANTE LEGAL / PROPIETARIO	ALBA LUZ DUQUE GIRON	5.10
2.3	PROFESIONAL RESIDENTE	ARQ. EDWIN MENESES	5.11
2. HISTORIAL DE SUPERVISION		5. VARIACIONES EN EL VALOR DEL CONTRATO (1)	
3	FECHA DE INFORME	RESPONSABLE	% AVANCE FISICO
3.1	miércoles, 09 de enero de 2019	ARQ. ALVARO BEBER	6.24%
3.2	martes, 26 de febrero de 2019	ARQ. ALVARO BEBER	15.57%
3.3	lunes, 11 de marzo de 2019	ARQ. ALVARO BEBER	17.23%
3.4	miércoles, 27 de marzo de 2019	ARQ. GONZALO SALGUERO	17.23%
3.5	lunes, 06 de mayo de 2019	ARQ. GONZALO SALGUERO	35.41%
3.6	miércoles, 22 de mayo de 2019	ARQ. GONZALO SALGUERO	38.21%
3.7	sábado, 15 de junio de 2019	Ing. Roberto Ralda	38.21%
3.8	jueves, 11 de julio de 2019	Ing. Roberto Ralda	44.47%
3.9	sábado, 03 de agosto de 2019	Ing. Roberto Ralda	55.95%
3. DATOS FISICO/FINANCIEROS		6. VARIACIONES EN EL VALOR DEL CONTRATO (2)	
4.1	AVANCE FISICO (FECHA ACTUAL)	55.95%	No.
4.2	AVANCE FINANCIERO (FECHA ACTUAL)	37.84%	8.1
4.3	TIEMPO EN EJECUCION	215 Dias	8.2
4.4	No. ESTIMACIONES PAGADAS	3	8.3
4.5	DIAS DE ATRASO	0	8.4
7. INFORMACION DE FIANZAS		8. DATOS DE ESTIMACIONES Y SUPERVISION MENSUAL	
4.1	AVANCE FISICO (FECHA ACTUAL)	55.95%	No.
4.2	AVANCE FINANCIERO (FECHA ACTUAL)	37.84%	8.1
4.3	TIEMPO EN EJECUCION	215 Dias	8.2
4.4	No. ESTIMACIONES PAGADAS	3	8.3
4.5	DIAS DE ATRASO	0	8.4
7. INFORMACION DE FIANZAS		8. DATOS DE ESTIMACIONES Y SUPERVISION MENSUAL	
9	ESTIMACION NO.	FECHA	MONTO
9.1	ANTICIPO (POR AMORTIZAR)	3-dic-18	Q 789,175.34
9.2	ESTIMACION NO. 1	4-mar-19	Q 531,766.62
9.3	ESTIMACION NO. 2	5-abr-19	Q 295,126.34
9.4	ESTIMACION NO. 3	6-may-19	Q 428,432.23
9.5	ESTIMACION NO. 4	5-jul-19	Q 283,013.81
9.6	ESTIMACION NO. 5	5-ago-19	Q 784,303.28
9.7			
TOTAL			Q 2,342,644.28





PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION 2019

REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO GRANDE, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA



 GUATEMALA <small>MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO</small>		NOMBRE DE PROYECTO: REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO GRANDE SANTA MARIA IXHUATÁN, SANTA ROSA DIRECCIÓN: ALDEA LLANO GRANDE SANTA MARIA IXHUATÁN, SANTA ROSA CONTRATO: 160-2018-UCEE SNIP: 224515 NOG: 8296170 LATITUD: 14°11'18" LONGITUD: 90°16'39"						
FICHA TECNICA PROYECTO:								
1-DATOS DE PROYECTO.				4. DOCUMENTOS GENERALES				
1.1	NOMBRE DEL PROYECTO	REPOSICIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO GRANDE SANTA MARIA IXHUATÁN, SANTA ROSA	No.	TIPO DOCUMENTO	RESPONSABLE	FECHA	OBSERVACION	
1.2	MONTO DEL PROYECTO ORIGINAL	Q 4.150.300,00	5.1	BITACORA	DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, S.A.	18/02/2019	YA EN OBRA	
1.3	MONTO DEL PROYECTO MODIFICADO	5.2					
1.3	CONTRATO NUMERO	160-2018-UCEE	5.3	LIBRO DE ACTAS	OPERACIONES	18/02/2019	EN USO UCEE	
1.4	TIEMPO DE EJECUCION	420 DÍAS CALENDARIO	5.4	ENTREGA DE SITIO	DIRECTOR UCEE	1-feb-19	En Libro de actas del departamento de operaciones UCEE	
1.5	FECHA DE INICIO	1-feb-19	5.5					
1.6	FECHA DE FINALIZACION	25-mar-20	5.6					
1.7	SUSPENSION / INICIO	5.7					
1.8	PRORROGA / FINALIZACION	5.8					
2.1	NOMBRE DE LA EMPRESA	DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, S.A.	5.9					
2.2	REPRESENTANTE LEGAL / PROPIETARIO	VICTOR MANUEL CHÁVEZ CASTAÑEDA	5.10					
2.3	PROFESIONAL RESIDENTE	MARCO FERNANDO MORALES GRIMALVA COL.10921	5.11					
2.HISTORIAL DE SUPERVISION				5- ORDEN DE CAMBIO 1				
3	FECHA DE INFORME	RESPONSABLE	% AVANCE FISICO	No.	TIPO DOCUMENTO	MONTO	PORCENTAJE	FECHA
3.1	miércoles, 27 de febrero de 2019	ALVARO BEBER	0.00%	6.1	DECREMENTO
3.2	lunes, 11 de marzo de 2019	ALVARO BEBER	3.44%	6.2	SUPLEMENTARIO
3.3	martes, 4 de junio de 2019	MARIO GARCIA	13.87%	6.3	EXTRA
3.4	miércoles, 07 de agosto de 2019	RONY NAVARRO	35.00%					
3.5				No.	TIPO DOCUMENTO	MONTO	PORCENTAJE	FECHA
3.6				7.1	DECREMENTO
3.7				7.2	SUPLEMENTARIO
3.8				7.3	EXTRA
3- DATOS FISICO/FINANCIEROS				7. INFORMACION DE FIANZAS				
4.1	AVANCE FISICO (FECHA ACTUAL)	0.00%	No.	TIPO DOCUMENTO	CORRELATIVO DE FIANZA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	
4.2	AVANCE FINANCIERO (FECHA ACTUAL)	20.00%	8.1	ANTICIPO	1810135	18-dic.-19		
4.3	TIEMPO EN EJECUCION	420 DÍAS CALENDARIO	8.2	CUMPLIMIENTO CONTRATO	1810133	18-dic.-18	lunes, 10 de febrero de 2020	
4.4	No. ESTIMACIONES PAGADAS	0	8.3	CONSERVACION DE OBRA	lunes, 10 de febrero de 2020	
4.5	DIAS DE ATRASO		8.4	SALDOS DEUDORES	
8. DATOS DE ESTIMACIONES Y SUPEVISION MENSUAL								
9	ESTIMACION NO.	FECHA	MONTO	% FINANCIERO	PROFESIONAL QUE EVALUO	OBSERVACIONES GENERALES		
9.1	ANTICIPO (POR AMORTIZADAR)	1-feb.-19	Q 830.060.00	20.00%	YNDRA DOLORES DAVILA FLORES	PAGADO		
9.2	ESTIMACION 1	28-mar.-19	Q 174.254.42	4.20%	ARG. GONZALO SALGUERO	PAGADO		
9.3	ESTIMACION 2	5-may.-19	Q 309.630.31	7.46%	ARG. GONZALO SALGUERO	PAGADO		
9.4	ESTIMACION 3	5-jun.-19	Q 83.911.64	13.880%	ING. MARIO GARCIA	PAGADO		
9.5								
9.6								
9.7								
9.8	TOTAL		Q 567.796.37	25.339%				





PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION 2019

MEJORAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO		NOMBRE DE PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSÉ PINEDA, SANTA MARÍA IXHUATÁN, SANTA ROSA DIRECCION: ALDEA SAN JOSÉ PINEDA, SANTA MARÍA IXHUATÁN, SANTA ROSA CONTRATO: 161-2018-UCEE SNIP: 155983				NOG: 8296243 LATITUD: 14.23008533 LONGITUD: -90.26453		
FICHA TECNICA PROYECTO: MEJORAMIENTO EORM ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA ROSA								
1-DATOS DE PROYECTO.				4. DOCUMENTOS GENERALES				
1.1	NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSÉ PINEDA, SANTA MARÍA IXHUATÁN, SANTA ROSA	No.	TIPO DOCUMENTO	RESPONSABLE	FECHA	OBSERVACION	
1.2	MONTO DEL PROYECTO ORIGINAL	Q. 4,191,000.00	5.1	BITACORA	CONSTRUCTORA EL DESVIO		AUTORIZADO 04-MARZO-2019	
1.3	MONTO DEL PROYECTO MODIFICADO		5.2	LIBRO DE ACTAS	OPERACIONES		AUTORIZADO 13-MARZO-2019	
1.4	CONTRATO NUMERO	161-2018-UCEE	5.3	ENTREGA DE SITIO	DIRECTOR UCEE	01-feb-19		
1.5	TIEMPO DE EJECUCION	300 DÍAS CALENDARIO	5.4					
1.6	FECHA DE INICIO	01-feb-19	5.5					
1.7	FECHA DE FINALIZACION	27-nov-19	5.6					
1.8	SUSPENSION/INICIO		5.7					
1.8	PRORROGA/FINALIZACION		5.8					
2.1	NOMBRE DE LA EMPRESA	CONSTRUCTORA EL DESVIO	5.9					
2.2	REPRESENTANTE LEGAL / PROPIETARIO	CÉSAR CASASOLA MORALES	5.10					
2.3	PROFESIONAL RESIDENTE		5.11					
2.HISTORIAL DE SUPERVISION				5- ORDEN DE CAMBIO 1				
3	FECHA DE INFORME	RESPONSABLE	% AVANCE FISICO	No.	TIPO DOCUMENTO	MONTO	PORCENTAJE	FECHA
3.1	miércoles, 27 de febrero de 2019	ARG. ALVARO BEBER	0.00%	6.1	DECREMENTO			
3.2	miércoles, 27 de marzo de 2019	ARG. GONZALO SALGUERO	9.51%	6.2	SUPLEMENTARIO			
3.3	martes, 04 de junio de 2019	ING. ROBERTO RALDA	21.74%	6.3	EXTRA			
3.4	miércoles, 07 de agosto de 2019	ARG. RONY NAVARRO	35.83%					
				6- ORDEN DE CAMBIO 2				
3.5				No.	TIPO DOCUMENTO	MONTO	PORCENTAJE	FECHA
3.6				7.1	DECREMENTO			
3.7				7.2	SUPLEMENTARIO			
3.8				7.3	EXTRA			
3- DATOS FISICOFINANCIEROS				7. INFORMACION DE FIANZAS				
4.1	AVANCE FISICO (FECHA ACTUAL)	0.00%	No.	TIPO DOCUMENTO	CORRELATIVO DE FIANZA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	
4.2	AVANCE FINANCIERO (FECHA ACTUAL)	20.00%	8.1	CUMPLIMIENTO CONTRATO	FG0B-8833	19-dic-18		
4.3	TIEMPO EN EJECUCION	300 DÍAS CALENDARIO	8.2	ANTICIPO				
4.4	No. ESTIMACIONES PAGADAS	0	8.3	CONSERVACION DE OBRA				
4.5	DIAS DE ATRASO	0	8.4	SALDOS DEUDORES				
8 .DATOS DE ESTIMACIONES Y SUPEVISION MENSUAL								
8	ESTIMACION NO.	FECHA	MONTO	% FINANCIERO	PROFESIONAL QUE EVALUO	OBSERVACIONES GENERALES		
9.1	ANTICIPO (AMORTIZADO)	1-feb-19	Q. 838,200.00	20.000%	YNDRA DOLORES DÁVILA FLORES	PAGADO		
9.2	ESTIMACION NO. 1	28-mar-19	Q. 398,527.37	9.509%	ARG. GONZALO SALGUERO	PAGADO		
9.3	ESTIMACION NO. 2	25-abr-19	Q. 400,387.51	9.554%	ARG. GONZALO SALGUERO	PROCESO DE PAGO		
9.4								
9.5								
9.6								
9.7								
9.8	TOTAL		Q. 798,914.88	19.063%				





PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION 2019

MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN COTZAL, QUICHE



1-DATOS DE PROYECTO.				6. DOCUMENTOS GENERALES				
1.1	NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP. SAN JUAN COTZAL		TIPO DOCUMENTO	RESPONSABLE	FECHA	OBSERVACION	
1.2	MONTO DEL PROYECTO ORIGINAL	Q	2,409,783.88	5.1	BITACORA	COMERCIAL EL CRISOL	EN OBRA	
1.3	MONTO DEL PROYECTO MODIFICADO	Q	2,552,966.88	5.2	LIBRO DE ACTAS	OPERACIONES	YA EN UCCEE	
1.3	CONTRATO NUMERO	149-2018-UCCEE		5.3	ENTREGA DE SITIO	DIRECTOR UCCEE		
1.4	TIEMPO DE EJECUCION	240 DIAS CALENDARIO		5.4	ESTIMACION 1	MARVIN LEONARDO PEREZ	PAGADA	
1.5	FECHA DE INICIO	28-sep-18		5.5	ESTIMACION 2	ARG. MARIA ETELVINA ORDONEZ	PAGADA	
1.6	FECHA DE FINALIZACION	25-may-19		5.6	ESTIMACION 3	ARG. MARIA ETELVINA ORDONEZ	PAGADA	
1.7	SUSPENSION/INICIO	2/01/2019	8/04/2019	5.7	ESTIMACION 4			
1.8	PRORROGA/FINALIZACION	25/05/2019	28/10/2019	5.8	ESTATUS LEGAL	UCCEE		
2.1	NOMBRE DE LA EMPRESA	COMERCIAL EL CRISOL		5.9	ATRASO SEGUN CROVOGRAMA	COMERCIAL EL CRISOL	ACTIVO	
2.2	REPRESENTANTE LEGAL / PROPIETARIO	OVIDIO WILFREDO MARTINEZ ESPAÑA		5.10				
2.3	PROFESIONAL RESIDENTE	ING. CIVIL WALTER ROGELIO CORZO CHACON		5.11				
3. HISTORIAL DE SUPERVISION				6- ORDEN DE CAMBIO 1				
3	FECHA DE INFORME	RESPONSABLE	% AVANCE FISICO	No.	TIPO DOCUMENTO	MONTO	PORCENTAJE	FECHA
3.1	martes, 6 de agosto de 2019	ARG. MARIA ETELVINA ORDONEZ	48.62%	6.1	DECREMENTO	Q15,516.36	0.61%	16/07/2019
3.2	lunes, 3 de junio de 2019	ARG. MARIA ETELVINA ORDONEZ	42.11%	6.2	SUPLEMENTARIO	Q569,825.96	19.36%	16/07/2019
3.3	miércoles, 15 de mayo de 2019	ARG. MARIA ETELVINA ORDONEZ	38.36%	6.3	EXTRA			
3.4	jueves, 25 de abril de 2019	ARG. MARIA ETELVINA ORDONEZ	36.85%					
3.5	jueves, 14 de marzo de 2019	ARG. MARIA ETELVINA ORDONEZ	28.95%	No	TIPO DOCUMENTO	MONTO	PORCENTAJE	FECHA
	martes, 8 de enero de 2019	ARG. MARIA ETELVINA ORDONEZ	6.14%	7.1	DECREMENTO			
	viernes, 16 de noviembre de 2018	ARG. GONZALO SALGUERO	6.53%	7.2	SUPLEMENTARIO			
				7.3	EXTRA			
4- DATOS FISICO/FINANCIEROS				8. INFORMACION DE FIANZAS				
4.1	AVANCE FISICO (FECHA ACTUAL)	48.62%		No	TIPO DOCUMENTO	CORRELATIVO DE FIANZA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION
4.2	AVANCE FINANCIERO (FECHA ACTUAL)	ESTIMACION 3		8.1	CUMPLIMIENTO CONTRATO	AFIANZADORA SOLIDARIA S.A. AFISBA No. 0402/11	17-ago.-18	martes, 16 de abril de 2019
4.3	TIEMPO EN EJECUCION	8 MESES		8.2	ANTICIPO	AFIANZADORA SOLIDARIA S.A. AFISBA No. 0405/16/19	17-ago.-18	martes, 16 de abril de 2019
4.4	No. ESTIMACIONES PAGADAS	3		8.3	CONSERVACION DE OBRA			
4.5	DIAS DE ATRASO			8.4	SALDOS DEUDORES			
9. DATOS DE ESTIMACIONES Y SUPERVISION MENSUAL								
9	ESTIMACION NO.	FECHA	MONTO	% FINANCIERO	PROFESIONAL QUE EVALUO	OBSERVACIONES GENERALES		
9.1	ANTICIPO	11-sep.-18	Q 510,593.48	19.860%		PAGADO		
9.2	ESTIMACION 1	3-dic.-18	Q 163,012.65	6.39%	ARG. CARLOS GONZALEZ	PAGADO		
9.3	ESTIMACION 2	9-abr.-19	Q 603,163.31	22.85%	ARG. MARIA ETELVINA ORDONEZ	PAGADO CON SALDO DE ESTIMACION ANTERIOR + ESTIMACION 2		
9.4	ESTIMACION 3	6-may.-19	Q 199,154.53	7.880%	ARG. MARIA ETELVINA ORDONEZ	PAGADO		
9.5	ESTIMACION 4							
9.6	ESTIMACION 5							
9.7	TOTAL		Q 1,475,923.88	27.860%				





PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION 2019

MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA INGENIEROS, PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE

		NOMBRE DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, ALDEA INGENIEROS, PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE					
DIRECCION: Aldea Ingenieros, Municipio de Ixcán, Departamento de Quiché		CONTRATO: 150-2018-UCEE		LATITUD: 16,05777333		LONGITUD: -90,64436667	
SNIP: 209398		NOG: 7471588					
FICHA TECNICA PROYECTO:							
1-DATOS DE PROYECTO.				5. DOCUMENTOS GENERALES			
1.1	NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD ALDEA INGENIEROS PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE		No.	TIPO DOCUMENTO	RESPONSABLE	FECHA
1.2	MONTO DEL PROYECTO ORIGINAL	Q	3.303.375,31	5.1	BITACORA	CRISOL	03-oct-19
1.3	MONTO DEL PROYECTO MODIFICADO	Q	3.814.317,69	5.2	LIBRO DE ACTAS	OPERACIONES	04-oct-19
1.3	CONTRATO NUMERO	150-2018-UCEE		5.3	ENTREGA DE SITIO	DIRECTOR UCEE	05-oct-19
1.4	TIEMPO DE EJECUCION	240 DIAS CALENDARIO		5.4	ESTIMACION 1	ARQ. MARVIN PEREZ	05-dic-18
1.5	FECHA DE INICIO	28-sep-18		5.5	ESTIMACION 2	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	09-abr-19
1.6	FECHA DE FINALIZACION	28-oct-19		5.6	ESTIMACION 3	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	06-may-19
1.7	SUSPENSION/INICIO	02/01/2019	08/04/2019	5.7	ESTIMACION 4	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	03-jun-19
1.8	PRORROGA/FINALIZACION	30/08/2019	28/10/2019	5.8	ESTIMACION 5	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	04-jul-19
2.1	NOMBRE DE LA EMPRESA	COMERCIAL EL CRISOL		5.9	ESTIMACION 6	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	05-ago-19
2.2	REPRESENTANTE LEGAL / PROPIETARIO	OVIDIO WILFREDO MARTINEZ		5.10	ESTATUS LEGAL	UCEE	29/09/2019
2.3	PROFESIONAL RESIDENTE	ARQ. LUIS FIGUEROA		5.11			
3.HISTORIAL DE SUPERVISION				6- ORDEN DE CAMBIO 1			
3	FECHA DE INFORME	RESPONSABLE	% AVANCE FISICO	No.	TIPO DOCUMENTO	MONTO	PORCENTAJE
3.1	lunes, 12 de noviembre de 2018	Arq. Gonzalo Saiguero	5,39%	6.1	DECREMENTO	Q 47.970,22	145,00%
3.2	martes, 27 de noviembre de 2018	Arq. Gonzalo Saiguero	17,42%	6.2	SUPLEMENTARIO	Q 483.385,57	1483,00%
3.3	martes, 19 de febrero de 2019	Arq. Andrea Bethancourt	24,85%	6.3	EXTRA	Q 72.527,04	220,00%
3.4	miércoles, 03 de abril de 2019	Arq. Andrea Bethancourt	27,06%				
3.5	miércoles, 01 de mayo de 2019	Arq. Andrea Bethancourt	28,91%	No.	TIPO DOCUMENTO	MONTO	PORCENTAJE
3.6	jueves, 30 de mayo de 2019	Arq. Andrea Bethancourt	31,27%	7.1	DECREMENTO		
3.7	martes, 11 de junio de 2019	Arq. Andrea Bethancourt	33,98%	7.2	SUPLEMENTARIO		
3.8	martes, 02 de julio de 2019	Arq. Andrea Bethancourt	46,69%	7.3	EXTRA		
3.9	martes, 30 de julio de 2019	Arq. Andrea Bethancourt	53,25%	7.3			
3.10	viernes, 23 de agosto de 2019	Arq. Andrea Bethancourt	53,25%	7.3			
4- DATOS FISICO/FINANCIEROS				8. INFORMACION DE FIANZAS			
4.1	AVANCE FISICO (FECHA ACTUAL)	53,25%		No.	TIPO DOCUMENTO	CORRELATIVO DE FIANZA	FECHA INICIO
4.2	AVANCE FINANCIERO (FECHA ACTUAL)	20% ANTICIPO		8.1	CUMPLIMIENTO CONTRATO	0802-158613 AP/ISSA	28-sep-18
4.3	TIEMPO EN EJECUCION	315		8.2	ANTICIPO	0405-107021 AP/ISSA	28-sep-18
4.4	No. ESTIMACIONES PAGADAS	3		8.3	CONSERVACION DE OBRA		martes, 02 de julio de 2019
4.5	DIAS DE ATRASO			8.4	SALDOS DEUDORES		
9. DATOS DE ESTIMACIONES Y SUPERVISION MENSUAL							
9	ESTIMACION NO.	FECHA	MONTO	% FINANCIERO	PROFESIONAL QUE EVALUO	OBSERVACIONES GENERALES	
9.1	ANTICIPO	28-sep-18	Q 660.675,06	20,000%		PAGADO	
9.2	ESTIMACION 1	3-dic-18	Q 211.350,04	6,400%	ARQ. MARVIN PEREZ	PAGADA	
9.3	ESTIMACION 2	9-abr-19	Q 609.879,35	18,460%	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	PAGADA	
9.4	ESTIMACION 3	6-may-19	Q 133.965,35	4,050%	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	PAGADA	
9.5	ESTIMACION 4	3-jun-19	Q 77.832,04	2,360%	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	INGRESADA	
9.6	ESTIMACION 5	4-jul-19	Q 509.202,11	15,410%	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	INGRESADA	
9.6	ESTIMACION 6	5-ago-19	Q 484.111,89	12,700%	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	INGRESADA	
9.7	TOTAL		Q 4.032.825,58	31,270%			





PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION 2019

MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP TACANA, SAN MARCOS



Mejoramiento Centro de Atención Permanente CAP Tacaná, San Marcos			
DIRECCION: Tacana, Departamento de San Marcos			
CONTRATO: 147-2018-UCEE	NOG: 7729375	LATITUD	LONGITUD
SNIP: 209397		15°14'12.90"	92°4'15.72"



FICHA TECNICA PROYECTO:



1-DATOS DE PROYECTO.				5. DOCUMENTOS GENERALES				
No.	TIPO DOCUMENTO	RESPONSABLE	FECHA	OBSERVACION				
1.1	NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP, TACANA, SAN MARCOS						
1.2	MONTO DEL PROYECTO ORIGINAL	Q	2,088,358.58	5.1	BITACORA	BM MULTIPROYECTOS	2-oct-18	En Obra
1.3	MONTO DEL PROYECTO MODIFICADO	Q	2,504,954.63	5.2	LIBRO DE ACTAS	OPERACIONES	10-abr-15	En UCEE
1.3	CONTRATO NUMERO	147-2018-UCEE		5.3	DEPOSITO DE ANTICIPO	DIRECTOR UCEE	27-sep-18	Acta 1-2018, folio No.2
1.4	TIEMPO DE EJECUCION	210 DIAS CALENDARIO		5.4	SUSPENSION TEMPORAL	DIRECTOR UCEE	2-ene-19	Resolucion 0.1-001A-2019/amv
1.5	FECHA DE INICIO	27-sep-18		5.5	SE LEVANTO SUSPENSION	DIRECTOR UCEE	8-abr-19	Resolucion 0.1-028-2019/Vlrmf
1.6	FECHA DE FINALIZACION	24-abr-19		5.6	APROBACION DE ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO No.1	DIRECTOR UCEE	10-jul-19	Resolucion 0.1-124-2019/VVeo
1.7	SUSPENSION/INICIO	2-ene	9-abr	5.7	APROBACION DE ACUERDO DE TRABAJO EXTRA No.1			
1.8	PRORROGA/FINALIZACION	60 Dias	28-sep	5.8	SE OTORGA AMPLIACION DE PLAZO CONTRACTUAL (60 dias)			
2.1	NOMBRE DE LA EMPRESA	BM MULTIPROYECTOS		5.9				
2.2	REPRESENTANTE LEGAL / PROPIETARIO	ARQ. MARIO HERNAN BEDOYA		5.10				
2.3	PROFESIONAL RESIDENTE	ARQ. JUAN MIGUEL HERNANDEZ MEDINA		5.11				
3. HISTORIAL DE SUPERVISION				6. ORDEN DE CAMBIO 1				
No.	FECHA DE INFORME	RESPONSABLE	% AVANCE FISICO	No.	TIPO DOCUMENTO	MONTO	PORCENTAJE	FECHA
3.1	lunes, 10 de diciembre de 2018	ARQ. LUIS ANTONIO FIGUEROA	40.92%	6.1	DECREMENTO			
3.2	martes, 22 de enero de 2019	ARQ. MARIA EVELINA ORDOÑEZ	43.94%	6.2	SUPLEMENTARIO	Q284,198.63	13.61%	10-jul-19
3.3	viernes, 5 de abril de 2019	ING. ROBERTO IVAN RALDA BARRIOS	51.31%	6.3	EXTRA	Q132,397.42	6.34%	10-jul-19
3.4	jueves, 2 de mayo de 2019	ING. ROBERTO IVAN RALDA BARRIOS	53.96%	K				
3.5	miércoles, 15 de mayo de 2019	ING. ROBERTO IVAN RALDA BARRIOS	60.03%	No.	TIPO DOCUMENTO	MONTO	PORCENTAJE	FECHA
3.6	sábado, 8 de junio de 2019	ING. ROBERTO IVAN RALDA BARRIOS	63.86%	7.1	DECREMENTO			
3.7	jueves, 1 de agosto de 2019	ING. ROBERTO IVAN RALDA BARRIOS	77.29%	7.2	SUPLEMENTARIO			
				7.3	EXTRA			
4-DATOS FISICO/FINANCIEROS				8. INFORMACION DE FIANZAS				
No.	AVANCE FISICO (FECHA ACTUAL)	77.29%		No.	TIPO DOCUMENTO	CORRELATIVO DE FIANZA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION
4.1	AVANCE FISICO (FECHA ACTUAL)	77.29%		8.1	CUMPLIMIENTO CONTRATO	SEGUROS ALIANZA FGOB 7884	21-sep-18	21-sep-19
4.2	AVANCE FINANCIERO (FECHA ACTUAL)	53.24%		8.2	ANTICIPO	SEGUROS ALIANZA FGOB 7883		
4.3	TIEMPO EN EJECUCION	308 DIAS		8.3	CONSERVACION DE OBRA			
4.4	No. ESTIMACIONES PAGADAS	2		8.4	SALDOS DEUDORES			
4.5	DIAS DE ATRASO							
9. DATOS DE ESTIMACIONES Y SUPERVISION MENSUAL								
No.	ESTIMACION NO.	FECHA	MONTO	% FINANCIERO	PROFESIONAL QUE EVALUO	OBSERVACIONES GENERALES		
9.1	ANTICIPO	6-sep.-18	Q 417,671.72			PAGADO		
9.2	ESTIMACION 1 (pago parcial 85.30%)	31-oct.-18	Q 417,672.00	16.67%	ARQ. CARLOS E. GONZALEZ	PAGADO		
9.3	ESTIMACION 1 (pago parcial 34.70%)	31-oct.-18	Q 221,976.46	8.88%	ARQ. CARLOS E. GONZALEZ	PAGADO		
9.4	ESTIMACION 2	1-nov.-18	Q 388,162.13	15.50%	ING. ROBERTO RALDA	PAGADO		
9.5	ESTIMACION 3	1-abr.-19	Q 225,884.56	9.02%	ING. ROBERTO RALDA	PAGADO		
9.6	ESTIMACION 4	4-jun.-19	Q 79,839.59	3.19%	ING. ROBERTO RALDA	PAGADO		
9.7	ESTIMACION 5	17-jul.-19	Q 460,348.25	18.38%	ING. ROBERTO RALDA	PENDIENTE DE PAGO, PERO YA INGRESADA		
9.8	ESTIMACION 6	1-ago.-19	Q 142,216.56	5.68%	ING. ROBERTO RALDA	PENDIENTE DE PAGO, PERO YA INGRESADA		
	TOTAL		Q 1,936,099.57	53.24%	El % corresponde al total ya pagado, respecto al valor modificado del contrato			





PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION 2019

MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SANTA CRUZ, ALTA VERAPAZ



		NOMBRE DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SANTA CRUZ, ALTA VERAPAZ DIRECCION: Municipio de Santa Cruz, departamento de Alta Verapaz CONTRATO: 148-2018-UCEE SNIP: 209400				 LATITUD: 15°22'24.78" LONGITUD: 90°25'37.22"		
FICHA TECNICA PROYECTO:								
1-DATOS DE PROYECTO.				5. DOCUMENTOS GENERALES				
1.1	NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SANTA CRUZ, ALTA VERAPAZ	No.	TIPO DOCUMENTO	RESPONSABLE	FECHA	OBSERVACION	
1.2	MONTO DEL PROYECTO ORIGINAL	Q 3.832.289.39	5.1	BITACORA	BM MULTIPROYECTOS	02-oct-18	YA EN OBRA	
1.3	MONTO DEL PROYECTO MODIFICADO	Q 4.043.854.36	5.2	LIBRO DE ACTAS	OPERACIONES	02-oct-18	YA EN UCEE	
1.3	CONTRATO NUMERO	148-2018-UCEE	5.3	ENTREGA DE SITIO	DIRECTOR UCEE	27-sep-18		
1.4	TIEMPO DE EJECUCION	180 DIAS CALENDARIO	5.4	ESTIMACION 1	Arg. Carlos González	31-oct-18	PAGADA	
1.5	FECHA DE INICIO	27-sep-18	5.5	ESTIMACION 2	Arg. Carlos González	15-nov-18	PAGADA	
1.6	FECHA DE FINALIZACION	02-ago-19	5.6	ESTIMACION 3	Arg. Andrea Bethancourt	26-abr-19	PAGADA	
1.7	SUSPENSIÓN/INICIO		5.7	ESTIMACION 4	Arg. Andrea Bethancourt	31-may-19	PAGADA	
1.8	PRORROGA/FINALIZACION	26/03/2019 / 02/08/2019	5.8	ESTIMACION 5	Arg. Andrea Bethancourt	01-jul-19	INGRESADA	
2.1	NOMBRE DE LA EMPRESA	BM MULTIPROYECTOS	5.9	ESTIMACION 6	Arg. Andrea Bethancourt	01-ago-19	INGRESADA	
2.2	REPRESENTANTE LEGAL / PROPIETARIO	MARIO HERNAN BEDOYA BARRIOS	5.10	ESTATUS LEGAL	UCEE	08-ago-19	VIGENTE	
2.3	PROFESIONAL RESIDENTE	EDGAR ARMANDO CORONADO VELZ COL. 15306	5.11					
3. HISTORIAL DE SUPERVISION				6- ORDEN DE CAMBIO 1				
3	FECHA DE INFORME	RESPONSABLE	% AVANCE FISICO	No.	TIPO DOCUMENTO	MONTO	PORCENTAJE	FECHA
3.1	lunes, 12 de noviembre de 2018	Arg. Carlos González	20.45%	6.1	DECREMENTO			
3.2	lunes, 21 de enero de 2019	Arg. Andrea Bethancourt	48.67%	6.2	SUPLEMENTARIO	Q 138.565,28	3,84%	23/04/2019
3.3	miércoles, 20 de febrero de 2019	Arg. Andrea Bethancourt	53,30%	6.3	EXTRA	Q 271.889,63	7,49%	23/04/2019
3.4	jueves, 04 de abril de 2019	Arg. Andrea Bethancourt	55,33%					
3.5	martes, 30 de abril de 2019	Arg. Andrea Bethancourt	67,28%					
3.6	jueves, 16 de mayo de 2019	Arg. Andrea Bethancourt	67,30%	7.1	DECREMENTO			
3.7	miércoles, 29 de mayo de 2019	Arg. Andrea Bethancourt	69,15%	7.2	SUPLEMENTARIO			
3.8	lunes, 10 de junio de 2019	Arg. Andrea Bethancourt	70,19%	7.3	EXTRA			
3.9	lunes, 01 de julio de 2019	Arg. Andrea Bethancourt	76,38%	7.3	EXTRA			
3.10	viernes, 12 de julio de 2019	Arg. Andrea Bethancourt	77,15%	7.3	EXTRA			
3.11	miércoles, 31 de julio de 2019	Arg. Andrea Bethancourt	80,00%	7.3	EXTRA			
4- DATOS FISICO/FINANCIEROS				8. INFORMACION DE FIANZAS				
4.1	AVANCE FISICO (FECHA ACTUAL)	90.00%	No.	TIPO DOCUMENTO	CORRELATIVO DE FIANZA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	
4.2	AVANCE FINANCIERO (FECHA ACTUAL)	ESTIMACION 4	8.1	ANTICIPO	FGOB-7963 SEGUROS ALIANZA S.A.	17-ago-18	martes, 02 de julio de 2019	
4.3	TIEMPO EN EJECUCION	310	8.2	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	FGOB-7963 SEGUROS ALIANZA S.A.	17-ago-18	HASTA QUE UCEE RECIBA SATISFACTORIAMENTE EL PROYECTO	
4.4	No. ESTIMACIONES PAGADAS	4	8.3	SALDOS DEUDORES				
4.5	DIAS DE ATRASO		8.4					
9- DATOS DE ESTIMACIONES Y SUPERVISION MENSUAL								
9	ESTIMACION NO.	FECHA	MONTO	%	PROFESIONAL QUE EVALUO	%	OBSERVACIONES GENERALES	
9.1	ANTICIPO	27-sep-18	Q 726.459,88	20.00%	Arg. Carlos González		PAGADO	
9.2	ESTIMACION 1	31-oct-18	Q 742.793,25	20.45%	Arg. Carlos González		PAGADO	
9.3	ESTIMACION 2	15-nov-18	Q 1.700.953,82	39,77%	Arg. Carlos González		PAGADO	
9.4	ESTIMACION 3	26-abr-19	Q 276.904,00	6,85%	Arg. Andrea Bethancourt		PAGADO	
9.5	ESTIMACION 4	31-may-19	Q 75.076,17	1,86%	Arg. Andrea Bethancourt		PAGADO	
9.6	ESTIMACION 5	1-jul-19	Q 290.383,95	7,18%	Arg. Andrea Bethancourt		INGRESADA	
9.6	ESTIMACION 6	1-ago-18	Q 554.913,32	13,70%	Arg. Andrea Bethancourt		INGRESADA	
9.7	TOTAL		Q 2.794.827,04	88,930%				





PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION 2019

MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACTIC, ALTA VERAPAZ



		NOMBRE DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACTIC, ALTA VERAPAZ						
DIRECCION: Municipio de Tactic, departamento de Alta Verapaz CONTRATO: 99-2019-UCEE		NOG: 8899158	LATITUD: 15.314.515	LONGITUD: -90.350.303				
FICHA TECNICA PROYECTO:								
1-DATOS DE PROYECTO.				5. DOCUMENTOS GENERALES				
1.1	NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) TACTIC, ALTA VERAPAZ	No.	TIPO DOCUMENTO	RESPONSABLE	FECHA	OBSERVACION	
1.2	MONTO DEL PROYECTO ORIGINAL	Q. 3.988.380,10	5.1	BITACORA	L&T	29-ago-19	EN TRAMITE	
1.3	MONTO DEL PROYECTO MODIFICADO	-----	5.2	LIBRO DE ACTAS	OPERACIONES	29-ago-19	EN TRAMITE	
1.4	CONTRATO NUMERO	99-2019-UCEE	5.3	ENTREGA DE SITIO	DIRECTORA UCEE	30-jul-19		
1.5	TIEMPO DE EJECUCION	180 DIAS CALENDARIO	5.4	ESTIMACION 1				
1.6	FECHA DE INICIO	30-jul-19	5.5	ESTIMACION 2				
1.7	FECHA DE FINALIZACION	25-ene-20	5.6	ESTIMACION 3				
1.8	SUSPENSION/INICIO		5.7	ESTATUS LEGAL	UCEE	29-ago-19	VIGENTE	
2.1	PRORROGA/FINALIZACION		5.8					
2.1	NOMBRE DE LA EMPRESA	CONSTRUCTORA L&T	5.9					
2.2	REPRESENTANTE LEGAL / PROPIETARIO	HERMESSON LUIS FERNANDO TRABANINO CARRERA	5.10					
2.3	PROFESIONAL RESIDENTE	ING. WALTER PEREZ	5.11					
3.HISTORIAL DE SUPERVISION				6- ORDEN DE CAMBIO 1				
3	FECHA DE INFORME	RESPONSABLE	% AVANCE FISICO	No.	TIPO DOCUMENTO	MONTO	PORCENTAJE	FECHA
3.1	miércoles, 31 de julio de 2019	Arq. Andrea Bethancourt	2.09%	6.1	DECREMENTO	-----	-----	-----
3.2	martes, 20 de agosto de 2019	Arq. Andrea Bethancourt	8.84%	6.2	SUPLEMENTARIO	-----	-----	-----
3.3				6.3	EXTRA	-----	-----	-----
3.4								
3.5				No.	TIPO DOCUMENTO	MONTO	PORCENTAJE	FECHA
3.6				7.1	DECREMENTO	-----	-----	-----
3.7				7.2	SUPLEMENTARIO	-----	-----	-----
3.8					EXTRA	-----	-----	-----
3.9								
3.9				7.3				
4- DATOS FISICO/FINANCIEROS				8. INFORMACION DE FIANZAS				
4.1	AVANCE FISICO (FECHA ACTUAL)	8.84%	No.	TIPO DOCUMENTO	CORRELATIVO DE FIANZA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	
4.2	AVANCE FINANCIERO (FECHA ACTUAL)	0	8.1	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	194877 SEGUROS PRIVANZA	29-may-19	juves, 28 de mayo de 2020	
4.3	TIEMPO EN EJECUCION	31 DIAS	8.2	ANTICIPO				
4.4	No. ESTIMACIONES PAGADAS	0	8.3	CONSERVACION DE OBRA				
4.5	DIAS DE ATRASO		8.4	SALDOS DEUDORES				
9. DATOS DE ESTIMACIONES Y SUPEVISION MENSUAL								
9	ESTIMACION NO.	FECHA	MONTO	% FINANCIERO	PROFESIONAL QUE EVALUO	OBSERVACIONES GENERALES		
9.1	ANTICIPO							
9.2	ESTIMACION 1							
9.3	ESTIMACION 2							
9.4	ESTIMACION 3							
9.5	ESTIMACION 4							
9.6	ESTIMACION 5							
9.7	ESTIMACION 6							
9.8	ESTIMACION 7							
9.9	TOTAL		Q	-	6.68%			





PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION 2019

MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SOLOLA, SOLOLA



				NOMBRE DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SOLOLA, SOLOLA DIRECCION: 4a. AVENIDA Y 10a. CALLE ESQUINA ZONA 1, Municipio de Sololá, Departamento Sololá. CONTRATO: 151-2018-UCEE SNIP: 206196					
		NOG: 7737394	LATITUD			LONGITUD			
			14.770561			-91.184819			
FICHA TECNICA PROYECTO:									
1-DATOS DE PROYECTO				5. DOCUMENTOS GENERALES					
1.1	NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SOLOLA, SOLOLA	No	TIPO DOCUMENTO	RESPONSABLE	FECHA	OBSERVACION		
1.2	MONTO DEL PROYECTO ORIGINAL	Q 3,496,724.04	5.1	BITACORA	KYRIOS	*****	EN TRAMITE		
1.3	MONTO DEL PROYECTO MODIFICADO	*****	5.2	LIBRO DE ACTAS	OPERACIONES	*****	EN TRAMITE		
1.4	CONTRATO NUMERO	151-2018-UCEE	5.3	ENTREGA DE SITIO	DIRECTOR UCEE	22-oct-18			
1.5	TIEMPO DE EJECUCION	180 DIAS CALENDARIO	5.4	ESTIMACION 1	ARQ. MARVIN PEREZ	5-dic-18	PAGO PARCIAL		
1.6	FECHA DE INICIO	19-oct-18	5.5	ATRASO SEGUN CRONOGRAMA	KYRIOS	12/12/2018	30 DIAS		
1.7	FECHA DE FINALIZACION	27-abr-19	5.6						
1.8	SUSPENSION/INICIO	2-ene-19	5.7						
1.9	PRORROGA/FINALIZACION	96	5.8						
2.1	NOMBRE DE LA EMPRESA	CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA DEL KYRIOS		5.9					
2.2	REPRESENTANTE LEGAL / PROPIETARIO	ENRIQUE PONSA MOLINA		5.10					
2.3	PROFESIONAL RESIDENTE	JORGE ROBERTO GAVARRETE ING. COL 3305		5.11					
3.HISTORIAL DE SUPERVISION				6- ORDEN DE CAMBIO 1					
3	FECHA DE INFORME	RESPONSABLE	% AVANCE FISICO	No	TIPO DOCUMENTO	MONTO	PORCENTAJE	FECHA	
3.1	lunes, 5 de noviembre de 2018	Arq. Gonzalo Salguero	0.00%	6.1	DECREMENTO	*****	*****	*****	
3.2	jueves, 22 de noviembre de 2018	Arq. Gonzalo Salguero	1.00%	6.2	SUPLEMENTARIO	*****	*****	*****	
3.3	viernes, 30 de noviembre de 2018	Arq. Gonzalo Salguero	5.02%	6.3	EXTRA	*****	*****	*****	
3.4	viernes, 25 de enero de 2019	Alvaro Beber	14.14%						
3.5	viernes, 15 de marzo de 2019	Alvaro Beber	18.75%	No	TIPO DOCUMENTO	MONTO	PORCENTAJE	FECHA	
	martes, 16 de abril de 2019	Ing. Mario Garcia	19.01%	7.1	DECREMENTO	*****	*****	*****	
	viernes, 10 de mayo de 2019	Ing. Mario Garcia	20.72%	7.2	SUPLEMENTARIO	*****	*****	*****	
3.6	martes, 13 de agosto de 2019	RONY NAVARRO	44.59%	7.3	EXTRA	*****	*****	*****	
3.7	martes, 27 de agosto de 2019	RONY NAVARRO	52.00%						
3.8									
4- DATOS FISICO/FINANCIEROS				8. INFORMACION DE FIANZAS					
4.1	AVANCE FISICO (FECHA ACTUAL)	18.75%	No	TIPO DOCUMENTO	CORRELATIVO DE FIANZA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION		
4.2	AVANCE FINANCIERO (FECHA ACTUAL)	20% ANTICIPO	8.1	CUMPLIMIENTO CONTRATO	185762 SEGURO PRIVANZA	19-oct-18	sábado, 27 de abril de 2019		
4.3	TIEMPO EN EJECUCION	52 DIAS	8.2	ANTICIPO	185763 SEGUROS PRIVANZA	19-oct-18	sábado, 27 de abril de 2019		
4.4	No ESTIMACIONES PAGADAS	0	8.3	CONSERVACION DE OBRA	*****	*****	*****		
4.5	DIAS DE ATRASO	0	8.4	SALDOS DELDORES	*****	*****	*****		
9 .DATOS DE ESTIMACIONES Y SUPEVISION MENSUAL									
9	ESTIMACION NO.	FECHA	MONTO	% FINANCIERO	PROFESIONAL QUE EVALUO	OBSERVACIONES GENERALES			
9.1	ANTICIPO	19-oct.-18	Q 699,344.81	20.00%		PAGADO			
9.2	ESTIMACION 1	5-dic.-18	Q 175,594.81	5.02%	ARQ. GONZALO SALGUERO	PAGO PARCIAL EN DICIEMBRE			
9.3	ESTIMACION 2								
9.4	ESTIMACION 3								
9.5	ESTIMACION 4								
9.6	ESTIMACION 5								
9.7	TOTAL		Q 175,594.81	25.02%					





PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION 2019

MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO

				NOMBRE DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO					
DIRECCION: Municipio de San Juan Atitán, departamento de Huehuetenango				LATITUD	LONGITUD				
CONTRATO:108-2019-UCEE				15°27'27.82" N	91°38'30.42" W				
SNIP:				NOG: 8945225					
FICHA TECNICA PROYECTO:									
1-DATOS DE PROYECTO.					5. DOCUMENTOS GENERALES				
1.1	NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	No.	TIPO DOCUMENTO	RESPONSABLE	FECHA	OBSERVACION		
1.2	MONTO DEL PROYECTO ORIGINAL	Q 2,981.143.47	5.1	BITACORA	L&T	26-jul-18	YA EN OBRA		
1.3	MONTO DEL PROYECTO MODIFICADO	5.2	LIBRO DE ACTAS	OPERACIONES	09-ago-18	YA EN UCEE		
1.3	CONTRATO NUMERO	108-2019-UCEE	5.3	ENTREGA DE SITIO	DIRECTORA UCEE	19-sep-18			
1.4	TIEMPO DE EJECUCION	210 DIAS CALENDARIO	5.4	ESTIMACION 1					
1.5	FECHA DE INICIO	30-jul-19	5.5	ESTIMACION 2					
1.6	FECHA DE FINALIZACION	24-feb-20	5.6	ESTIMACION 3					
1.7	SUSPENSION/INICIO		5.7	ESTATUS LEGAL	UCEE	29-ago-19	VIGENTE		
1.8	PRORROGA/FINALIZACION		5.8						
2.1	NOMBRE DE LA EMPRESA	CONSTRUCTORA L&T	5.9						
2.2	REPRESENTANTE LEGAL / PROPIETARIO	HERMESON LUIS FERNANDO TRABANINO CARRERA	5.10						
2.3	PROFESIONAL RESIDENTE	ING. WALTER PEREZ	5.11						
3. HISTORIAL DE SUPERVISION				6- ORDEN DE CAMBIO 1					
3	FECHA DE INFORME	RESPONSABLE	% AVANCE FISICO	No.	TIPO DOCUMENTO	MONTO	PORCENTAJE	FECHA	
3.1	martes, 06 de agosto de 2019	Arg. Eteivina Ordoñez	0.00%	6.1	DECREMENTO	
3.2				6.2	SUPLEMENTARIO	
3.3				6.3	EXTRA	
3.4									
3.5				No.	TIPO DOCUMENTO	MONTO	PORCENTAJE	FECHA	
3.6				7.1	DECREMENTO	
3.7				7.2	SUPLEMENTARIO	
3.8					EXTRA	
3.9				7.3		
4- DATOS FISICO/FINANCIEROS				8. INFORMACION DE FIANZAS					
4.1	AVANCE FISICO (FECHA ACTUAL)		0.00%	No.	TIPO DOCUMENTO	CORRELATIVO DE FIANZA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	
4.2	AVANCE FINANCIERO (FECHA ACTUAL)		0	8.1	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	18592 SEGUROS PRIVANZA	26-jun-19	lunes, 08 de junio de 2020	
4.3	TIEMPO EN EJECUCION		31 DIAS	8.2	ANTICIPO	
4.4	No. ESTIMACIONES PAGADAS		0	8.3	CONSERVACION DE OBRA	
4.5	DIAS DE ATRASO			8.4	SALDOS DEUDORES	
9. DATOS DE ESTIMACIONES Y SUPEVISION MENSUAL									
9	ESTIMACION NO.	FECHA	MONTO	% FINANCIERO	PROFESIONAL QUE EVALUO	OBSERVACIONES GENERALES			
9.1	ANTICIPO								
9.2	ESTIMACION 1								
9.3	ESTIMACION 2								
9.4	ESTIMACION 3								
9.5	ESTIMACION 4								
9.6	ESTIMACION 5								
9.7	ESTIMACION 6								
9.8	ESTIMACION 7								
9.9	TOTAL		Q -	0.000%					





PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION 2019

REMOZAMIENTO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES ANTONIO LARRAZABAL, ANTIGUA GUATEMALA



Remozamiento Instituto Normal para Varones Antonio Larrazabal, Antigua Guatemala, Sacatepéquez

DIRECCION: Antigua Guatemala, Sacatepéquez			
CONTRATO: 158-2018-UCEE		LATITUD	LONGITUD
SNIP: N/A	NOG: 7870655	14°32'31.50"	90°03'38.6"



FICHA TECNICA PROYECTO



1. DATOS DEL PROYECTO				5. DOCUMENTOS GENERALES				
1.1	NOMBRE DEL PROYECTO	REMOZAMIENTO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES ANTONIO LARRAZABAL, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ			TIPO DE DOCUMENTO	RESPONSABLE	FECHA	OBSERVACION
1.2	MONTO ORIGINAL DEL PROYECTO	Q	1,968,892.26	5.1	BITACORA	KYRIOS		En Obra
1.3	MONTO MODIFICADO DEL PROYECTO	Q	2,336,561.52	5.2	LIBRO DE ACTAS	OPERACIONES	21-nov-18	Registro No. L2 42731
1.3	NUMERO DE CONTRATO	158-2018-UCEE		5.3	ENTREGA DE SITIO	DIRECCION UCEE	21-nov-18	Acta 3-2018, Folio No.4
1.4	TIEMPO CONTRACTUAL ORIGINAL	120 DIAS CALENDARIO		5.4	SUSPENSION TEMPORAL	OPERACIONES	5-nov-18	Resolucion 0.1-067-2018 mff (15/11/2018)
1.5	FECHA DE INICIO	5-oct-18		5.5	SE LEVANTO SUSPENSION	OPERACIONES	13-mar-18	Resolucion 0.1-013-2018 VV/igm
1.6	FECHA DE FINALIZACION (original/prorroga)	1-feb-19	8-ago-19	5.6	APROVACION DE PRORROGA	DIRECCION UCEE	28-may-19	Resolucion 0.1-75a-2019 VV/leo (60 dias)
1.7	SUSPENSION INICIO	128 DIAS	5/1/2018	5.7	APROBACION DE ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO No.1	DIRECCION UCEE	30-jul-19	Resolucion 0.1-144-2019 VV/ao
1.8	PRORROGA FINALIZACION	60 DIAS	8/08/2019	5.8				
2.1	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA DEL KYRIOS		5.9	APROBACION DE ACUERDO DE TRABAJO EXTRA No.1	DIRECCION UCEE	30-jul-19	Resolucion 0.1-144-2019 VV/ao
2.2	REPRESENTANTE LEGAL / PROPIETARIO	ENRIQUE PONSA MOLINA		5.10	NOTIFICACION DE FINALIZACION	KYRIOS	6-ago-19	
2.3	PROFESIONAL RESIDENTE	ING. LUIS LEONEL URIZAR MUÑOZ		5.11				
3. HISTORIAL DE SUPERVISION				6. VARIACIONES EN EL VALOR DEL CONTRATO (1)				
3	FECHA DE INFORME	RESPONSABLE	% AVANCE FISICO	No.	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO	PORCENTAJE	FECHA
3.1	viernes, 26 de octubre de 2018	Arq. Jorge Bonifaz	0.00%	6.1	DECREMENTO	0	0%	-----
3.2	lunes, 11 de marzo de 2019	Arq. Maria Ibtelvina Ordoñez	17.86%	6.2	SUPLEMENTARIO	Q 291,621.68	14.81%	30-jul-19
3.3	viernes, 26 de abril de 2019	Ing. Roberto Ralda Barrios	51.81%	6.3	EXTRA	Q 76,047.58	3.86%	30-jul-19
3.4	miércoles, 14 de mayo de 2019	Ing. Roberto Ralda Barrios	55.21%					
3.5	martes, 28 de mayo de 2019	Ing. Roberto Ralda Barrios	71.42%					
3.6	lunes, 29 de julio de 2019	Ing. Roberto Ralda Barrios	90.86%	7.1	DECREMENTO	-----	-----	-----
				7.2	SUPLEMENTARIO	-----	-----	-----
				7.3	EXTRA	-----	-----	-----
4. DATOS FISICO-FINANCIEROS				7. VARIACIONES EN EL VALOR DEL CONTRATO (2)				
4.1	AVANCE FISICO (FECHA ACTUAL)	90.86%		No.	TIPO DOCUMENTO	CORRELATIVO DE FIANZA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION
4.2	AVANCE FINANCIERO (FECHA ACTUAL)	44.28%		8.1	CUMPLIMIENTO CONTRATO	SEGUROS PRIVANZA 186654	19/09/2018	Hasta que UCEE reciba satisfactoriamente el proyecto
4.3	TIEMPO EN EJECUCION (DIAS)	-4378		8.2	ANTICIPO	N/A	-----	-----
4.4	No. ESTIMACIONES PAGADAS	4		8.3	CONSERVACION DE OBRA	-----	-----	-----
4.5	DIAS DE ATRASO	-----		8.4	SALDOS DEUDORES	-----	-----	-----
8. DATOS DE ESTIMACIONES Y SUPERVISION MENSUAL								
8	ESTIMACION NO.	FECHA	MONTO	% FINANCIERO	PROFESIONAL QUE EVALUO	OBSERVACIONES GENERALES		
9.1	ANTICIPO					NO APLICA		
9.2	ESTIMACION 1	9-abr.-19	Q 871,817.43	37.31%	ING. ROBERTO RALDA BARRIOS	PAGADA		
9.3	ESTIMACION 2	6-may.-19	Q 117,793.47	5.041%	ING. ROBERTO RALDA BARRIOS	PAGADA		
9.4	ESTIMACION 3	6-jun.-19	Q 416,845.51	17.806%	ING. ROBERTO RALDA BARRIOS	PAGADA		
9.5	ESTIMACION 4 (Primer pago parcial)	8-jul.-19	Q 244,000.00	10.443%	ING. ROBERTO RALDA BARRIOS	PAGADA, pendiente el segundo pago parcial de esta estimacion		
9.5	ESTIMACION 4 (Segundo pago parcial)	8-jul.-19	Q 177,712.24	7.696%	ING. ROBERTO RALDA BARRIOS	PENDIENTE DE PAGO, PERO YA INGRESADA		
9.6	ESTIMACION 5	5-ago.-19	Q 275,701.54	11.799%	ING. ROBERTO RALDA BARRIOS	PENDIENTE DE PAGO, PERO YA INGRESADA		
9.7	TOTAL		Q 2,103,070.19	79.60%	El % corresponde al total ya pagado			





PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION 2019

REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 71 FRANKLIN DELANO ROOSEVELT

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA <small>MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA</small> <small>UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO</small>		NOMBRE DE PROYECTO: REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 71 FRANKLIN DELANO ROOSEVELT				 UC E E		
DIRECCION: Municipio de Guatemala, departamento de Guatemala		CONTRATO: 157-018-UCEE		LATITUD		LONGITUD		
SNIP: NO APLICA		NOG: 7851391		14,6396692		90,567627		
FICHA TECNICA PROYECTO:								
1-DATOS DE PROYECTO.				5. DOCUMENTOS GENERALES				
1,1	NOMBRE DEL PROYECTO	REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 71 FRANKLIN DELANO ROOSEVELT	No.	TIPO DOCUMENTO	RESPONSABLE	FECHA	OBSERVACION	
1,2	MONTO DEL PROYECTO ORIGINAL	Q 1.143.079,32	5,1	BITACORA	SEGEISA	20-sep-18	YA EN UCCE	
1,3	MONTO DEL PROYECTO MODIFICADO	Q 1.371.026,05	5,2	LIBRO DE ACTAS	OPERACIONES	05-oct-18	YA EN UCCE	
1,3	CONTRATO NUMERO	157-2018-UCCEE	5,3	ENTREGA DE SITIO	DIRECTOR UCCE	05-oct-18		
1,4	TIEMPO DE EJECUCION	150 DIAS CALENDARIO	5,4	ESTIMACION 1	ARQ. JAIME ROSALES	30-oct-18	PAGADA	
1,5	FECHA DE INICIO	28-sep-18	5,5	ESTIMACION 2	ARQ. JAIME ROSALES	12-nov-18	PAGADA	
1,6	FECHA DE FINALIZACION	18-feb-19	5,6	ESTIMACION 3	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	07-mar-19	PAGADA	
1,7	SUSPENSION/INICIO	-----	5,7	ESTATUS LEGAL	UCCE	04-feb-18	VIGENTE	
1,8	PRORROGA/FINALIZACION	-----	5,8					
2,1	NOMBRE DE LA EMPRESA	SEGEISA	5,9					
2,2	REPRESENTANTE LEGAL / PROPIETARIO	VICTOR FRANZ CIFUENTES ROSALES	5,10					
2,3	PROFESIONAL RESIDENTE	ING. DANIEL CABEZAS COL. 3432	5,11					
3.HISTORIAL DE SUPERVISION				6- ORDEN DE CAMBIO 2 (dejó sin efecto a la orden de cambio 1)				
3	FECHA DE INFORME	RESPONSABLE	% AVANCE FISICO	No.	TIPO DOCUMENTO	MONTO	PORCENTAJE	FECHA
3,1	viernes, 26 de octubre de 2018	Arq. Jaime Rosales	61,81%	6,1	DECREMENTO	Q 83.802,72	7,33%	15/02/2019
3,2	martes, 27 de noviembre de 2018	Arq. Jaime Rosales	95,24%	6,2	SUPLEMENTARIO	Q 242.349,48	21,20%	15/02/2019
3,3	jueves, 24 de enero de 2019	Arq. Andrea Bethancourt	87,99%	6,3	EXTRA	Q 69.399,97	6,07%	15/2/19
3,4	jueves, 07 de marzo de 2019	Arq. Andrea Bethancourt	100,00%					
				7- ORDEN DE CAMBIO				
3,5	FECHA DE INFORME	RESPONSABLE	% AVANCE FISICO	No.	TIPO DOCUMENTO	MONTO	PORCENTAJE	FECHA
3,6				7,1	DECREMENTO	-----	-----	-----
3,7				7,2	SUPLEMENTARIO	-----	-----	-----
3,8				7,3	EXTRA	-----	-----	-----
4- DATOS FISICO/FINANCIEROS				8. INFORMACION DE FIANZAS				
4,1	AVANCE FISICO (FECHA ACTUAL)	100,00%	No.	TIPO DOCUMENTO	CORRELATIVO DE FIANZA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	
4,2	AVANCE FINANCIERO (FECHA ACTUAL)	ESTIMACION 3	8,1	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	102-176-25451 BANCO CHN	05/09/2018	sábado, 02 de febrero de 2019	
4,3	TIEMPO EN EJECUCION	135 DIAS	8,2	CONSERVACION DE OBRA	102-178-25257 BANCO CHN	25/03/2019	18 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO	
4,4	No. ESTIMACIONES PAGADAS	3	8,3	ANTICIPO	-----	-----	-----	
4,5	DIAS DE ATRASO	-----	8,4	SALDOS DEUDORES	-----	-----	-----	
9. DATOS DE ESTIMACIONES Y SUPEVISION MENSUAL								
9	ESTIMACION NO.	FECHA	MONTO	% FINANCIERO	PROFESIONAL QUE EVALUO	OBSERVACIONES GENERALES		
9,1	ANTICIPO	-----	-----	-----	-----	-----		
9,2	ESTIMACION 1	30-oct-18	Q 671.838,02	49,00%	Arq. Jaime Rosales	-----		
9,3	ESTIMACION 2	12-nov-18	Q 403.233,53	29,41%	Arq. Jaime Rosales	-----		
9,4	ESTIMACION 3	7-mar-19	Q 265.965,53	19,40%	Arq. Andrea Bethancourt	-----		
9,5	ESTIMACION 4	-----	-----	-----	-----	-----		
9,6	ESTIMACION 5	-----	-----	-----	-----	-----		
9,7	TOTAL	-----	Q 1.341.037,08	97,810%	-----	-----		



***¡Juntos
avanzamos!***

